


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en prolongación calle nicolás vela, entre el psje. Felipe vergaray y el JR. Maranquiari en la junta vecinal pascual alegre de la ciudad de atalaya distrito de raimondi

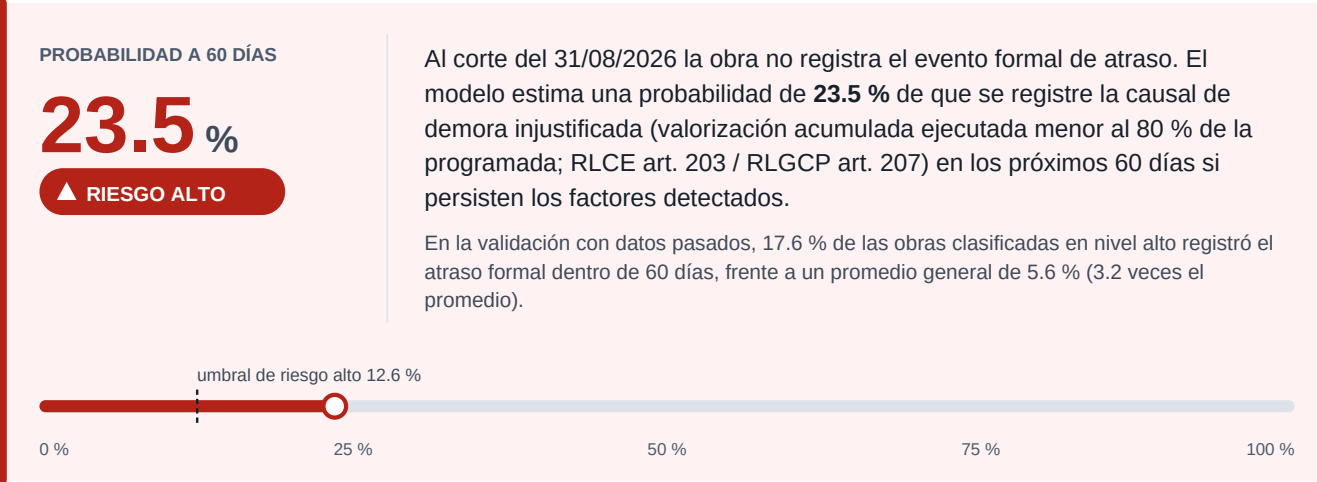


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	107 desde 13/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PROLONGACIÓN CALLE NICOLÁS VELA, ENTRE EL PSJE. FELIPE VERGARAY Y EL JR. MARANQUIARI EN LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE DE LA CIUDAD DE ATALAYA DISTRITO DE RAIMONDI
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI
Contratista	CONSORCIO MR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RAYMONDI / ATALAYA / UCAYALI
Código Único de Inversión (CUI)	2616893
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PROLONGACIÓN CALLE NICOLÁS VELA, ENTRE EL PSJE. FELIPE VERGARAY Y EL JR. MARANQUIARI EN LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE DE LA CIUDAD DE ATALAYA DISTRITO DE RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2396172
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,527,359.93
Cuaderno de obra digital	107 asientos entre 13/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

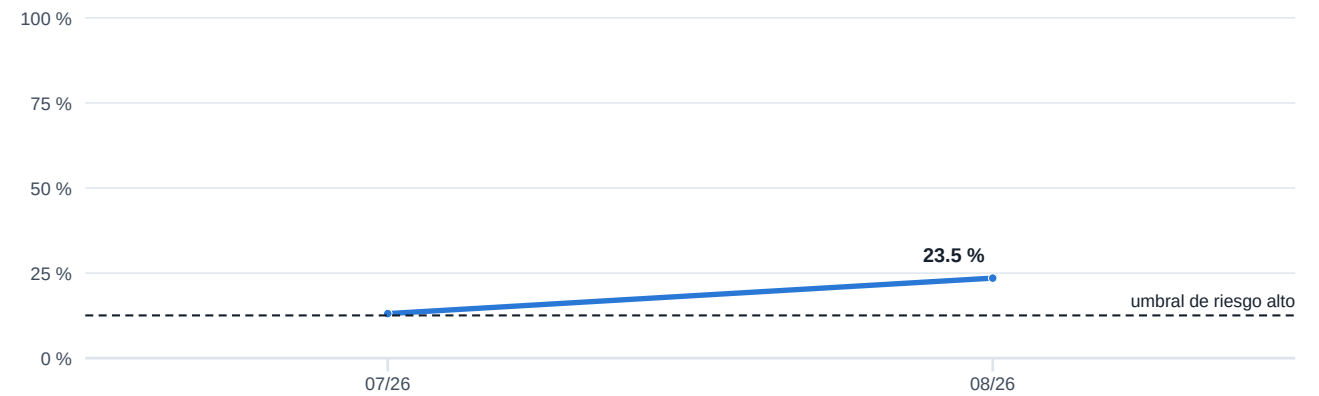

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.537
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.237
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.227
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.216
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
Hubo registros en el cuaderno 27 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
El 27 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.093

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	23.5 %	23.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 106 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...gregados y equipo ofertado para su utilizacion en la ejecucion de obra.- senalizacion y letreros informativos en el area de la obra, desvios y zonas de trabajo, cumplimiento de las normas vigentes.de incumplirse lo ordena por parte de la supervision, estas seran evaluadas, considerando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

ASIENITO N°95 ORDENES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS: Se ordena al contratista, lo siguiente:Contar con los equipos, herramientas en buen estado, sin que estas generen afectaciones y/o tener uno más de repuesto, considerando la continuidad de los trabajos.Implementación de un mixell mas, considerando la continuidad de los trabajos de vaciado de la mezcla de concreto.Personal de mano de obra calificado, para los trabajos ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 93 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...a fluida o se adopte otros metodos de vaciado- ensayos y/o pruebas de todos los elementos vaciados y esta tenga relacion a la cantidad y volumen.de no hacerse caso las ordenes estas seran considerada incumplimientos contractuales, sujetas a aplicar penalidades, en cumplimiento de los documentos contractuales y el reglamento lgcp.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 85 · Órdenes · SOEC_SPV · 22/08/2026

ASIENITO N°85 ORDENES AL CONTRATISTA: Se ordena al Contratista lo siguiente:- Presentar de manera anticipada las fichas técnicas de materiales, agregados, diseño de mezcla, diseño de base granular, diseño de material de préstamo, considerando los desagregados de gastos generales.- Presentar de manera anticipada y en momento de ejecutarse, pruebas, ensayos, protocolos de calidad, considerando la liberación de partidas ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 85 · Órdenes · SOEC_SPV · 22/08/2026

...y el reglamento lgcp.de existir consultas, recomendaciones de mejoras, modificaciones y/o replanteo, estas de hagan de manera anticipada, considerando el plazo de ejecucion de la obra, y no se genere atrasos, en cumplimiento de las metas del proyecto.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 85 · Órdenes · SOEC_SPV · 22/08/2026

...para su utilizacion.de no cumplirse las ordenes de la supervision, y no contar con la autorizacion de estas, no se procedera a reconocer partidas ejecutadas que esta supervision considere que se haya incumplido con lo solicitado, por lo que de manera preventiva y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se hace de conocimiento al contratista, considerando el cumplimiento de sus obligaciones con...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

...sta de existir consultas de obra, recomendaciones de mejoras, modificaciones y/o replanteo, se haga de conocimiento de manera anticipada, considerando el plazo de ejecucion de obra, y se genere algun atraso.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 78 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...sta de existir consultas de obra, recomendaciones de mejoras, modificaciones y/o replanteo, se haga de conocimiento de manera anticipada, considerando el plazo de ejecucion de obra, y se genere algun atraso.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 73 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...atista, de existir consultas de obra, recomendaciones de mejoras, modificaciones y/o replanteo, estas de hagan de manera anticipada, considerando el plazo de ejecucion de la obra, sin que esto genere atrasos.se ordena al contratista cumplir con la ejecucion de las partidas, considerando el buen proceso constructivo, protocolos de calidad, especificaciones tecnicas, planos detalles del expediente tecnic...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/08/2026

ASIENTO N°71 OCURRENCIAS DEL DIA 16/08/2026: Se viene realizando trabajos de gabinete, considerando la revisión de documentos, expediente técnico, calendario programado de la ejecución de las partidas, metrados ejecutados hasta la fecha, en cumplimiento de la verificación, control y supervisión de la ejecución de la obra.Se ordena al Contratista cumplir con lo siguiente:- Control de calidad, protocolos de calidad y e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
