


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion del servicio de ejecucion de obra del proyecto denominado: Mejoramiento del servicios de espacios públicos urbanos en el parque recreativo san antonio del barrio san antonio distrito de putina de la provincia de san antonio de putina del departamento de puno

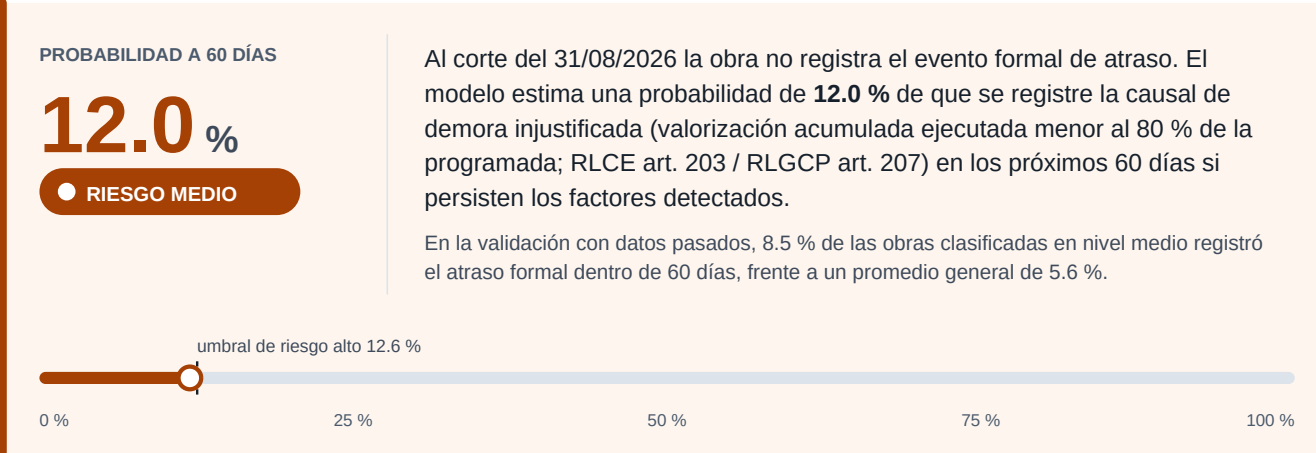


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	42 desde 10/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREATIVO SAN ANTONIO DEL BARRIO SAN ANTONIO DISTRITO DE PUTINA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SAN ISIDRO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUTINA / SAN ANTONIO DE PUTINA / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2654360
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREATIVO SAN ANTONIO DEL BARRIO SAN ANTONIO DISTRITO DE PUTINA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2406892
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,343,076.41
Cuaderno de obra digital	42 asientos entre 10/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

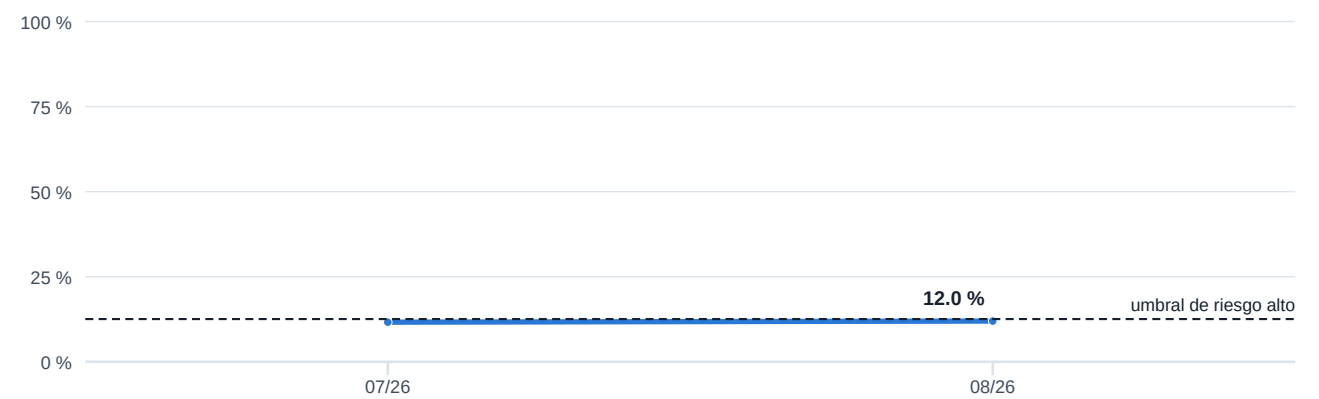

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.660
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.213
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.197
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.100
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.081
Extensión media de los asientos recientes: 1,250 caracteres	Contenido de los asientos		-0.074
16 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.060

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.0 %	12.0 %	-0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	12.0 %	12.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...rabajos de excavacion y concreto de falsa zapata, encontrandose pendiente los trabajos propios en los demas ejes que no se encuentran en materia de consulta, por lo que la consulta no viene generando retrasos al proyecto siendo la causal de retraso motivado por el contratista, en tal sentido es improcedente una ampliacion de plazo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

VERIFICACION DE TRABAJOS: A). DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA: EN LA FECHA SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE ABILITADO DE ACERO PARA LAS COLUMNAS DEL EJE B DE ÁREA DE LA COBERTURA, SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE CIMIENTOS CORRIDOS EN EL ÁREA DE LOS SS-HH. DEL MISMO MODO SE VERIFICA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA 02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, ESTO PARA COLUMNAS DEL ÁREA DE LA CO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026

...entidad contratante no cumplen con lo senalado en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora, la cual se computa desde la fecha en la que la falta de ejecucion de los trabajos materia de la consulta genere impacto en la ruta critica del programa de ejecucion vigente. para lo cual el computo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...o al vertido de concreto de debe verificar el alineamiento de las columnas. c) al residente de obra se le comunica que debe de implementar equipos como generador electrico a efectos de no incurrir en retrasos por cortes de luz.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS: A). DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA: A LA FECHA SE A VERIFICADO TRABAJOS DE LA PARTIDA 02.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE COBERTURA METALICA, ADEMÁS DEL HABILITADO DE FIERRO CORRUGADO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS DE LOS SS-HH. SE VERIFICA EL HABILITADO E INSTALACIÓN DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN EN EL ÁREA DE LOS SS-HH. B.- SOBRE LA PARTID...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

...esde horas 12 pm hasta el dia siguiente el fluido electrico en la ciudad de putina ha sido inestable, no pudiendo utilizar los equipos manuales como amoladora, sierra circular, taladros, etc. lo cual retrasa el avance normal de los trabajos.adicionalmente el dia de hoy se tiene la presencia de lluvia de moderada intensidad desde las 7:00 am hasta las 9:40 am y desde 11:15 am hasta 1:00 pm, lo cual impid...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

...retirar el material acumulado y buscar otras canteras que cumpla con los solicitado en el expediente tecnico y las normas tecnicas peruanas. - el especialista de seguridad y salud en el trabajo viene incumpliendo con la senalizacion en tramos donde se encuentras las excavaciones profundas por lo que se le solicita implementar cintas de senalizacion. c).- se deja constancia con fecha 03 de agosto de hizo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA: B).- EN RESPUESTA AL ASIENTO N° 07 Y 08 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE "APROBACIÓN DEL REPLANTEO DE NIVELES NPT 0.00 EN ÁREAS DE CIRCULACIÓN CON RESPECTO AL NIVEL DE LA VEREDA EXISTENTE EN EL PERÍMETRO", PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PARTIDA SE DEBE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL QUE ASEGURE LA EVACUACIÓN DEL AGUA HACIA LA VÍA PÚBLICA, EVITANDO SU ACUMULACIÓN O ESTANCAMIENTO...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
