

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera DV. Cerro de pasco - tingo maría, tramo 1: DV. Cerro de pasco- san rafael

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

14.3 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **14.3 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	338 desde 23/01/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA, TRAMO 1: DV. CERRO DE PASCO- SAN RAFAEL
Entidad contratante	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Contratista	CONSORCIO CARRETERA SAN RAFAEL-CCS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YANACANCHA / PASCO / PASCO
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2355308
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	338 asientos entre 23/01/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

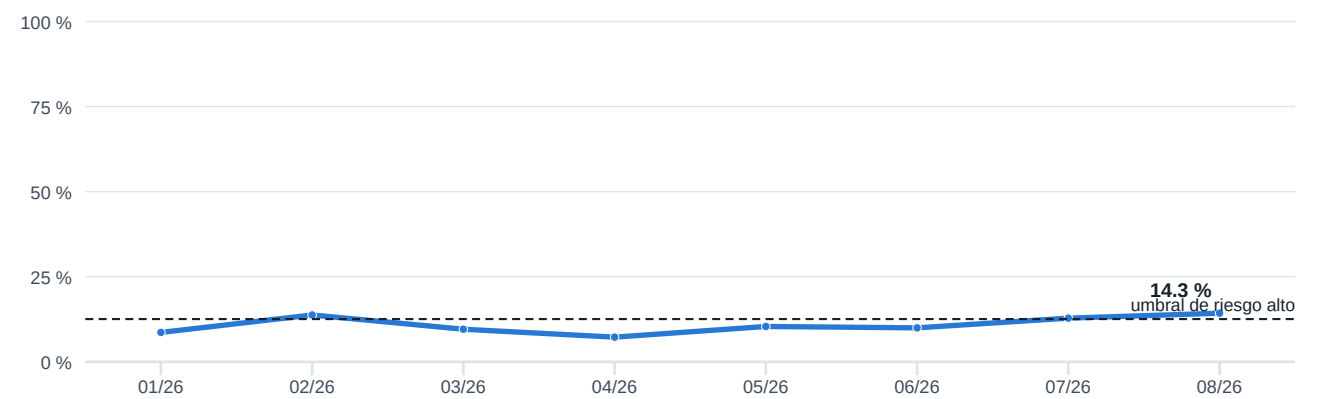

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.69 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.654
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.204
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.149
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
Departamento: Pasco	Características de la obra		-0.105
Extensión media de los asientos recientes: 1,387 caracteres	Contenido de los asientos		-0.094
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.091
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.081

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.3 %	14.1 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.3 %	14.2 %	-0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 330 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

REITERACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTUALIZADO.: Se deja constancia que, mediante Carta N.° 0367-2026-CSR-JS de fecha 21 de agosto del 2026, la Supervisión reiteró al Contratista la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado, de acuerdo con lo establecido en el D.S. N.° 011-2019-TR. Asimismo, mediante la referida Carta se trasladó el Informe CSRAK-CPSR-ES...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 326 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 22/08/2026

... cierre y/o fin de la circunstancia que configura la causal de ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del rlce, al configurarse la causal prevista en el literal a) "atraso y/o paralización por causas no atribuibles al contratista" del artículo 197 del citado reglamento, cuyo inicio de causal fue registrado en los asientos n309 y n310 ambos del 10.ago.2026.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 316 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

...mediato de todo ingreso, ocupación, intervención, afectación y dano sobre terrenos de los posesionarios de la comunidad campesina san juan de jarapampa, retiro de maquinarias y personal, bajo expreso apercibimiento de iniciar acciones legales correspondientes y demás acciones que nos amparan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 319 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

...anota el inicio de la circunstancia que configura la causal de ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del rlce, al configurarse la causal prevista en el literal a) "atraso y/o paralización por causas no atribuibles al contratista" del artículo 197 del citado reglamento, reservándose el derecho de presentar la correspondiente solicitud de ampliación de plazo dentro del...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 317 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

...ebido a los trabajos de corte de material de talud paralizados del sector km 130+000 al km 138+000, la misma que fue registrada en los asientos n309 y n310 ambos de 10.ago.2026, esta situación genera atraso en el avance de la ejecución de la obra, afectando directamente las partidas 202. b1 excavación en roca fija y 202.b2 excavación en roca fracturada (suelta), las cuales forman parte de la ruta crítica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 311 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

... y contractualmente su postura, de modo tal que el supervisor pueda emitir su opinión al respecto para el pronunciamiento debido de la entidad con los fundamentos de ambas partes. 2.- con respecto al atraso que menciona el contratista por no poder ejecutar los cortes en los sectores allí descritos entre el km 178+350 y el km 181+941.17 y sector km 130+000 al km 138+000, es preciso indicar que, las part...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 303 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

OPOSICIÓN E INTERFERENCIAS EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 159+510 AL KM 161+540, QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA. REFERENCIA :ASIENTO 300 Y 301 DEL CONTRATISTA Y 294 DEL SUPERVISOR: Sobre sus asientos 300 y 301 del contratista en donde en respuesta al requerimiento formulado por la Entidad, para que presente en el menor plazo posible la evaluación técnica y, las alternativas de solución del K...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 257 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/07/2026

TRABAJOS EN EL SECTOR DEL KM 138+940 AL KM 139+220 – CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TÚNEL PARIAMARCA: Referente al Asiento N.°255 del Contratista, se deja constancia de lo informado respecto al inicio programado de la construcción del Nuevo Túnel Paríamarca, previsto para el 05 de julio de 2026, conforme al Programa de Ejecución de Obra vigente. Asimismo, el Contratista comunica que el sector comprendido entre el km 138+940 ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
