


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución del proyecto de inversión: Instalación del servicio de matadero municipal en la ciudad de rioja, provincia de rioja ¿ san martin ¿ i etapa¿ con CUI N° 2235100.

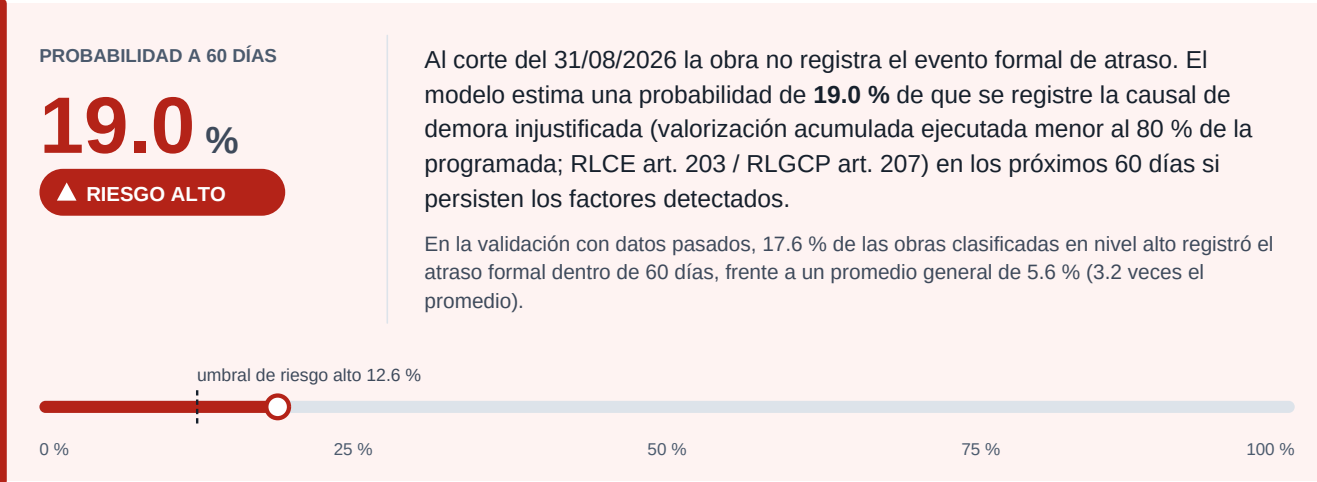


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	88 desde 16/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA ¿ SAN MARTIN ¿ I ETAPA¿ CON CUI N° 2235100.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
Contratista	CONSORCIO CASTILLA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RIOJA / RIOJA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2235100
Inversión asociada	INSTALACION DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN
Función	COMERCIO
Identificador del contrato (SEACE)	2402298
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,865,499.00
Cuaderno de obra digital	88 asientos entre 16/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

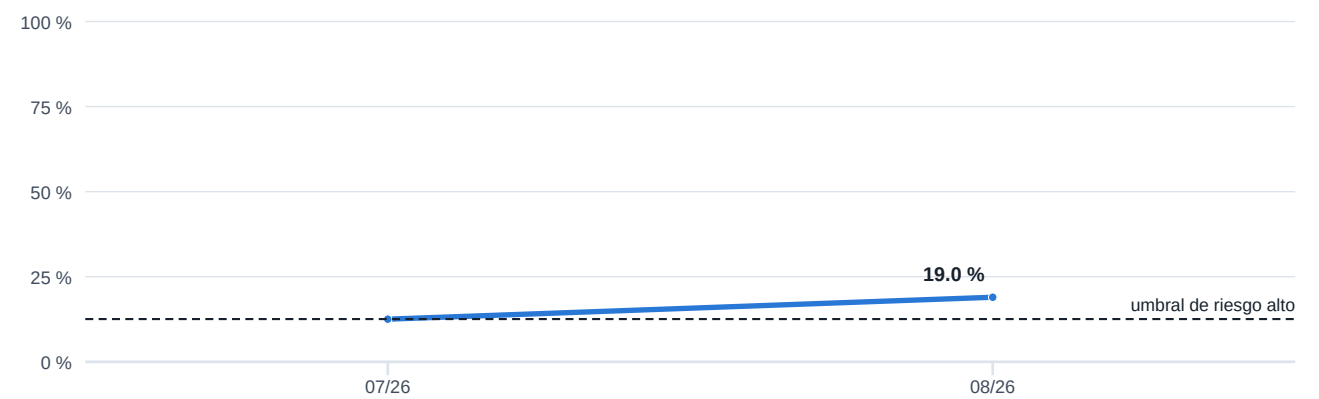

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.457
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.247
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.227
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.127
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.089
Extensión media de los asientos recientes: 1,437 caracteres	Contenido de los asientos		-0.087
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.074

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	19.0 %	18.7 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	19.0 %	19.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 87 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

... acumulado ejecutado representa aproximadamente el 93.07 % del avance acumulado programado, encontrándose por encima del umbral del 80 %, por lo que a la fecha de corte no se configura el supuesto de retraso injustificado previsto en la normativa. finalmente, se deja constancia que la diferencia de 3.06 puntos porcentuales será objeto de seguimiento en las siguientes valorizaciones, a fin de verificar la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 87 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

... programa de ejecución de obra vigente, obteniéndose los siguientes avances por componente: obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud: 11.21 %. estructuras: 41.79 %. arquitectura: 21.80 %. instalaciones sanitarias: 0.00 %. instalaciones eléctricas: 0.00 %. asimismo, el avance ejecutado correspondiente al mes de agosto de 2026 es de 26.29 %, frente al 30.23 % programado, obteniéndose un a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 88 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

... vance acumulado ejecutado representa el 93.07 % del avance acumulado programado. al situarse por encima del umbral mínimo del 80 %, se ratifica que a la fecha de corte no se configura la condición de retraso injustificado de obra. 4. instrucción al contratista: la supervisión toma conocimiento del compromiso asumido sobre el seguimiento a la brecha de avance. sin perjuicio de ello, se insta al contratista...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 88 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

... gusto de 2026, validando los avances acumulados por componente presentados por la residencia: obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud: 11.21 %. estructuras: 41.79 %. arquitectura: 21.80 %. instalaciones sanitarias: 0.00 %. instalaciones eléctricas: 0.00 %. 2. evaluación del avance físico: se valida que el avance físico ejecutado en el mes de agosto de 2026 corresponde al 26.29 % (frente al ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 86 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 30/08/2026

SOBRE INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 POR NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N° 02: La Supervisión de Obra, en atención al Asiento N.° 85 de fecha 30/08/2026, mediante el cual la Residencia de Obra deja constancia del inicio de la causal de Ampliación de Plazo N.° 03, manifiesta su CONFORMIDAD TÉCNICA respecto al inicio de la causal, toda vez que se ha verificado que la Consulta N.° 02, relacionada con el mejora...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 86 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 30/08/2026

... eglamento de la ley n. 32069, cuando la entidad contratante no absuelve la consulta dentro del plazo establecido, el contratista puede solicitar ampliación de plazo por el tiempo correspondiente a la demora, siempre que la falta de ejecución de los trabajos materia de la consulta genere impacto en la ruta crítica del programa de ejecución vigente. asimismo, el numeral 198.1 establece que la ampliación d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 85 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 30/08/2026

inicio de causal de ampliación de plazo n 03 por atraso y/o paralización no atribuible al contratista . mediante el presente asiento, la residencia de obra comunica y deja constancia que, en seguimiento a lo señalado mediante el asiento n 82, relacionado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 80 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

... esen y sean utilizados en obra, debiendo garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico, a fin de evitar observaciones reiterativas y la eventual aplicación de las penalidades que correspondan conforme a la normativa y condiciones contractuales vigentes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/07/2026**

...iento de las obligaciones contractuales y tecnicas inherentes a la ejecucion de la obra, dejando constancia que las actividades de curado se vienen realizando de manera continua, por lo que no existe incumplimiento alguno respecto a dicha actividad.finalmente, se solicita que cualquier observacion tecnica especifica relacionada con la ejecucion del curado sea comunicada de manera puntual y sustentada, in...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026**

... debiendo mantenerlas permanentemente humedas mediante riego con agua o curado con aditivo quimico, evitando su desecacion prematura y cualquier afectacion a la calidad y durabilidad del concreto. el incumplimiento de esta disposicion sera de exclusiva responsabilidad del contratista, quien asumira las consecuencias tecnicas y contractuales derivadas de una deficiente ejecucion del proceso de curado.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 17 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 22/07/2026**

VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: La Supervisión deja constancia que, durante la verificación de la documentación técnica y administrativa de la obra, se ha advertido que el Contratista aún no ha acreditado la implementación y ejecución de la Gestión Integral de Riesgos correspondiente a la presente obra. En tal sentido, se requiere al Residente de Obra efectuar las coordinaciones y acci...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
