


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Construccion de pavimento, vereda y sardinel, en el(la) calle santa rosa entre calle santa cecilia y calle micaela bastidas del distrito de olmos, provincia de lambayeque, departamento lambayeque

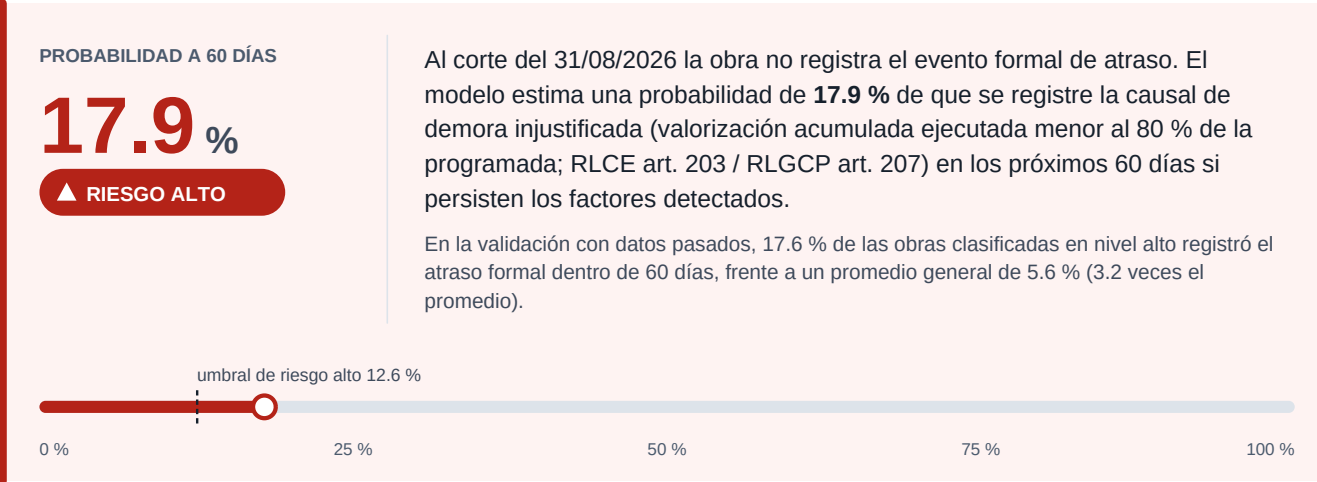


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	66 desde 07/07/2026	20/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL, EN EL(LA) CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Contratista	CONSORCIO LOS PARQUES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	OLMOS / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2612932
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL EN EL(LA) CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE MICAELA BASTIDAS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2402653
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,848,318.17
Cuaderno de obra digital	66 asientos entre 07/07/2026 y 20/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

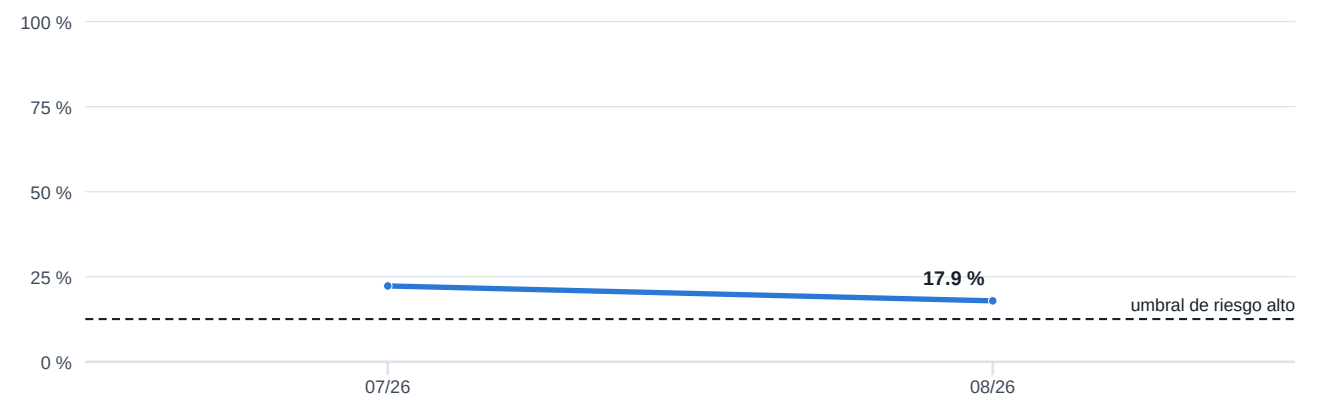

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.686
El último asiento se registró hace 11 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.526
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.288
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.233
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.177
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.150
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.084
19 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.051

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	17.9 %	17.9 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	17.9 %	17.9 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.9 %	17.9 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	17.9 %	36.3 %	+18.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 65 · Adicionales · SOEC_SPV · 20/08/2026

... corresponden a deficiencias del expediente técnico de obra y a las condiciones técnicas advertidas durante la ejecución contractual, no siendo atribuible a actos, omisiones, negligencia, impericia o incumplimiento de las partes. dicha evaluación es consistente con el pronunciamiento del proyectista, ing. felix darwin sampertegui silva, remitido mediante carta n 077-2026-fdss/consultor, quien confirma la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

... nica una vez el contratista presente la solicitud formal de ampliación de plazo, con el sustento documental correspondiente (registro de paralización, incidencia en ruta crítica, cálculo de días de atraso), conforme al procedimiento y dentro de los plazos establecidos en el reglamento de la ley n 32069. se precisa que la sola anotación en el cuaderno de obra no sustituye dicha solicitud formal.c. se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

...idad, conforme al procedimiento y plazos establecidos en la normativa de contrataciones del estado vigente del reglamento de la ley n 32069, no siendo atribuible a la supervisión ni al contratista la demora en su aprobación por parte de la entidad continua al siguiente asiento

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/08/2026

... ama de ejecución de obra vigente. al no poder avanzar con la ejecución de estas partidas determinantes, se traslada de manera inevitable la fecha de finalización programada del proyecto, generando un retraso en la ruta crítica.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026

... amento de la ley n32069, y presentar la solicitud de ampliación de plazo debidamente sustentada y cuantificada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de concluida dicha circunstancia, bajo apercibimiento de improcedencia. continua

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 45 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 01/08/2026

... ama de ejecución de obra vigente. al no poder avanzar con la ejecución de estas partidas determinantes, se traslada de manera inevitable la fecha de finalización programada del proyecto, generando un retraso en la ruta crítica.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 27/07/2026

OPINION TECNICA RESPECTO A CONSULTAS DE ADICIONALES DE OBRA: EL DIA DE HOY NO HUBO ATENCION EN MESA SE PARTES DE LA MPL, POR LO QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE ALCANZA A LA ENTIDAD MEDIANTE MESA DE PARTES DE MANERA VIRTUAL LA CARTA N° 013 – 2026 – GBH/RL Y LA CARTA N° 014 – 2026 – GBH/RL.1. EL DIA DE HOY MEDIANTE CARTA N° 014 – 2026 – GBH/RL, EL SUSCRITO REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION ALCANZA A LA ENTIDAD EL INFO...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026

AVANCE DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA: EL DIA DE HOY SE VERIFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA COMO CHARLAS DE SEGURIDAD DE OBRA, INSTALACION DE CARTEL DE OBRA, DEMOLICION DE VEREDAS MEDIANTE CARTA N° 003 -2026-GBH/RL, DE FECHA 15 JULIO 2026, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUPERVISION, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, LAS OBSERVACIONES A LOS PLANOS DE REPLANTEO.LOS PL...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/07/2026

AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA: SE VERIFICA CHARLA DE SEGURIDAD DADA POR EL CONTRATISTA, ASI MISMO SE VERIFICA TRABAJOS DE DEMOLICION DE VEREDAS, SE COMUNICA AL RESIDENTE RESPECTO A LA PARTIDA FLETE DE MATERIALES HASTA EL MOMENTO TODAVIA NO HA LLEGADO NADA A OBRA QUE SE PUEDA VERIFICAR LA EJECUCION DE LA PARTIDA 08.02 FLETE DE MATERIALES. SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA COLOCACION DE SEÑALIZACION TEMPORAL D...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
