


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución del saldo de obra del proyecto: Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital de apoyo san francisco, segundo nivel de atencion, ayna ¿ la mar ¿ ayacucho, CUI N°2194680

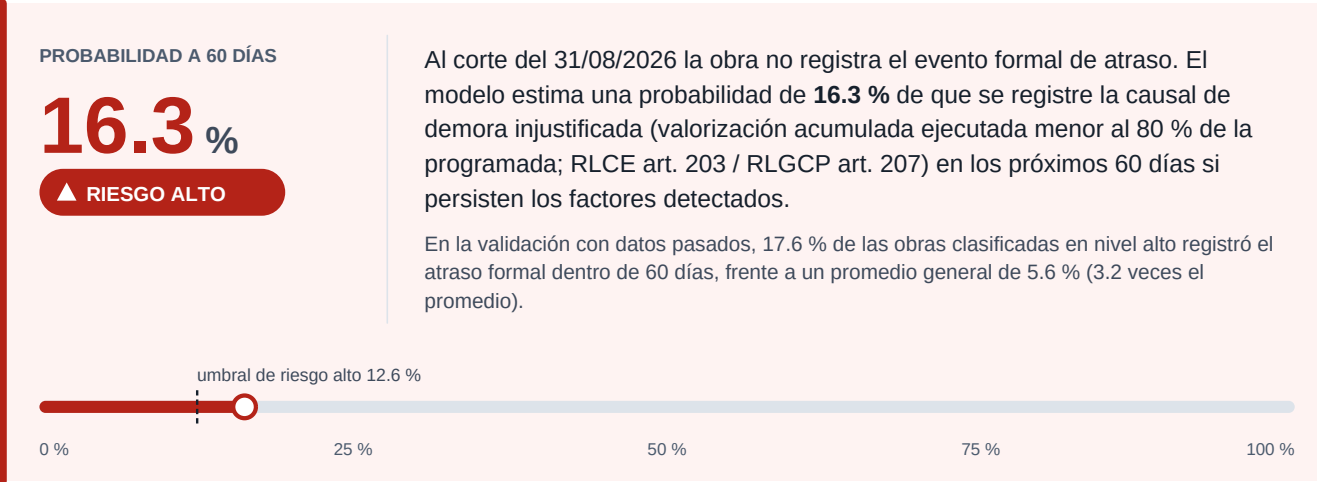


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	168 desde 23/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA ¿ LA MAR ¿ AYACUCHO, CUI N°2194680
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO HOSPITALARIO JULI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AYNA / LA MAR / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	2194680
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYNA - LA MAR - AYACUCHO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2392377
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 76,473,283.00
Cuaderno de obra digital	168 asientos entre 23/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

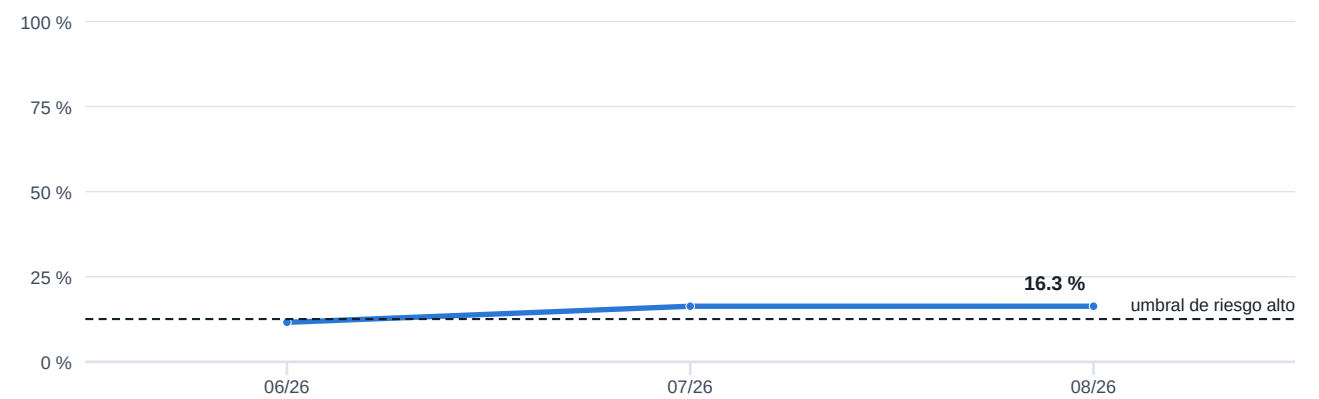

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.681
El 61 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.265
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.199
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 26,572,987	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.156
8 asientos de inicio del plazo desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.096
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.087

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	16.3 %	16.1 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 150 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 26/08/2026

...cisco, puesto que sin esos servicios basicos culminados no se podrian realizar las pruebas hidraulicas de los sistemas de las instalaciones sanitarias e instalaciones mecanicas. causas: causa no 01.- demoras en la culminacion y aprobacion del expediente tecnico del sistema de aduccion de agua potable directo para los servicios de agua potable.causa no 02.- demoras en la obtencion de la disponibilidad pr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 147 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

...iones.3. consultamos, si es procedente ejecutar las obras civiles sin restricciones, para dar inicio a los trabajos programados en el mes de setiembre 2026.4. no esta demas comunicarle, que cualquier demora en el otorgamiento del itf, sera tipificada como una causal de ampliacion de plazo establecida en el art. 198, del d.s. no 009-2025-ef. atte.-pasaldes.-

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 149 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

COMUNCAMOS PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO SOBRE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE FICHAS TÉCNICAS DE LA PARTIDA 03.07.01 – PUERTAS.: Se deja constancia que, mediante Carta N°120-2026-CSF-SUP.HOSP.SAN FRANCISCO/EMU, de fecha 25.08.2026, esta Supervisión ha remitido al Contratista el pronunciamiento técnico de la Especialista en Arquitectura, contenido en el Informe N°024-2026-EA-VAEH/SUP-CSSF, respecto del levantamiento de o...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 119 · Consultas · SOEC_RESI · 14/08/2026

...uerimiento definitivo sea establecido oportunamente y resulte compatible con las alternativas tecnicamente disponibles en el mercado. de no efectuarse dicha precision en esta etapa se podrian generar retrasos en la definicion y aprobacion de las condiciones tecnicas, afectando los plazos previstos para la adquisicion, suministro, instalacion y puesta en funcionamiento del tomografo... continua:

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 02/08/2026

COMUNICA REMISIÓN DE INFORMES COMPLEMENTARIOS Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: PONGO EN CONOCIMIENTO QUE, MEDIANTE CARTA N.º 050 – 2026/CSLMII-RC, EL CONTRATISTA REMITE INFORMES COMPLEMENTARIOS ELABORADOS POR LOS ESPECIALISTAS CONTRACTUALES, EN LOS CUALES SE ABSUELVEN Y SUSTENTAN LOS ALCANCES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA....

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 72 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026

...03.01 columnasen consecuencia, se comunica al contratista a adoptar las medidas tecnicas, administrativas y logisticas necesarias que aseguren el cumplimiento de la programacion contractual, evitando retrasos que puedan afectar el avance de la obra.se deja constancia para los fines correspondientes.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 69 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026

CARTA PRESENTADA AL CONTRATISTA – REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS HOSPITALARIOS: Se deja constancia que, mediante Carta N°028-2026-CSF-SUP.HOSP.SAN FRANCISCO/EMU, de fecha 18.07.2026, esta Supervisión requiere al contratista la presentación de Fichas Técnicas del equipamiento hospitalario, conforme a los plazos establecidos en el Expediente Técnico.Se deja constancia para los fines corresp...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
