


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra principal del proyecto mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del establecimiento de salud simon bolivar distrito de cajamarca provincia de cajamarca departamento de cajamarca con CUI n 2502679

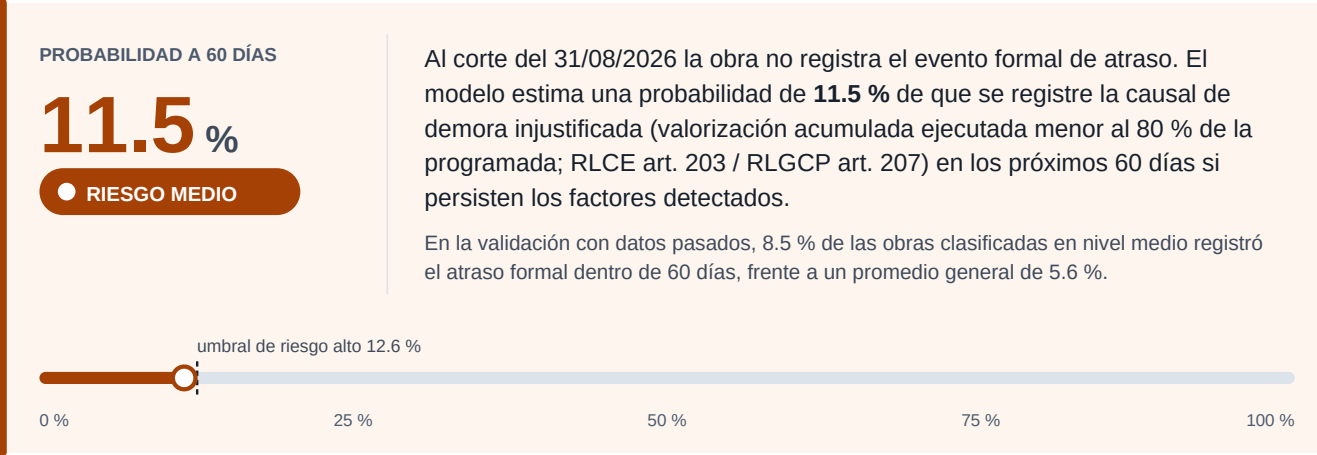


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 2,460,143.58	120 días	312 desde 15/07/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N 2502679
Entidad contratante	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Contratista	CONSORCIO EDIFICADOR CAJAMARCA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2502679
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2315404
Monto del contrato	S/ 2,460,143.58
Monto aprobado de la inversión	S/ 164,898,976.77
Cuaderno de obra digital	312 asientos entre 15/07/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

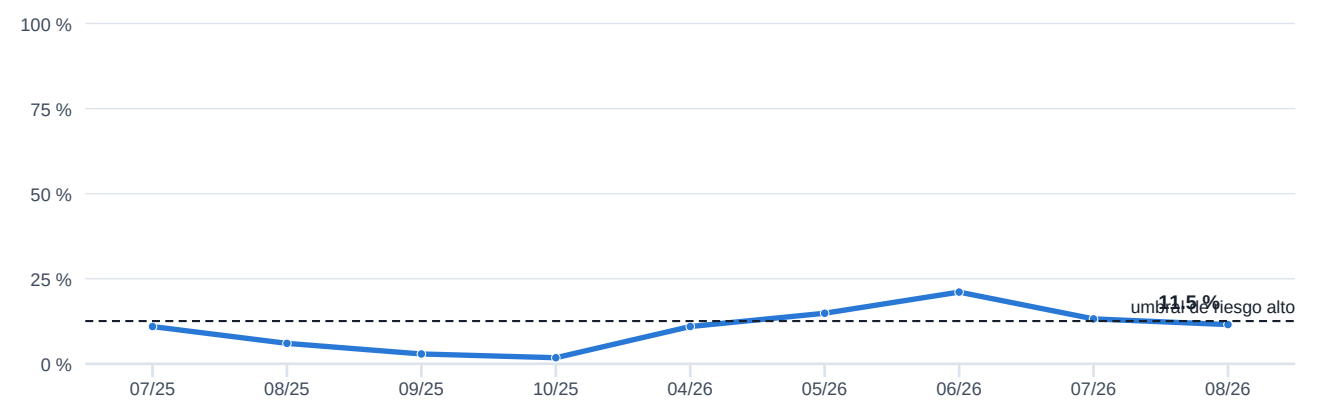

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/07/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.693
El 32 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.245
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
8 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.107
Registros del último mes: 0.69 veces el promedio mensual del trimestre	Actividad del cuaderno de obra		-0.103
Gasto devengado en lo que va del año: S/ 27,312,007	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.098
7 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.098

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	11.5 %	9.9 %	-1.7 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.5 %	11.5 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.5 %	11.7 %	+0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 305 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

inicio de circunstancias de ampliacion de plazo por demora en el pronunciamiento de la entidad respecto a la prestacion adicional de obra n 02 2/2 viene del asiento n304en consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el literal a) del articulo 197, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 306 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

...n de la ejecucion de las partidas contractuales 01.01.05 remocion 1/3 . mediante asiento n 30 del residente de obra, con fecha 15 de abril del 2026 se anoto el asiento con asunto: inicio de causal de demora en la obra, por la imposibilidad de culminar la ejecucion de las partidas contractuales 01.01.05 remocion.lo cual se dejo con constancia del inicio de las circunstancias que imposibilitan la ejecucio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 308 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

... 2.50 m)- 01.01.05.07 remocion de redes de desagüe y sus componentes cuyas circunstancias se encuentran comprendidas dentro de la causal prevista en el literal a) del articulo 197 del rlce, referida a atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.asimismo, se deja constancia de que la situacion descrita se encuentra asociada a los riesgos contractuales establecidos en el cuadro de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 304 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

inicio de circunstancias de ampliacion de plazo por demora en el pronunciamiento de la entidad respecto a la prestacion adicional de obra n 02 1/2 . con fecha 23/07/2026, mediante carta n 071-2026-consorcio edificador, se presento el adicional n 02 - muro de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 263 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026

RESPUESTA A ASIENTO N°259 Y 260: Con respecto al asiento N° 259 y 260 del residente de obra, se indica que la consulta N°14 realizada por el contratista mediante asiento N°230, referido a la línea de desagüe que pasa por el área del proyecto (PABELLON A), fue respondida por la supervisión en dos asientos del cuaderno de obra (Asiento N° 227 y N° 232), en la que se le indica: 1. la consulta realizada debe presentar ni...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 254 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 30/07/2026

ANBSOLUCION DE CONSULTA 06 DE PRONIS: Con respecto a la consulta N°06 realizada mediante asiento N° 80 de fecha 28 de mayo del 2026, referido a la incompatibilidad de material y dimensión de albañilería del cerco perimétrico, se indica que la entidad hace realizado la absolución de la consulta, mediante carta 2174-2026-MINSA/PRONIS-UO, de fecha 24 de julio del 2026, la cual se adjunta al presente asiento de obra, y s...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 232 · Consultas · SOEC_SPV · 17/07/2026

REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS PREVIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA N.º 14 – INTERFERENCIA DE RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE: En atención al Asiento de Obra N.º 230 del Residente de Obra, mediante el cual formula la Consulta de Obra N.º 14 respecto a la interferencia de una red de alcantarillado sanitario existente proveniente de DIRESA Cajamarca, esta Supervisión señala que la situación expuesta ya fue materia de...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 207 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026

.... 203 y 204 del residente de obra . se toma conocimiento de los asientos n. 203 y 204 efectuados por el residente de obra, mediante los cuales manifiesta su disconformidad con la cuantificacion de la penalidad por incumplimiento del equipo minimo ofertado en obra realizada por esta supervision.al respecto, se precisa que, conforme se dejo constancia en el asiento n. 202 del cuaderno de obra, el informe n. ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 202 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 09/07/2026

REMISIÓN A LA ENTIDAD DEL INFORME DE CUANTIFICACIÓN DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL EQUIPO MÍNIMO OFERTADO EN OBRA: Se deja constancia que, en la fecha, esta Supervisión ha cursado a la Entidad la CARTA N.º 046-2026-RL-OBR-OP-CSBI/PRONIS, mediante la cual se remite el Informe N.º 045-2026-JS-WAMM/CSBI, que contiene la cuantificación de la penalidad por incumplimiento del equipo mínimo ofertado en obra por parte d...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
