


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Construcción de laboratorio, adquisición de equipo de laboratorio y equipo de ambientes de procesos operacionales, en el (la) empresa municipal de servicios de agua potable y alcantarillado de san martin sa distrito de saposoa, provincia de huallaga, san martin

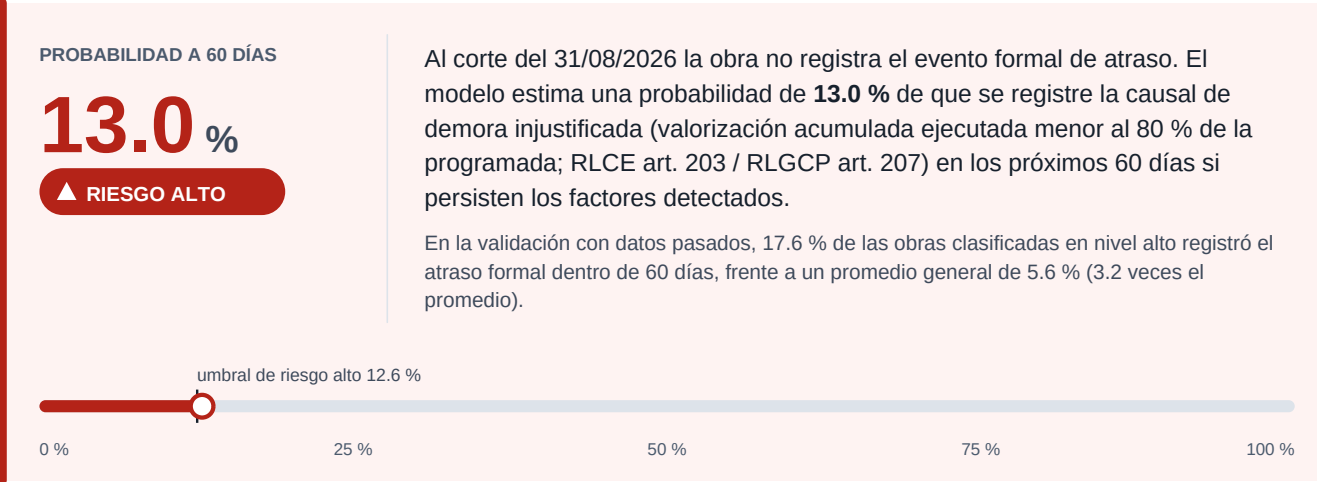

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	55 desde 24/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, EN EL (LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN SA DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, SAN MARTIN
Entidad contratante	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
Contratista	CONSORCIO SAN MARTIN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAPOSOA / HUALLAGA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2652934
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE LABORATORIO ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2408820
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,733,761.40

Cuaderno de obra digital

55 asientos entre 24/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

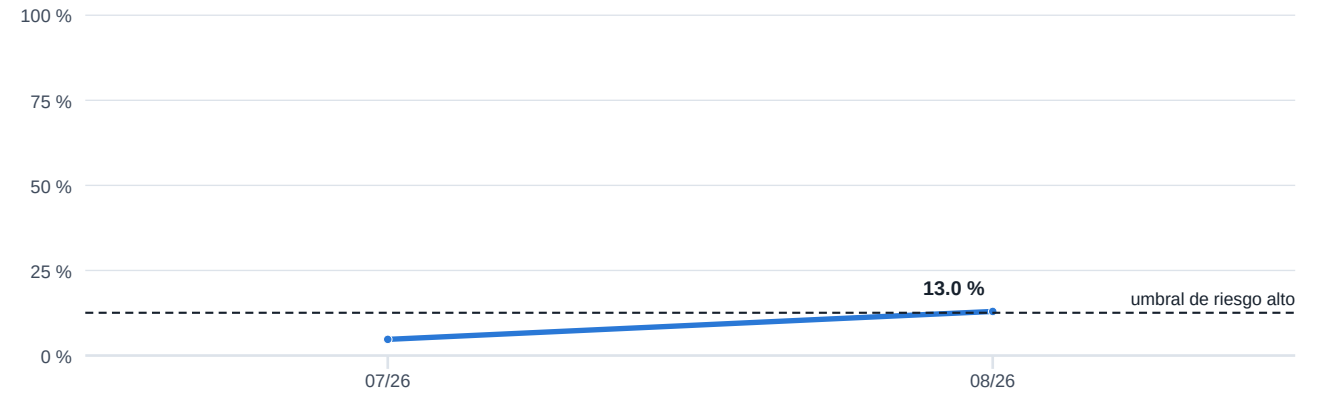

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.276
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.143
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.138
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.108
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.098
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.089
Extensión media de los asientos recientes: 1,233 caracteres	Contenido de los asientos		-0.081
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	13.0 %	12.6 %	-0.3 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.0 %	12.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.0 %	13.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 50 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 28/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA FORMULADA POR EL RESIDENTE MEDIANTE EL ASIENTO N°28 Y 29: En atención a la consulta formulada mediante Asiento N.º 28 y N.º 29, respecto de la interferencia física identificada entre los dos (02) tomacorrientes proyectados y las instalaciones existentes correspondientes al Sistema SCADA de la PTAP, esta Inspección de Obra, luego de evaluar lo señalado, comunica lo siguiente:Respecto a la ejecución...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 28/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA FORMULADA POR EL RESIDENTE MEDIANTE EL ASIENTO N°25 Y 26: En atención a la consulta formulada mediante los Asientos N.º 25 y N.º 26, respecto a las incompatibilidades identificadas en campo para la ejecución de las partidas 1.4.2.1 Salida de Agua Potable, 1.4.3.1 Salida de Desagüe y 1.4.4.1 Salida de Drenaje Pluvial, y considerando la existencia de interferencias con infraestructura existente per...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 21/08/2026

... se verifica que el contratista presento el informe tecnico de programacion, calendarios y cronogramas actualizado mediante carta n. 002-2026-acra-rc, con fecha 30 de julio de 2026, configurandose un retraso de cuatro (04) dia calendario respecto del plazo legalmente la establecido. asimismo, de la revision de la clausula decima quinta - penalidades la menciona 15: programacion, calendarios y cronograma...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 21/08/2026

... 08 de julio de 2026. se verifica que el contratista presento el informe tecnico de revision del expediente tecnico mediante carta n 001-2026-acra-rc, con fecha 09 de julio de 2026, configurandose un retraso de un (01) dia calendario respecto del plazo legalmente establecido. en consecuencia, esta supervision determina que el contratista incumplio el plazo de presentacion previsto en el numeral 171.1 de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 21/08/2026

PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE: • Con fecha 22 de junio de 2026, la Entidad EMAPA SAN MARTÍN S.A. y el Contratista CONSORCIO SAN MARTÍN suscribieron el Contrato N° 000013-2026-EMAPA-SM-SA-GG, iniciándose el cómputo del plazo previsto en el numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley N° 32069. • Conforme a la citada disposición normativa, el plazo máximo para la presentación del I...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 21/08/2026

...6-acra-rc, con fecha 30 de julio de 2026, configurandose un retraso de cuatro (04) dia calendario respecto del plazo legalmente la establecido. asimismo, de la revision de la clausula decima quinta - penalidades la menciona 15: programacion, calendarios y cronogramas por no en de presentar a la supervision y/o inspeccion, los calendarios y programacion de obra actualizado a la fecha de inicio de obra dentr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 21/08/2026

...6-acra-rc, con fecha 09 de julio de 2026, configurandose un retraso de un (01) dia calendario respecto del plazo legalmente establecido. en consecuencia, esta supervision determina que el contratista incumplio el plazo de presentacion previsto en el numeral 171.1 del articulo 171 del reglamento de la ley no 32069. asimismo, de la revision de la clausula decima quinta penalidades del contrato no 000009-20...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 37 · Aplicación de penalidades · SOEC_INSP · 21/08/2026**

PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN, CALENDARIOS Y CRONOGRAMAS ACTUALIZADO: • Con fecha 20 de julio de 2026, los representantes de la EPS EMAPA SAN MARTÍN SA, de la empresa CONSORCIO SAN MARTIN y el Inspector de Obra ING. MARX CHANOC GÓMEZ VARGAS, en el área de terreno donde se llevará a cabo la Ejecución de la Obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/08/2026**

...utorizacion para el inicio del vaciado de concreto en los sobrecimientos, dejando constancia de su conformidad en el cuaderno de obra, a fin de dar continuidad a la programacion de ejecucion y evitar retrasos en la ruta critica del proyecto.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 18 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_RESI · 03/08/2026**

...a solicitud para que la inspeccion de obra emita el pronunciamiento tecnico correspondiente respecto de los mayores metrados comunicados, a fin de evitar afectaciones al normal desarrollo de la obra, retrasos en la programacion vigente y eventuales impactos en la ruta critica del proyecto.se deja expresa constancia que cualquier afectacion al plazo, rendimiento o continuidad de la obra derivada de la fa...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
