


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de vías urbanas en la URB. Santa luisa ii etapa, distrito de los olivos, provincia lima, departamento lima- segunda etapa con CUI nº 2301476

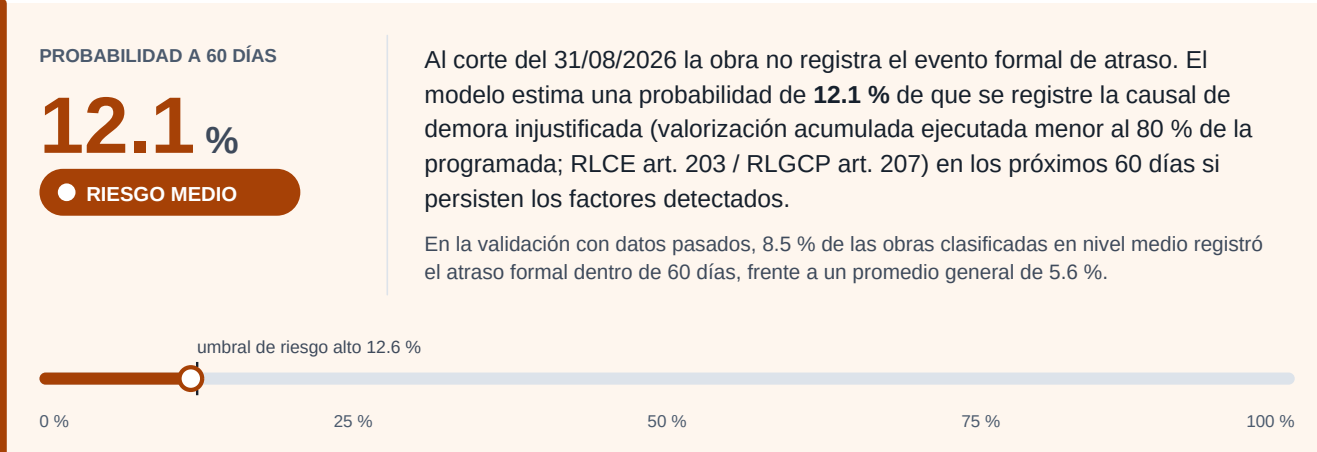


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	49 desde 04/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LA URB. SANTA LUISA II ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA- SEGUNDA ETAPA CON CUI Nº 2301476
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)
Contratista	CONSORCIO LOS OLIVOS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2301476
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LA URB. SANTA LUISA II ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2409489
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,227,361.00
Cuaderno de obra digital	49 asientos entre 04/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

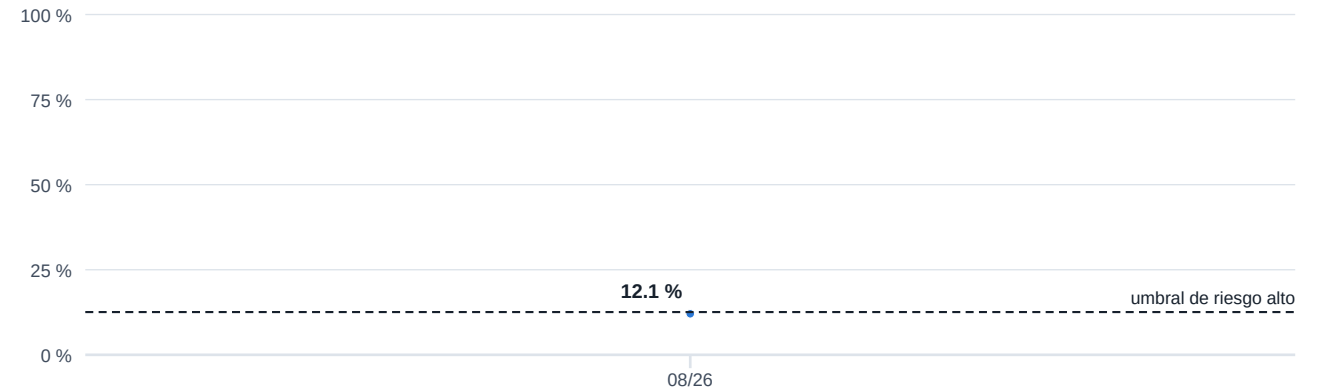

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.546
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.199
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.169
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.093
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.087
Extensión media de los asientos recientes: 1,177 caracteres	Contenido de los asientos		-0.082
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.077
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidad, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.068

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 40 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Antes del inicio de los trabajos, se verificó la realización de la charla de 5 minutos en materia de seguridad y salud en el trabajo, se realizó el cierre de las áreas de trabajo con elementos de seguridad.-En la calle San Lino, en el tramo San Héctor/San Fernando, se realizó la conformación de veredas a nivel de capa de subrasante, se realizó la eliminación de los bloques de concreto producto...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026**

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Antes del inicio de los trabajos, se verificó la realización de la charla de 5 minutos en materia de seguridad y salud en el trabajo, se realizó el cierre de las áreas de trabajo con elementos de seguridad.-En la calle San Lino, en el tramo San Hernán / San Héctor, se realizó el vaciado de la mezcla de concreto para veredas, vibrado, nivelado y acabados. En el tramo San Héctor/San Fernando se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 8 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 06/08/2026**

LIBERACION DE REJAS VIA PEATONAL: En atención al asiento de la contratista sobre las interferencias ocasionadas por la oposición de una vecina al retiro de rejas (sector de la vereda) en la calle San Lino, esta Supervisión constata que la contratista fue, impedido de continuar con los trabajos de demolición en el tramo afectado y genera la necesidad de garantizar la libre disponibilidad del área de intervención, por ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
