


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y creación de unidades básicas de saneamiento en las localidades de oyoccocha, yuracc cancha, pisquiri, toccto, rurunmarca y ccasancca, distrito de caja-acobamba-huancavelica.

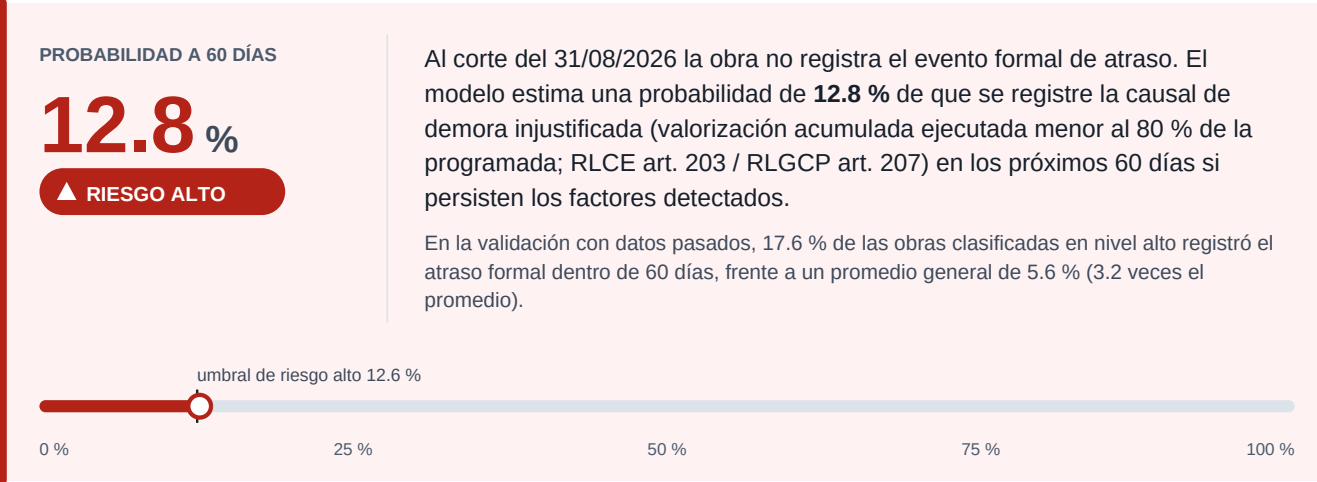


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	60 desde 17/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE OYOCCHOCHA, YURACC CANCHA, PISQUIRI, TOCCTO, RURUNMARCA Y CCASANCCA, DISTRITO DE CAJA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA ESPIRITU
Contratista	EFF INGENIEROS E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAJA / ACOBAMBA / HUANCAVELICA
Código Único de Inversión (CUI)	2338461
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE OYOCCHOCHA, YURACC CANCHA, PISQUIRI, TOCCTO, RURUNMARCA Y CCASANCCA, DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2397945
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 13,535,412.00
Cuaderno de obra digital	60 asientos entre 17/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

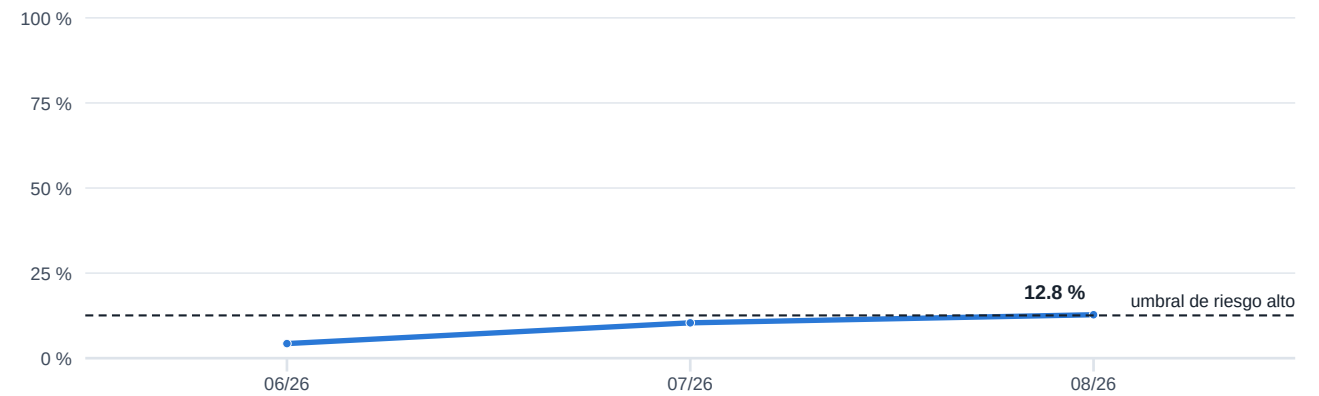

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.280
El 24 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.188
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.46 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.171
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.140
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.136
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.082
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 3,580,688	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.081

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.8 %	12.8 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	12.8 %	12.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 54 · Consultas · SOEC_RESI · 25/08/2026

...equeridas para ser zarandeado y utilizado como material de relleno.lo señalado se comunica a fin de evitar la ejecucion de trabajos que posteriormente puedan ser observados, prevenir mayores costos y retrasos en la ejecucion, y garantizar la correcta instalacion y proteccion de las tuberías, solicitandose que las soluciones tecnicas que correspondan sean definidas y autorizadas previamente por la superv...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/08/2026

... renuncia de trabajadores especialmente de las que venian trabajando en la construccion de las ubs, por tanto se tiene q sustituir con otros personales para dar la continuidad con el trabajo y evitar retraso de obra. de acuerdo a la informacion del especialista de calidad de la supervisor, en algunos sectores de las localidades de oyoccocha, toccto, pisquiri y rurunmarca la prueba de test de percolacion...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

CUARADO DE COMCRETO E INSTALACION DE LAS TUBERIAS: Mediante el presente asiento se ordena al residente de obra para que implemente de inmediato las siguientes indicaciones y posterior informe, bajo responsabilidad.- Contratar personales para que puedan realizar el curado de las obras de concreto y albañilerías ejecutadas durante un periodo consecutivo de 7 días con riego de 4 a 5 veces al día, además los testigos se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 17/08/2026

...se solicita al residente de obra, que la provision de los materiales de construccion tiene q ser de manera fluida, tales asi que hoy dia se agoto el abastecimiento de cemento, para evitar posteriores retrasos de obra.la ejecucion de las partidas programadas continuan en las localidades de oyoccocha, pisquiri, toccto, y rurunmarca.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

... las redes de conduccion ubicadas en las localidades de pisquiri, toccto, y rurunmarca, y iniciar con los trabajos de excavacion de zanja de las redes de agua en la localidad de oyoccocha para evitar retraso de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 40 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

aprobacion del cambio de personal clave ambiental propuesto . con fecha de hoy dia 11/08/2026 se le notifica al contratista la aprobacion del cambio de especialista ambiental propuesto mediante resolucion de gerencia municipal n71-20...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

inicio de tramite de cira ccasancca . se insta al residente iniciar con el nuevo trazo de la linea de conduccion en la localidad de ccasancca en incumplimiento a las recomendaciones del ministerio de cultura por la existencia de camino de herradura reconocida, y luego se proceda a realizar el tramite de cira que exista la autorizacion correspondiente...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Órdenes · SOEC_SPV · 05/08/2026

...o, y el uso de los implementos de seguridad es imprescindible bajo responsabilidad del profesional a cargo.implementar un maestro de obra dentro de las 48 horas, caso contrario se estara aplicando la penalidad correspondiente, ademas su participacion es necesario con la finalidad de hacer seguimiento y control tecnico de las actividades en ejecucion.con respecto a la localidad de yuracc cancha segun la ver...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 35 · Órdenes · SOEC_SPV · 05/08/2026**

ORDEN DE RETIRO DE MATERIAL INADECUADO: Se ordena al Residente de obra, retirar de la obra las piedras que abastecieron para la cimentación de la UBS por no corresponder a la granulometría indicada en el expediente técnico, bajo responsabilidad, y sustituir con piedra de río con dimensiones de 6" a 8" tal como indica en las especificaciones técnicas. Los materiales como hormigón, piedra chancada y arena deben ser trat...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026**

...ulio 2026.se reitera al residente de obra proveer a todos los materiales programado en el mes de julio 2026, entre ellos las tuberías bajo responsabilidad, caso contrario se estará interpretando como incumplimiento del cronograma de adquisición de materiales y la penalidad correspondiente.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026**

VERIFICACION DE CALIDAD DE LADRILLO: Con fecha 16 de julio arribaron a la obra los materiales siguientes: Acero corrugado de 3/8" y de 1/4", ladrillo de cara vista, por lo que se solicita al Residente realizar la prueba de absorción y prueba de resistencia a comprensión de los ladrillos antes de su uso. además se solicita el certificado de calidad de los aceros para poder autorizar su uso. La ejecución de las activ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
