


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra del saldo de obra del proyecto: Ampliacion de la capacidad de albergue y construccion de areas complementarias en el complejo penitenciario de arequipa CUI N° 2158194 - etapa i

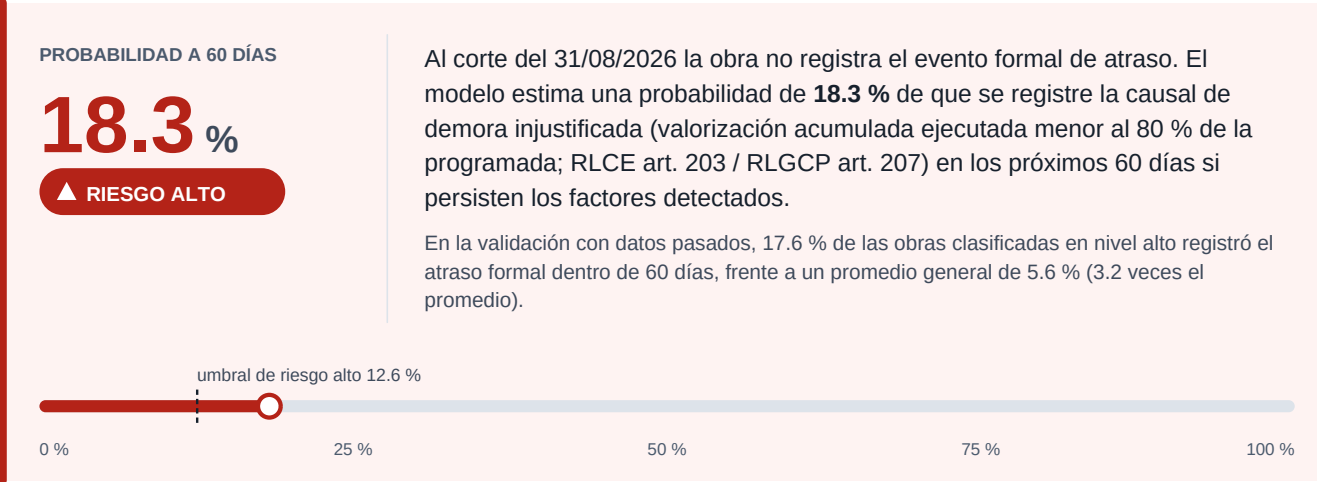


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	249 desde 23/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA CUI N° 2158194 - ETAPA I
Entidad contratante	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Contratista	CONSORCIO TUPAC A
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SOCABAYA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2158194
Inversión asociada	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA
Función	JUSTICIA
Identificador del contrato (SEACE)	2383987
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 64,962,355.00
Cuaderno de obra digital	249 asientos entre 23/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

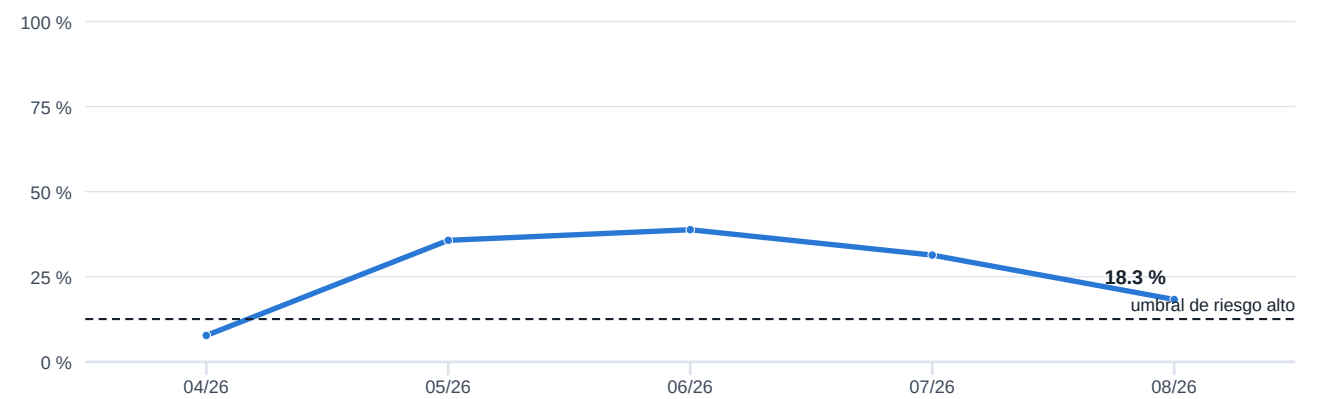

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.81 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.616
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.211
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.164
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.157
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.75 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.146
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
18 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.106
Según el último avance declarado en el cuaderno, se ejecutó el 114 % de lo programado	Avance declarado en el cuaderno		-0.082

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.3 %	18.1 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.3 %	18.1 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 217 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 18/08/2026

...y preliminares como son almacenes, cercos entre otros . viene del asiento anterior....3.- se constata que a la fecha el residente de obra no ha registrado ninguna justificación técnica ni causales de retraso imputables a la entidad o de fuerza mayor en este cuaderno de incidencias. por lo tanto, el consumo del 12% del plazo contractual total sin abrir los frentes de las estructuras principales es de ent...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 211 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 17/08/2026

...ncion fase i, debidamente actualizado y subsanado, en un plazo maximo de tres (3) dias calendario, contados desde el dia siguiente de la recepcion de la presente, ello sin perjuicio, de aplicarse las penalidades que correspondan.se adjunta la carta n1433 -2026-jus/oga-oab, para su conocimiento y cumplimiento bajo responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 202 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 13/08/2026

REITERATIVO RESPUESTA CONSULTA 04 - POR INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL LADRILLO: En cumplimiento de mis funciones como tal de seguimiento y control de obra según contrato N° 018-2025-INPE-OIP, Procedimiento de selección no competitivo N°005-2025-INPE-OIP-LOG-1 y los respectivos términos de referencia y en virtud de la designación del Consorcio Supervisor Arequipa para la ejecución...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 190 · Órdenes · SOEC_SPV · 10/08/2026

...fra penal, que el inicio de la partida instalaciones sanitarias red colectora es el día 11-08-2026, se solicita al contratista proveer su implementación y ejecución en el proyecto para evitar caer en atrasos innecesarios.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 189 · Consultas · SOEC_RESI · 07/08/2026

...solicita a la supervisión emitir el pronunciamiento técnico integral correspondiente, a fin de definir el tratamiento constructivo aplicable para la ejecución de los acabados arquitectónicos y evitar retrasos en la ejecución de las partidas involucradas, garantizando la correcta continuidad de la obra. asimismo, se deja constancia que el contratista permaneciera a la espera del pronunciamiento correspondiente...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 186 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 07/08/2026

...dientes a la partida de obras provisionales y preliminares siendo un riesgo alto en el proyecto de caer en atraso.se deja constancia de que el residente de obra no ha anotado ningún sustento técnico, retraso por fuerza mayor, ni causal de atribución a la entidad que justifique la no apertura de los frentes de trabajo principales (estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, demolición...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/07/2026

RESPUESTA A CONSULTA 03 DEL CONTRATISTA: En cumplimiento de mis funciones como tal de seguimiento y control de obra según contrato N° 018-2025-INPE-OIP, Procedimiento de selección no competitivo N°005-2025-INPE-OIP-LOG-1 y los respectivos términos de referencia y en virtud de la designación del Consorcio Supervisor Arequipa para la ejecución de la consultoría del saldo de obra indicamos al contratista CONSORCIO INFRA...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 147 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/07/2026

OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (CAM): En cumplimiento de mis funciones como tal de seguimiento y control de obra según contrato N° 018-2025-INPE-OIP, Procedimiento de selección no competitivo N°005-2025-INPE-OIP-LOG-1 y los respectivos términos de referencia y en virtud de la designación del Consorcio Supervisor Arequipa para la ejecución de la consultoría del saldo de obra indicamos al cont...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 147 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/07/2026

...pa, cui n2158194 - etapa i.a traves del presente asiento se le alcanza al contratista consorcio infra penal observaciones al cronograma de adquisicion de materiales (cam), de acuerdo a lo siguiente:- incumplimiento de la linea base basado en lo ejecutado (abril y mayo 2026).- inconsistencia cuantitativa y descalce con los apus ofertados.- ruptura de la sinergia temporal y logistica (gantt vs cam).- crite...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
