


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecucion de obra: Creación de los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el centro cultural del sector 06 del distrito de la molina - provincia de lima- CUI n 2628591

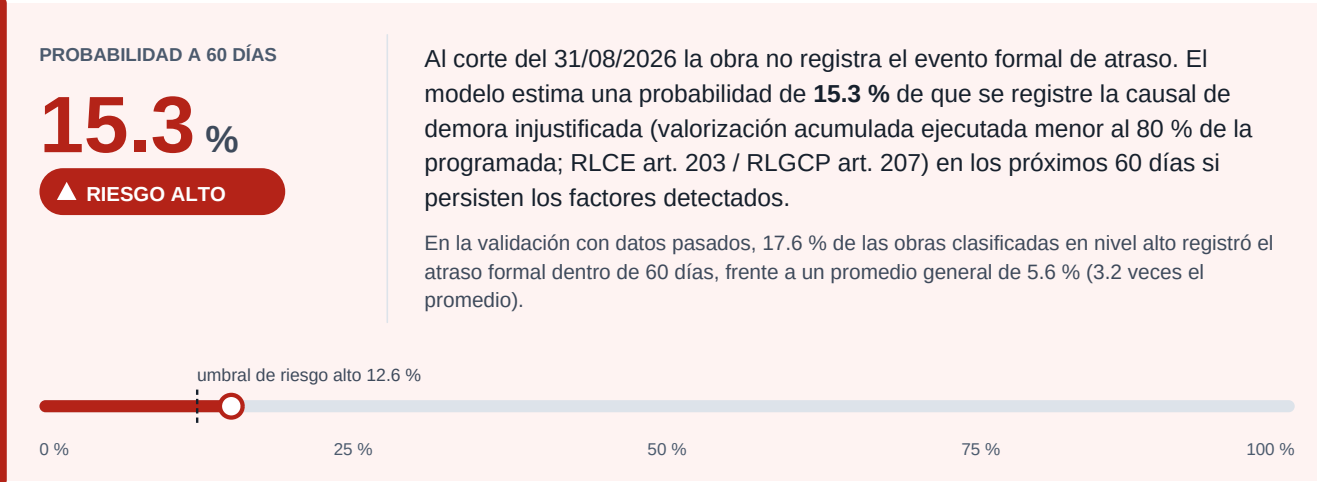


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	342 desde 19/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL CENTRO CULTURAL DEL SECTOR 06 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA- CUI N 2628591
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Contratista	CONSTRUCTORA COPAO S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA MOLINA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2628591
Inversión asociada	CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL CENTRO CULTURAL DEL SECTOR 6 DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2377993
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 13,375,287.67
Cuaderno de obra digital	342 asientos entre 19/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

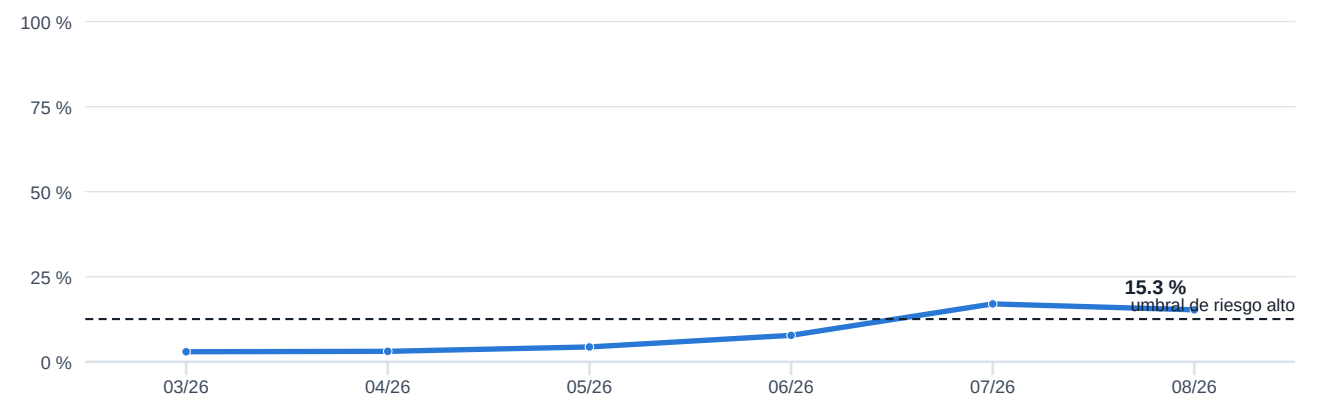

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.475
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.197
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.174
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.162
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,103,936	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.100
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
24 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.094

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 317 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

VIENE DEL ASIEN TO ANTERIOR: Asimismo, el Contratista, como ejecutor de la obra, conoce los límites y alcances físicos de su área de intervención, por lo que no corresponde efectuar una nueva delimitación para atender el requerimiento formulado por la Entidad. Por su parte, la Entidad ha identificado el área requerida para la ejecución de la obra vial mediante el Plano de Intervención PI-01 y ha dispuesto el retiro de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 317 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para hacer efectiva la liberacion solicitada, dejando el area libre de cualquier elemento atribuible a la ejecucion de la presente obra. en caso de incumplimiento, demora injustificada o persistencia en la ocupacion del area requerida, el contratista sera responsable por las consecuencias que se deriven directamente de dicha situacion, incluyendo las re...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 317 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...a inmediata las acciones necesarias para hacer efectiva la liberacion solicitada, dejando el area libre de cualquier elemento atribuible a la ejecucion de la presente obra. en caso de incumplimiento, demora injustificada o persistencia en la ocupacion del area requerida, el contratista sera responsable por las consecuencias que se deriven directamente de dicha situacion, incluyendo las responsabilidades...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 252 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/07/2026

...e se encuentran bajo su responsabilidad contractual, encontrandose el procedimiento actualmente sujeto a los plazos y actuaciones propias de sedapal, entidad ajena a las partes del contrato.cualquier demora que pudiera generarse como consecuencia de los tiempos de evaluacion, atencion, aprobacion o ejecucion por parte de sedapal constituye una circunstancia no imputable al contratista, razon por la cual...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 254 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/07/2026

...plicable para solicitar, de corresponder, la ampliacion de plazo, el reconocimiento de mayores gastos generales, costos y cualquier otro efecto contractual que pudiera originarse como consecuencia de retrasos atribuibles a la empresa concesionaria, siempre que tales circunstancias afecten la ejecucion de la obra o la ruta critica del cronograma vigente.se adjunta la documentacion sustentatoria correspon...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 253 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/07/2026

...ortunamente con las obligaciones contractuales que le corresponden respecto al inicio, seguimiento y atencion del procedimiento administrativo ante la empresa concesionaria, no existiendo inaccion ni demora imputable al contratista.por tanto, cualquier plazo que demande la evaluacion tecnica, revision documentaria, inspecciones, autorizaciones, programacion de trabajos o cualquier otra actuacion propia ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 246 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

REITERATIVO EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE ANTE SEDAPAL Y RESPONSABILIDAD POR AFECTACIÓN AL PLAZO CONTRACTUAL: En atención al Asiento N.º 113 de fecha 26/05/2026, mediante el cual se solicitó al Contratista informar el estado del trámite de factibilidad, suministro e instalación del medidor de agua potable ante SEDAPAL y remitir la documentación que acredite las gestiones realizadas, se deja constancia que, a la fecha, el...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 248 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

...de actividades o interferencia en la ejecucion de la obra ocasionados por la falta de gestion oportuna del tramite ante luz del sur sera de exclusiva responsabilidad del contratista, al constituir un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de su deber de planificacion y programacion de la ejecucion de la obra. en ese sentido, no correspondera invocar dicha circunstancia como sustento para soli...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 246 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

...cion de actividades posteriores o interferencia en la programacion de la obra derivada de la falta de gestion oportuna ante sedapal sera de exclusiva responsabilidad del contratista, al constituir un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de su deber de planificacion y ejecucion diligente de la obra. por tanto, no correspondera atribuir a esta circunstancia causal alguna que sustente solitu...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 191 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 07/07/2026

ABSOLUCIÓN DE CONSULTA TÉCNICA – ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA: En atención al Asiento N.º 164, mediante el cual el Contratista formuló consulta técnica respecto a la compatibilización entre los planos estructurales y los metrados correspondientes a la partida "Encofrado y Desencofrado Normal", al Asiento N.º 172 de esta Supervisión, mediante el cual se requirió complementar y sustentar técnicamente la consulta formula...

Fuente: cod-asientos202607.csv

05

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
