


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de ejecución de obra denominada: "construcción de vereda o acera y calzada o pista, en el(la) calle islas ballestas (desde la AV. García Rada, hasta la AV. Sunset) distrito de punta hermosa, provincia de lima, departamento de lima" con CUI nº 2710432

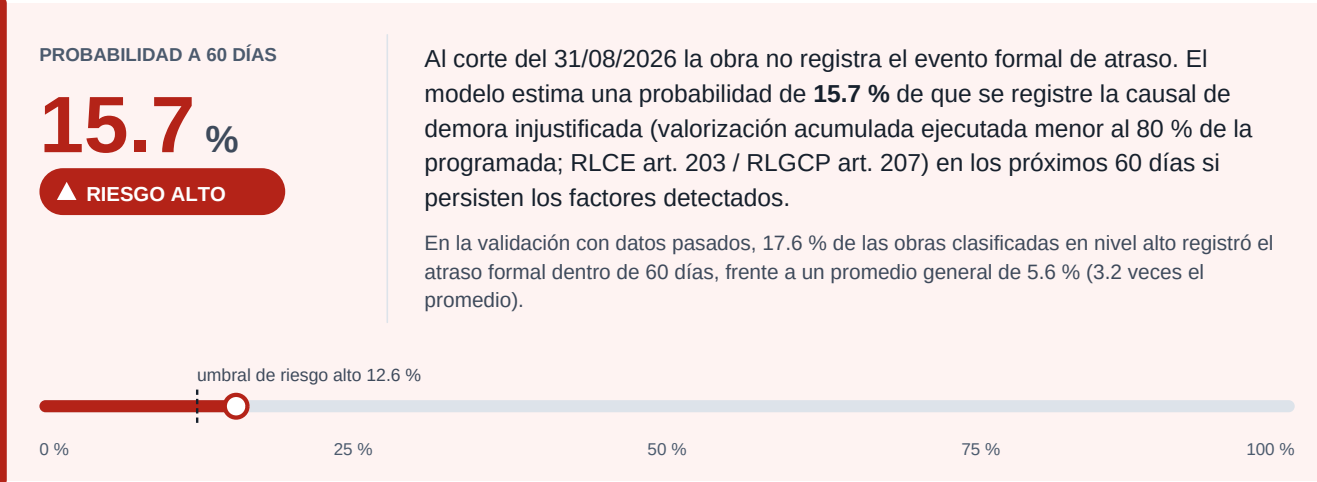


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	30 desde 11/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA Y CALZADA O PISTA, EN EL(LA) CALLE ISLAS BALLESTAS (DESDE LA AV. GARCIA RADA, HASTA LA AV. SUNSET) DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2710432
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
Contratista	CONSORCIO PERU CONSTRUYE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUNTA HERMOSA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2710432
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE VEREDA O ACERA Y CALZADA O PISTA EN EL(LA) CALLE ISLAS BALLESTAS (DESDE LA AV. GARCIA RADA HASTA LA AV. SUNSET) DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2413483
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,187,046.61
Cuaderno de obra digital	30 asientos entre 11/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

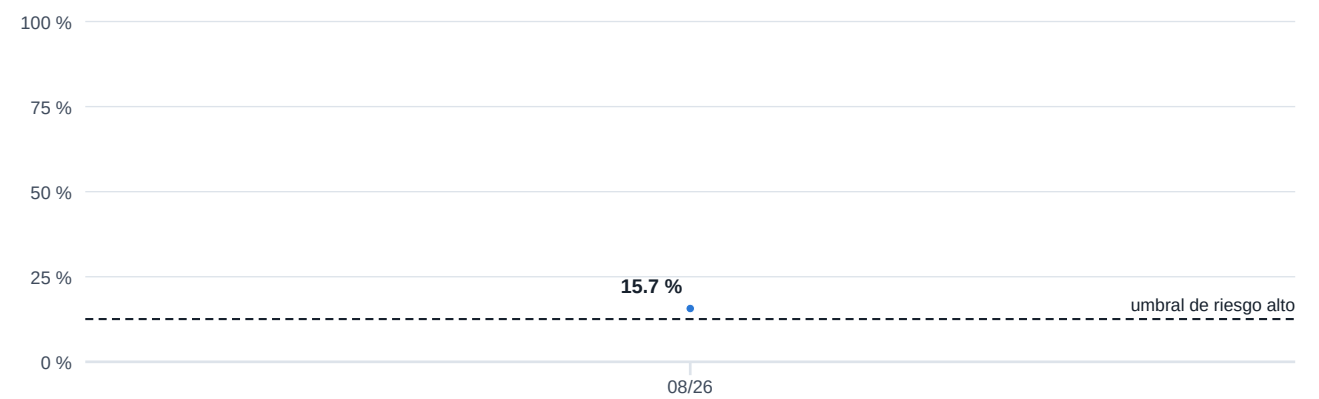

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.488
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.284
El 57 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.218
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.153
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.129
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.099
Hubo registros en el cuaderno 18 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.062
Entidad contratante: municipalidad distrital	Características de la obra		-0.060

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.7 %	15.7 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	15.7 %	15.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...ias habiles, comuniquen las acciones y medidas concretas que adoptara para superar la restriccion social, liberar los frentes de trabajo y definir el tratamiento contractual del periodo afectado, bajo apercibimiento de iniciar las acciones contractuales correspondientes.a la fecha, persiste el impedimento que imposibilita ejecutar las partidas de demolicion previstas en la ruta critica, mientras el plazo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

se continua atraso durante la ejecucion de la obra . se continua atraso en la ejecucion de la obra, atribuibles precisamente a la entidad, ya que a la fecha se verifica problema social.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

se continua atrasos en la ejecucion . contruamos atraso en la ejecucion, por los vecinos que no dejan trabajar, estos atrasos son atribuibles a la entidad unicamente, entregan el terreno y verificamos que la poblacion...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 22 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

atrasos atribuibles a la entidad . los vecinos no dejan ejecutar los trabajos correspondientes a la obra, estos atrasos en la ejecucion son atribuibles exclusivamente a la entidad.seguimos a la espera que ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

atrasos en la ejecucion . grupo de vecinos continuan no dejando trabajar, se ha informado a la entidad y no se vee apoyo de la entidad, atrasos atribuibles a la entidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

...e la supervision se verifica que vecinos continuan obstruyendo la ejecucion de los trabajos, atrasos atribuibles a la entidad ya que el terreno no esta libre para ejecutar , ya que vecinos se oponen, incumpliendo la entidad para inicio de ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/08/2026

CONTINUAMOS CON ATRASOS EN LA EJECUCION, VECINOS NO DEJAN TRABAJAR.: el dia de hoy personal va a laborar a obra e igualmente que ayer, vecinos se oponen y no dejan trabajar, estos atrasos no son atribuibles al contratista, por lo que se ha parado la ejecucion ya que primero esta la seguridad del personal en obra que estaban expuestos a agresion de vecinos y moradores de la zona.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

VERIFICACIÓN DE INCIDENCIA SOCIAL Y POSIBLE AFECTACIÓN A LA RUTA CRÍTICA: En atención al Asiento N.º 06 registrado por el Residente de Obra, de fecha 12 de agosto de 2026, mediante el cual comunica la persistencia de la oposición de pobladores del sector y señala la existencia de atrasos no atribuibles al Contratista, esta Supervisión deja constancia de haber tomado conocimiento de lo comunicado.Al respecto, realizad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 6 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 12/08/2026

ATRASOS EN LA OBRA NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: TENIENDO INSTALADOS TODAS LAS PARTIDAS DE LAS OBRAS PROVISIONALES, A LA FECHA NO SE PUEDE INTERVENIR LA CONTINUACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE LOS VECINOS SE OPONEN A LA EJECUCION DE TRAZO NIVELS Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA DAR INICIO A LA DEMOLICION, SE REITERA QUE SE CUENTA CON LAS MAQUINARIAS OFERTADAS EN EL PROYECTO, SE MENCIONA A LA SUPERVISION QUE LA NOC...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
