


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de la obra: "remodelacion de mirador turistico, construccion de la casa de fuerza, ambiente complementario y cisterna, ademas de otros activos en el(la) mirador turistico, en el(la) naciente del recurso turistico publico "rio amazonas" en el centro poblado grau, distrito de nauta, provincia de nauta, departamento de loreto" con CUI N° 2650508

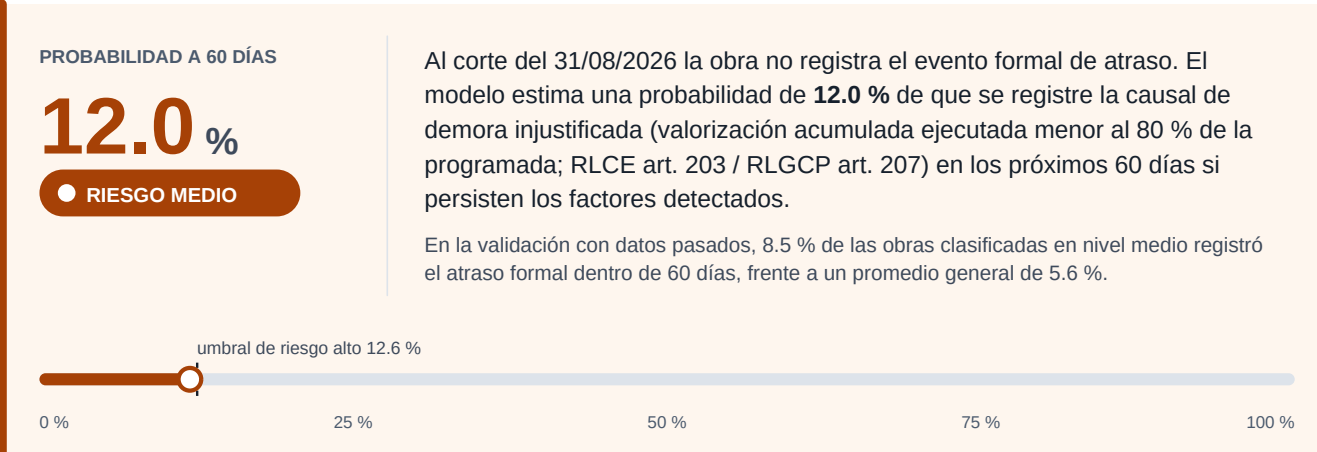

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	108 desde 25/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REMODELACION DE MIRADOR TURISTICO, CONSTRUCCION DE LA CASA DE FUERZA, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CISTERNA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MIRADOR TURISTICO, EN EL(LA) NACIENTE DEL RECURSO TURISTICO PUBLICO "RIO AMAZONAS" EN EL CENTRO POBLADO GRAU, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE NAUTA, DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2650508
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO MIRADOR NAUTA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	NAUTA / LORETO / LORETO
Código Único de Inversión (CUI)	2650508
Inversión asociada	REMODELACION DE MIRADOR TURISTICO CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CISTERNA ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MIRADOR TURÍSTICO EN EL(LA) NACIENTE DEL RECURSO TURISTICO PUBLICO RIO AMAZONAS EN EL CENTRO POBLADO GRAU, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO
Función	TURISMO
Identificador del contrato (SEACE)	2300596
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,902,548.04

Cuaderno de obra digital

108 asientos entre 25/06/2026 y 31/08/2026

02

Evolución del riesgo estimado a 60 días

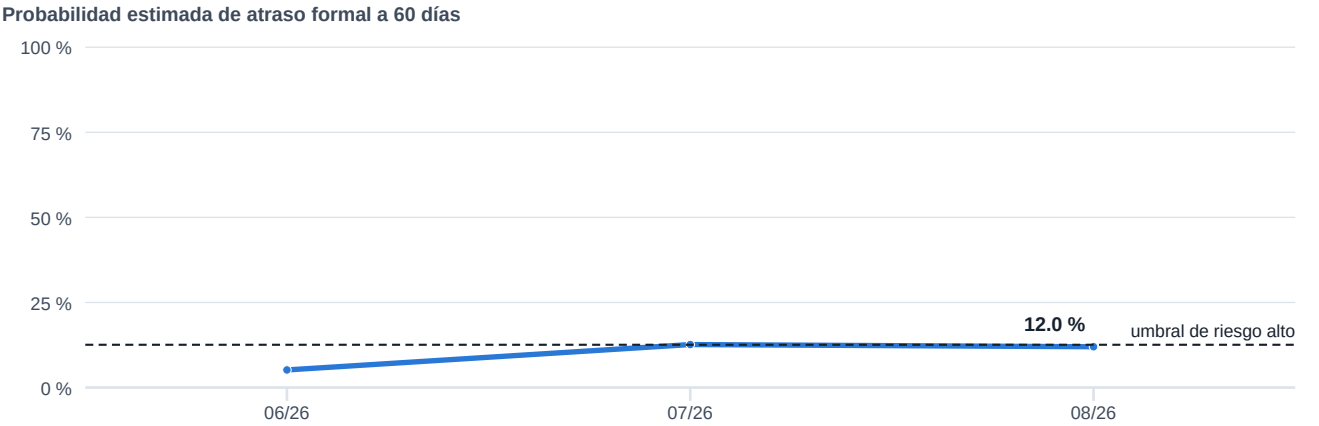

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03

Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Departamento: Loreto	Características de la obra		+0.166
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.151
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.139
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.136
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.132
Extensión media de los asientos recientes: 1,375 caracteres	Contenido de los asientos		-0.076
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.40 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.064
9 asientos de respuestas a consultas en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.049

04

Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.0 %	11.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.0 %	12.0 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	12.0 %	12.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 92 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 20/08/2026

...da vez que, no se podra ejecutar las partidas en mencion a modificarse hasta que la entidad se pronuncie sobre el referido adicional, lo cual esta ocasionando una causal de ampliacion de plazo por a) atraso y/o paralización por causa no atribuible al contratista. en consecuencia, se advierte que dicho evento constituye el inicio de una causal de modificacion del plazo de ejecucion (ampliacion de plazo)...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 84 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

... liberacion correspondiente para la continuidad de las actividades subsecuentes, conforme a la secuencia constructiva prevista.asimismo, se deja constancia que el avance fisico de la obra presenta un atraso respecto de la programacion vigente, por lo que se exhorta al contratista y al residente de obra a adoptar las medidas necesarias e incrementar los rendimientos y/o recursos que correspondan, a fin ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...ecidos para la absolucion de las consultas estas no son atendidas por quien corresponda, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora, precisandose que dicha demora se computa unicamente desde la fecha en que la no ejecucion de los trabajos materia de consulta empiece a afectar la ruta critica del programa de ejecucion de obra.en t...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 65 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...to. limpieza permanente del terreno de la obra, manteniendo las areas de trabajo en condiciones de orden y seguridad.asimismo, se deja constancia que la ejecucion de las actividades viene presentando retraso continuo debido a las dificultades de traslado de materiales, a todo esto, es ocasionadas por el ingreso y abastecimiento de materiales. el traslado de los materiales se da desde el punto de descarg...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 38 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 24/07/2026

COMUNICACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CONSULTA: Se deja constancia que, mediante Carta N.° 2538-2026-GRL-GGR-GRI, de fecha 22 de julio de 2026, la Entidad – Gobierno Regional de Loreto – comunicó a esta Supervisión la devolución de la consulta formulada por el Residente de Obra mediante Asiento N.° 27, de fecha 17 de julio de 2026, referida a la definición de la gama de colores y acabado de pintura de la estructura metálica ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.° 39 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 24/07/2026

CONSTANCIA DE CONSULTA NO PRESENTADA: En atención a la consulta formulada por el Residente de Obra mediante Asiento N.° 036, de fecha 22 de julio de 2026, esta Supervisión deja constancia que la misma se configura como no presentada, al no adjuntarse el correspondiente Informe Técnico Sustentatorio que respalde la consulta formulada, requisito exigible cuando la absolución de esta pueda implicar una modificación, pre...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.° 37 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

VERIFICACIÓN, CONFORMIDAD Y SOLICITUD DE SUSTENTO TÉCNICO DE CONSULTAS: En atención al asiento del Residente de Obra, el suscrito, deja constancia que, durante la inspección de campo, se verificó la ejecución de los trabajos de eliminación de material excedente, remoción de pintura de la estructura metálica del Mirador, colocación y habilitación del acero de refuerzo de la losa maciza, así como el encofrado de vigas...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 30 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/07/2026

...ion efectiva de actividades (18/07/2026) y hasta que cese formalmente el evento restrictivo. esto con la finalidad de salvaguardar los intereses contractuales de ambas partes, evitar la aplicacion de penalidades inaplicables y prevenir perjuicios economicos al contratista y a la entidad.se deja constancia de que se adjunta de forma digital al reporte de la fecha la copia de la normativa oficial de senasa y...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
