


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecucion del saldo de obra N° 01 del proyecto: ¿mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de ayabaca, distrito de ayabaca, provincia de ayabaca ¿ piura con codigo único N°2427250.

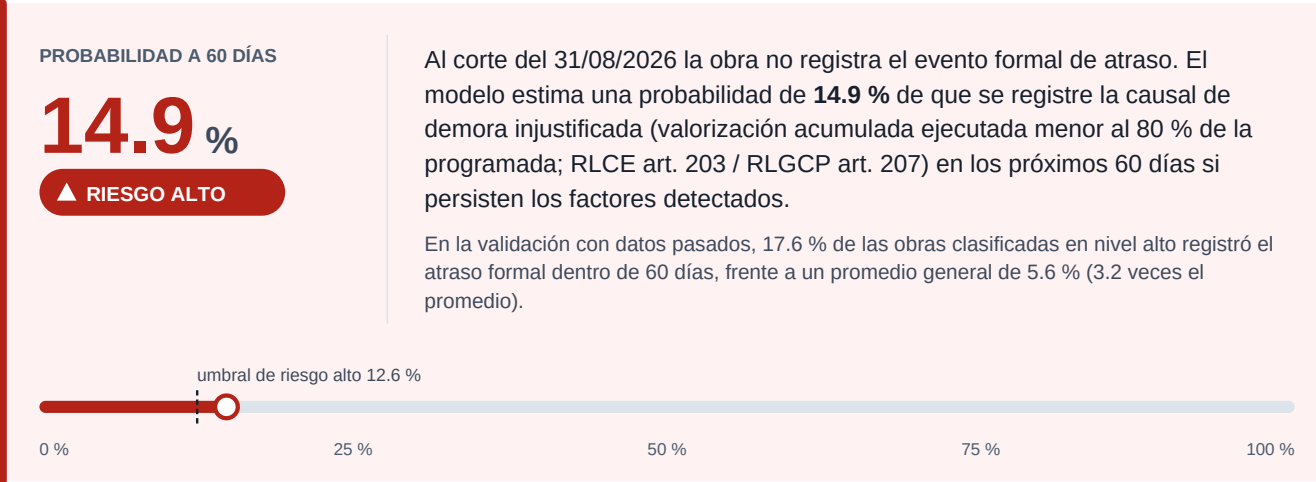


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 32,451,323.25   | 300 días       | 696<br>desde 06/11/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA ¿ PIURA CON CODIGO ÚNICO N°2427250. |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA                                                                                                                                                         |
| Contratista                                     | CONSORCIO CRG HOLDING                                                                                                                                                                       |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | AYABACA / AYABACA / PIURA                                                                                                                                                                   |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2427250                                                                                                                                                                                     |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA                                                                               |
| Función                                         | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                                                                                                                                                                |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2354237                                                                                                                                                                                     |
| Monto del contrato                              | S/ 32,451,323.25                                                                                                                                                                            |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 33,168,743.81                                                                                                                                                                            |
| Cuaderno de obra digital                        | 696 asientos entre 06/11/2025 y 31/08/2026                                                                                                                                                  |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

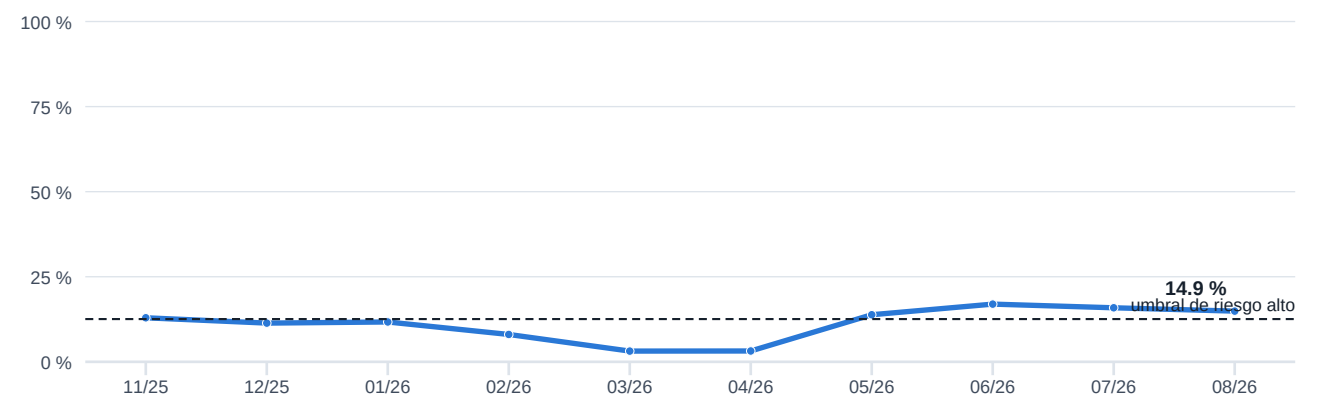

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.668 |
| El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.262 |
| El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.150 |
| 17 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.127 |
| Gasto acumulado de la inversión (devengado): S/ 46,830,094                                              | Ejecución del gasto (SIAF)     | <div></div>    | -0.118 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.115 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)                     | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.102 |
| Departamento: Piura                                                                                     | Características de la obra     | <div></div>    | -0.087 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                                | Actual | Escenario | Cambio  |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes                  | 14.9 % | 14.9 %    | -0.0 pp |
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días  | 14.9 % | 14.9 %    | +0.0 pp |
| Ejecución financiera al día (devengado en el último mes) | 14.9 % | 14.9 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 693 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 30/08/2026

...a de ejecucion de obra y del calendario de avance de obra valorizado vigentes, generando diferencias entre el avance programado y el avance físicamente ejecutable. en consecuencia, la afectacion y el atraso producidos en este frente no resultan atribuibles al contratista.de conformidad con el artículo 64 de la ley n. 32069, ley general de contrataciones publicas, concordante con el artículo 109 de su r...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 695 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 30/08/2026

...mpliacion del plazo contractual y el reconocimiento de los demas efectos economicos y contractuales aplicables, conforme a la ley n. 32069, su reglamento y el contrato, sin que puedan imputarse los atrasos derivados de la situacion descrita. la referencia al artículo 64 se encuentra respaldada por la normativa y actuaciones oficiales vigentes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 694 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 30/08/2026

falta de pronunciamiento sobre la reduccion de prestaciones n. 01 y afectacion del programa de ejecucion vigente . asimismo, los atrasos o paralizaciones ocasionados por causas no atribuibles al contratista deben evaluarse considerando su incidencia efectiva sobre el programa de ejecucion de obra vigente al momento de producirse el ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 670 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 26/08/2026

...ltad contractual que rige las contrataciones publicas bajo la ley n 32069, facilitando las absoluciones oportunas de consultas, aprobaciones de metrados o adicionales de ser el caso, evitando generar demoras administrativas que si podrian incidir negativamente en la ruta critica del proyecto.iv. conclusion y exhortoel contratista ratifica su compromiso con el cumplimiento de las metas contractuales y el...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 659 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 25/08/2026

...sada (excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, rodillo, volquetes, cisterna, mixers), planta de concreto, personal tecnico y cuatro frentes de trabajo activos. por tanto, el atraso no deriva de incumplimiento, falta de recursos ni deficiencia organizativa del contratista. la materializacion del riesgo asignado a la entidad viene originando, reduccion del rendimiento programado, interferencias opera...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 620 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 20/08/2026

INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – AV. MANUELA FRANCISCO RENTERIA: En ese sentido, se invita a la Supervisión de Obra a evaluar la procedencia de una reprogramación de las actividades afectadas, conforme a las disposiciones previstas en el artículo 206 del Reglamento de la Ley N.º 32069, considerando las condiciones reales de ejecución, la interferencia existente y las actividades que no puede...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 623 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 20/08/2026

...ndientes al frente intervenido.el contratista deja constancia que la imposibilidad de continuar normalmente con las actividades no obedece a falta de capacidad operativa, disponibilidad de recursos o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino a una condicion externa relacionada con la falta de liberacion efectiva del area de trabajo.2. afectacion del plazo contractual y programacionla permanece...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 619 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 20/08/2026

...se el avance ejecutado por debajo del avance programado para el periodo correspondiente.se deja constancia que dicha desviacion no obedece a falta de capacidad de ejecucion, deficiencia de recursos o incumplimiento atribuible al contratista, sino a la imposibilidad material de ejecutar las actividades programadas en el tramo afectado por una condicion externa al contratista.en tal sentido, corresponde qu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Asiento N.º 616 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026</b></p> <p>...y efectos contractuales de exigir anticipadamente la presentacion de planos correspondientes a calles cuya ejecucion se encuentra programada para periodos posteriores, asi como a la procedencia de la penalidad anunciada.7. solicitud de precision a la supervisionen atencion a lo expuesto, y para efectos de mantener una adecuada trazabilidad contractual, el contratista solicita a la supervision precisar:a) l...</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p> |
| <p><b>Asiento N.º 605 · Órdenes · SOEC_SPV · 14/08/2026</b></p> <p>CIERRE DE TRAFICO: EN LA FECHA, ESTA SUPERVISIÓN DEJA CONSTANCIA QUE, DE ACUERDO A LA CONSTATACIÓN FISICA REALIZADA ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y ENTIDAD (GERENTE DE DESARROLLO URBANO), RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO EN LA AV. PIURA ENTRE EL CRUCE CON VIA DE EVITAMIENTO E INTERSECCION CON LA CALLE AREQUIPA COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SE HA CONSTATADO EL PELIGRO EN UN TRAMO DE L...</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p>    |
| <p><b>Asiento N.º 603 · Órdenes · SOEC_SPV · 13/08/2026</b></p> <p>AUTORIZACION DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: SE DEJA CONSTANCIA AL CONTRATISTA, QUE DE ACUERDO AL ASIENTO N° 602 DEL CUADERNO DE OBRA, SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS SIGUIETES FRENTE DE TRABAJO:A) CALLE TOMAS ELISEO: VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATAS F´C=280 KG/CM2 DE MURO DE CONTENCION. B) CALLE EL INGRESO: VACIADO DE CONCRETO EN VEREDAS F´C=175 KG/CM2. C) CALLE CUSCO: VACIADO DE CONCRETO EN VEREDAS F´C=175...</p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p>     |

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
