


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular de la carretera departamental CU-104 en el tramo amparaes - puente tahuis, distrito de yanatile - lares, provincial de calca - cusco.

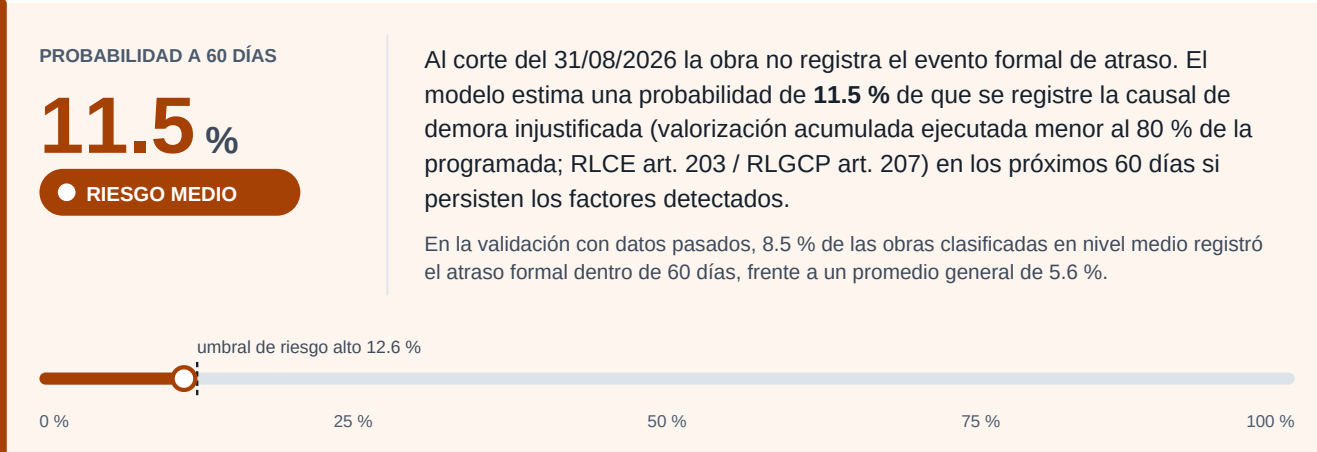


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 38,510,110.59	540 días	1,017 desde 17/08/2024	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-104 EN EL TRAMO AMPARAES - PUENTE TAHUIS, DISTRITO DE YANATILE - LARES, PROVINCIAL DE CALCA - CUSCO.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO
Contratista	CONSORCIO AMPARAES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YANATILE / CALCA / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2340839
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU - 104 EN EL TRAMO AMPARAES - PUENTE TAHUIS, DISTRITOS DE YANATILE - LARES, PROVINCIA DE CALCA, CUSCO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2269970
Monto del contrato	S/ 38,510,110.59
Monto aprobado de la inversión	S/ 30,684,189.00
Cuaderno de obra digital	1017 asientos entre 17/08/2024 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

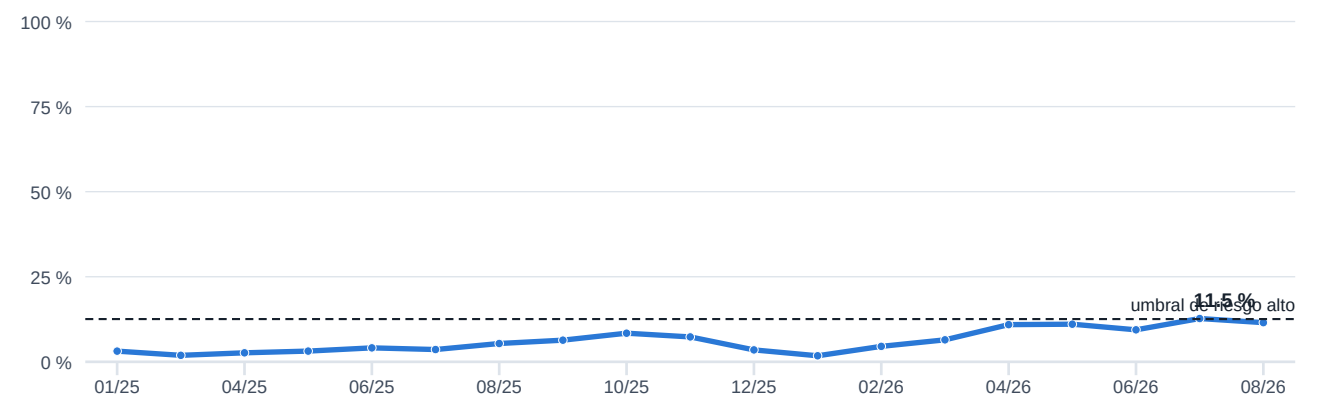

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (19 cortes, del 31/01/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.541
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.198
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.177
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.157
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.112
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 4,727,788	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.108
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
2 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.090

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	11.5 %	10.3 %	-1.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.5 %	11.5 %	-0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.5 %	11.5 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	11.5 %	11.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 1014 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

descargo al asiento n. 1013 presunta ausencia del residente de obra . en atencion al asiento n. 1013 de la supervision, referido a la presunta ausencia del residente de obra durante la jornada del 25/08/2026 y a la eventual aplicacion de penalidad, el residen...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 1014 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

...usencia del residente de obra . en atencion al asiento n. 1013 de la supervision, referido a la presunta ausencia del residente de obra durante la jornada del 25/08/2026 y a la eventual aplicacion de penalidad, el residente de obra y el contratista manifiestan su desacuerdo con la configuracion del incumplimiento senalado.al respecto, se precisa que la obra comprende una longitud aproximada de 77.7 km, con...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 1013 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 25/08/2026

...rabajo durante todo el hornal de trabajo, tampoco en la oficina tecnica de residencia y el contratista no comunico ningun permiso y/o falta correspoendiete que justifique, situacion que constituye un incumplimiento contractual. este hecho transgrede lo estipulado en la clausula decima octava penalidades del contrato n33-2024-gr-cusco-grtc, en la cual se establece expresamente la aplicacion de penalidades...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 1011 · Adicionales · SOEC_RESI · 25/08/2026

...ruta critica de la programacion vigente de la p.a.o. n. 01, por lo que la afectacion descrita incide directamente en su plazo de ejecucion. en consecuencia, se registra la presente circunstancia como atraso y/o paralizacion por causa no atribuible al contratista, enmarcada en la causal de ampliacion de plazo prevista en el literal a) del articulo 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 1013 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 25/08/2026

AUSENCIA DEL PERSONAL CLVE - RESIDENTE DE OBRA: EN LA PRESENTE FECHA 25/08/2026, SE HA VERIFICADO QUE EN TODA LA OBRA DE INICIO A FIN, NO SE UBICO LA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN NINGUN FRENTE DE TRABAJO DURANTE TODO EL HORNAL DE TRABAJO, TAMPOCO EN LA OFICINA TECNICA DE RESIDENCIA Y EL CONTRATISTA NO COMUNICO NINGUN PÉRMISO Y/O FALTA CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFIQUE, SITUACIÓN QUE CONSTITUYE UN INCUMPL...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 994 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 20/08/2026

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: LA SUPERVISIÓN INDICA QUE, CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, SE CONSTATA LAS DIFICULTADES EN LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA NIVELANTE DEBIDO A LA SATURACIÓN DEL MATERIAL DE CANTERA POR EFECTOS DE LAS PRECIPITACIONES. SE CONSTATA QUE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES VIENEN AFECTANDO EL DESARROLLO NORMAL DE AVANCE DE OBRA, POR LO TANTO, LA SUPERVISION ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 991 · Adicionales · SOEC_RESI · 20/08/2026

...ciones para su posterior ejecucion.finalmente, se precisa que los efectos de las lluvias continuan afectando actividades comprendidas en la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra, generando retrasos no atribuibles al contratista, dejandose constancia para los fines de sustento de ampliacion de plazo que correspondan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 984 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 19/08/2026**

...ogramadas, afectando el normal desarrollo del cronograma de ejecucion de obra y las actividades comprendidas en la ruta critica. en tal sentido, se deja constancia que esta circunstancia configura un atraso y/o paralización por causa no atribuible al contratista, enmarcandose en la causal de ampliacion de plazo prevista en el literal a) del articulo 197 del reglamento de la ley de contrataciones del es...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 986 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026**

aprobacion de cambio de especialista de costos . mediante el presente asiento, se hace de conocimiento a la supervision de obra que, en fecha 18.08.2026 mediante resolucion gerencial regional n 000800-2026-gr cusco/grtc, la entidad apro...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 987 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 19/08/2026**

...aterial de cantera y extendido, lo cual impidio su adecuada compactacion. la supervision deja constancia que las precipitaciones continuan afectando el normal desarrollo de las actividades, generando retrasos.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 979 · Adicionales · SOEC_RESI · 13/08/2026**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA P.A.O. N° 01: SE COMUNICA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE, DURANTE LA FECHA, SE HA CONTINUADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, EN CONCORDANCIA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.EN ESE MARCO, SE VIENEN EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RODAD...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
