


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de obra mejoramiento del servicios de espacios públicos urbanos en el parque miguel grau distrito de juliaca de la provincia de san román del departamento de puno, con CUI 2680663

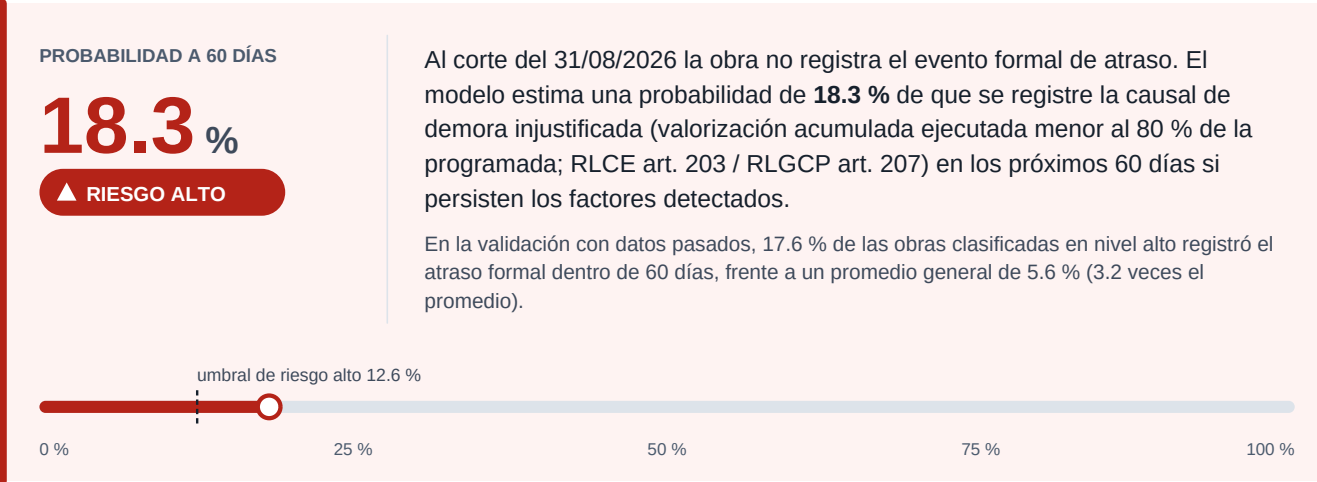


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	37 desde 24/06/2026	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE MIGUEL GRAU DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2680663
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA
Contratista	CONSORCIO ALARCON
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JULIACA / SAN ROMAN / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2680663
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE MIGUEL GRAU DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2398437
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,499,736.59
Cuaderno de obra digital	37 asientos entre 24/06/2026 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

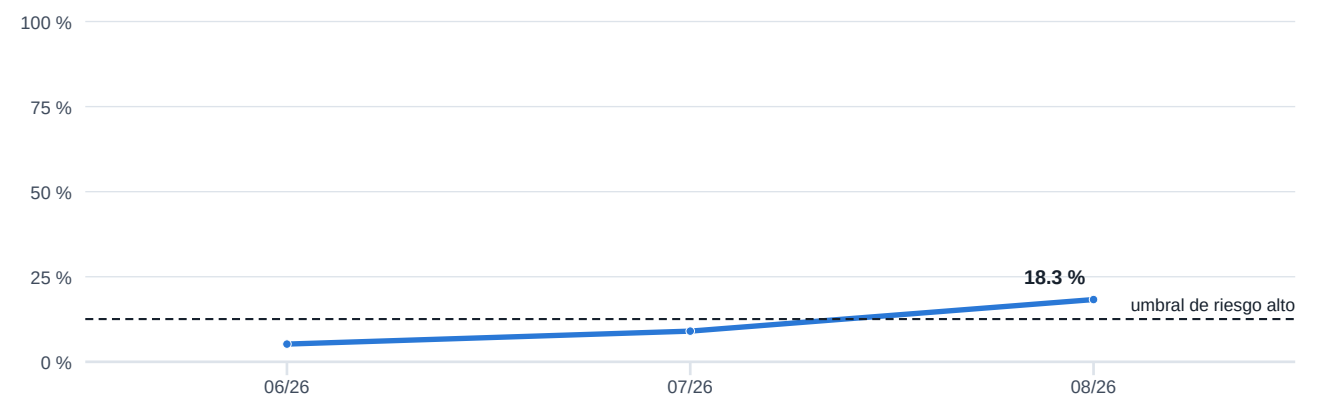

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.75 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.700
El 31 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.257
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.204
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.71 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.158
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Extensión media de los asientos recientes: 1,383 caracteres	Contenido de los asientos		-0.075
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.075
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.060

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.3 %	18.1 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.3 %	18.3 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	18.3 %	18.3 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	18.3 %	18.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

OBSERVACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTO SUSTENTATORIO AL ASIENTO N° 30 (CAUSAL N° 02): EN ATENCIÓN AL ASIENTO N° 30 DE LA RESIDENCIA DE OBRA: Esta Supervisión toma conocimiento del inicio (11/08/2026) y término (21/08/2026) de la Causal N° 02 del asiento N° 30 del Residente por los trabajos de carguío y eliminación de material de demolición. Al respecto, se precisa: 1) Se toma nota de que la Causal N° 02 refiere al tiem...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 30 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

...mitido . como residente, al amparo de los art. 120.4, 158.1.a, 198.1.a y 200.1.a del reglamento de la ley n 32069 (d.s. n 009-2025-ef), registro el sinceramiento e inicio/cierre de la causal n 02 por atrasos no atribuibles al contratista. inicio causal física: 11/08/2026 (día siguiente de notificada la denegatoria de adicional en asiento n 21). termino de causal: 21/08/2026, fecha en que concluyeron ca...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 30 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

...artida critica de pisos de concreto estampado (03.01.01.01.02). este atraso es de exclusiva responsabilidad de la entidad (art. 158.1.a), constituyendo un atraso justificado (art. 120.4) que exime de penalidades. se presentara el expediente de ampliacion n 02 en el plazo de ley.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026

...iberados, priorizacion de actividades no condicionadas por consultas pendientes, coordinacion del abastecimiento de materiales e insumos, e intensificacion de trabajos conforme se liberen los frentes. demora en la absolucion de la consulta n. 02se deja constancia de que determinadas actividades de la ruta critica estaban condicionadas a la absolucion de la consulta n. 02, a cargo del proyectista. recien ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026

MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA MITIGAR LAS ADVERTENCIAS HECHAS EN LOS ASIENTOS N° 18 Y N° 20: Medidas adoptadas (Respuesta a los asientos 18 y 20) La Residencia ha implementado medidas técnicas y operativas para mitigar el desfase y evitar una mayor afectación al avance: redistribución de cuadrillas en frentes disponibles y liberados, priorización de actividades no condicionadas por consultas pendientes, coordinac...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...de julio partidas consecuentes a la demolicion/eliminacion, tales como: relleno con material seleccionado, nivelacion, compactacion, y encofrado/vaciado de concreto en sardineles. 3. imputabilidad del atraso: el desfase registrado (notificado en los asientos n 18 y n 20) obedece exclusivamente al bajo rendimiento de la mano de obra y falta de ritmo de trabajo del contratista. por tanto, no existe causal ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

... . en relacion al asiento n 23, mediante el cual el residente anota el cierre de la causal de ampliacion de plazo n 01, esta supervision precisa: 1. sobre la afirmacion del ejecutor respecto a que "la demora administrativa afecto la ruta critica". esta supervision deja constancia tecnica in situ de que durante el periodo del 30/07/2026 al 10/08/2026 la obra mantuvo ejecucion continua e ininterrumpida de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...situacion de atraso, siempre que se tomen de forma inmediata las acciones pertinentes en los frentes de trabajo liberados y activos (movimiento de tierras y preparatorios de concreto).4. conclusion y apercibimiento: se exhorta a la contratista a no dilatar la toma de decisiones tecnico-operativas ni desaprovechar la ventana de tiempo disponible. de persistir la inaccion o el bajo rendimiento en los frent...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
