


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de obra denominada creacion del servicio de esparcimiento MZS. N, lote 14, ñ, lote 14, ñ, lote 6, ñ lote 1, o', lote 1 del porvenir del distrito de yura - provincia de arequipa - departamento de arequipa, CUI N°2496702 i etapa

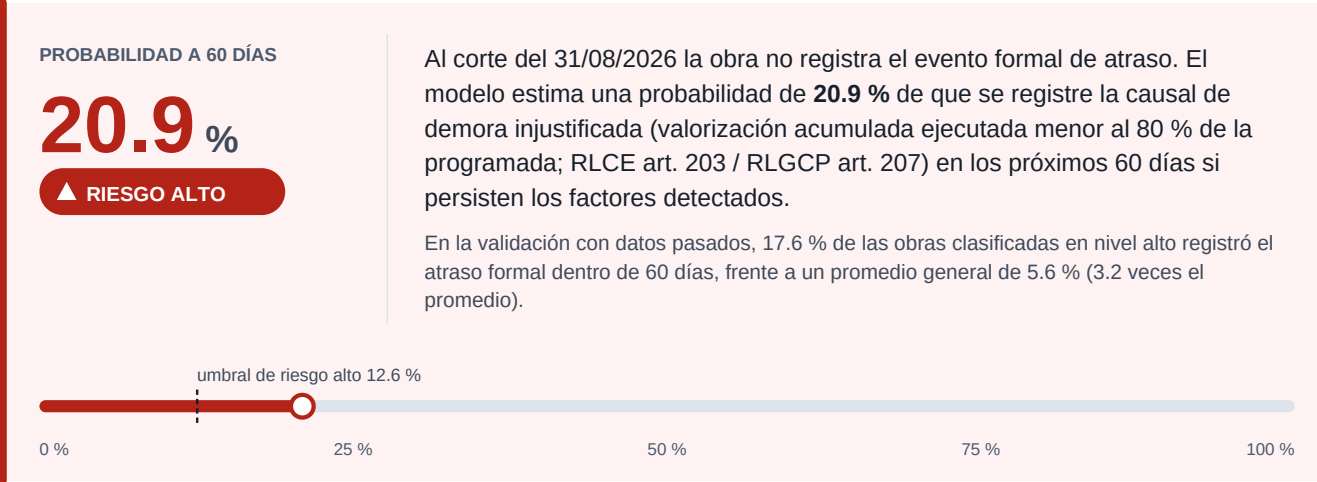


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	41 desde 30/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO MZS. N, LOTE 14, Ñ, LOTE 14, Ñ, LOTE 6, Ñ LOTE 1, O', LOTE 1 DEL PORVENIR DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI N°2496702 I ETAPA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Contratista	GHV CONTRATISTAS E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YURA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2496702
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN LAS MANZANAS N LT 14, Ñ LT 6, Ñ LT 1, O' LT 1 Y R LT 1, DEL PUEBLO JOVEN PORVENIR DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2402981
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 921,915.46
Cuaderno de obra digital	41 asientos entre 30/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

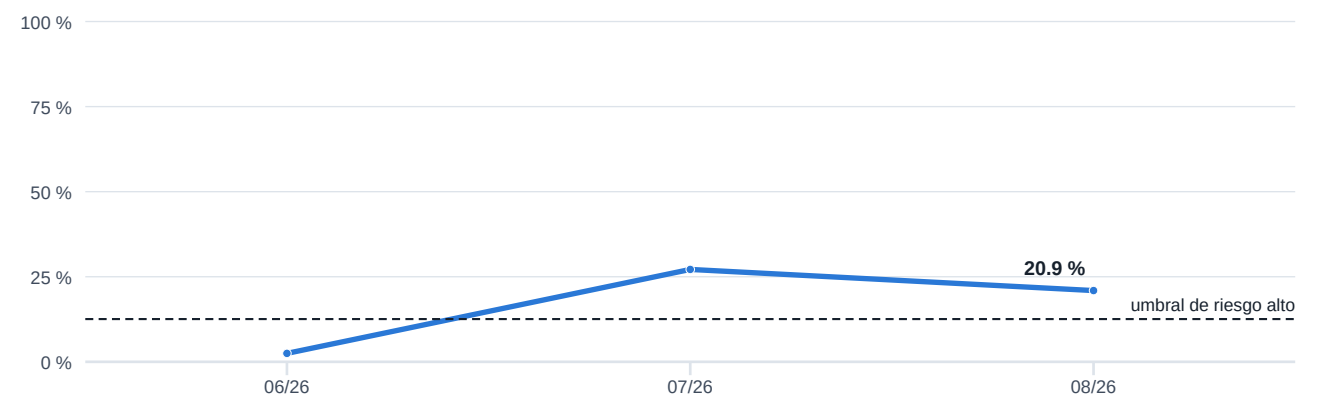

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.697
El 59 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.266
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.258
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.165
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.138
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.090
Se ha gastado el 11 % del presupuesto inicial del año	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.082
15 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.061

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	20.9 %	20.7 %	-0.3 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	20.9 %	21.1 %	+0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 38 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...ja constancia que tiene actividades por ejecutar del presupuesto contractual las cuales ya debieron ejecutarse, por consiguiente, la no ejecucion de las actividades contractuales no correspondes a un retraso justificado.2.- con referencia a las actividades sucesoras del adicional de obra n01, se debera superponer en la programacion de obra dichas actividades y presentar la programacion y calendarios act...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

... en dicho cuaderno solicitando autorizaciones para las actividades a ejecutar.4.- se deja constancia que el periodo de ejecucion se viene consumiendo, por consiguiente, se debe prever para no caer en retrasos de la obra injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 1.- En la fecha se verifican los trabajos de asentado de ladrillo para parapetos en la zona de los SSHH, movimiento de tierras en la zona de entretenimiento, habilitación de acero para muros y vaciado de sardineles interiores.2.- Se recomienda al contratista la ejecución de las demás partidas contractuales y evitar retrasos en la programación de obra vigente

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...e tierras en la zona de entretenimiento, habilitacion de acero para muros y vaciado de sardineles interiores.2.- se recomienda al contratista la ejecucion de las demas partidas contractuales y evitar retrasos en la programacion de obra vigente

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

... mismo modo se verifica la habilitacion de acero para zona de entretenimiento.2.- se recomienda al contratista la ejecucion de las actividades de acuerdo al cronograma de ejecucion vigente y no tener retrasos injustificados.3.- se recomienda al residente que debe mantener bien señalizadas las areas de trabajo, asi mismo deber continuar con el curado de los elementos de concreto vaciados en jornadas ante...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS: 1.- El día de hoy se verifica la ejecución de las partidas de movimiento de tierras para los sardineles interiores, zona de entretenimiento y pisos interiores. Del mismo modo se verifica la habilitación de acero para zona de entretenimiento.2.- Se recomienda al contratista la ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma de ejecución vigente y no tener retrasos injustifica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 10/07/2026

CONSULTAS MAL FORMULADAS: 1.- Con referencia al asiento anterior del residente de obra, se indica que las consultas realizadas en dicho asiento no cumplen los parámetros técnicos y normativos que se regulan en la normativa vigente, no se cuenta con sustento técnico definido. De la revisión realizada al informe de consultas, se concluye que dicho informe es muy general y ambiguo, impidiendo un pronunciamiento por part...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
