

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución del proyecto ¿mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la AV. Libertad (tramo pasaje tayta niño y AV. Real), JR. Misti suroya (tramo AV. Libertad y AV. 10 de noviembre) y pasaje tayta niño (tramo AV. Libertad y JR. Quince de junio) distrito de huayucachi - provincia de huancayo ¿ departamento de junin¿ CUI: 2495417

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

19.0 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **19.0 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 8,045,831.95	210 días	296 desde 15/12/2025	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Ejecución del Proyecto ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LIBERTAD (TRAMO PASAJE TAYTA NIÑO Y AV. REAL), JR. MISTI SUROYA (TRAMO AV. LIBERTAD Y AV. 10 DE NOVIEMBRE) Y PASAJE TAYTA NIÑO (TRAMO AV. LIBERTAD Y JR. QUINCE DE JUNIO) DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO ¿ DEPARTAMENTO DE JUNIN¿ CUI: 2495417
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI
Contratista	CONSORCIO RIEGO YURACMAYO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUAYUCACHI / HUANCAYO / JUNIN
Código Único de Inversión (CUI)	2495417
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LIBERTAD (TRAMO PASAJE TAYTA NIÑO Y AV. REAL), JR. MISTI SUROYA (TRAMO AV. LIBERTAD Y AV. 10 DE NOVIEMBRE) Y PASAJE TAYTA NIÑO (TRAMO AV. LIBERTAD Y JR. QUINCE DE JUNIO) DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2364784
Monto del contrato	S/ 8,045,831.95

Monto aprobado de la inversión	S/ 6,231,199.88
Cuaderno de obra digital	296 asientos entre 15/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

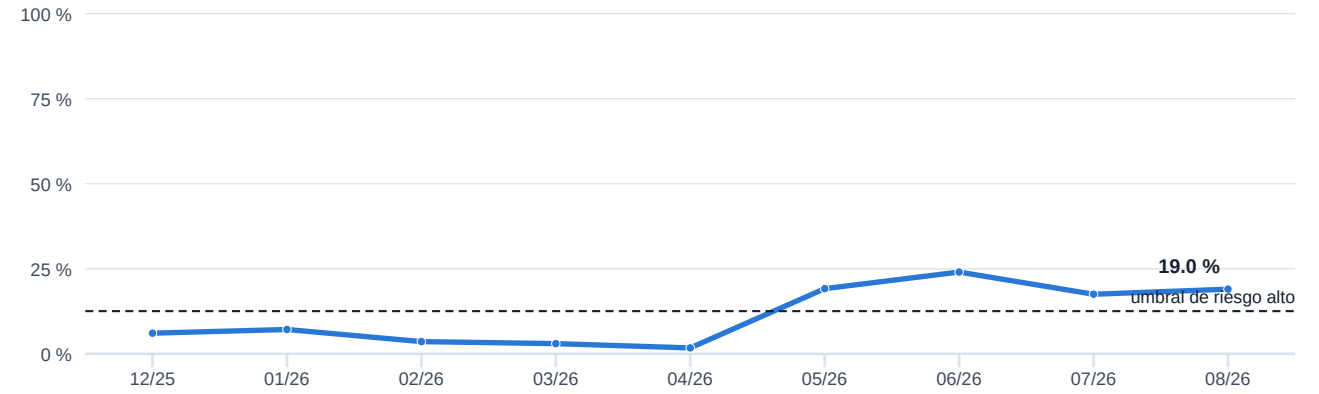

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.640
El 59 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.251
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.194
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.137
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.108
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.078
50 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.063

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	19.0 %	19.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 288 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

... de calidad, resultados de ensayos y demas verificaciones tecnicas correspondientes, no constituyendo la presente anotacion aceptacion de trabajos que posteriormente pudieran evidenciar deficiencias, incumplimientos o vicios de ejecucion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 285 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

... tramo iii se tiene la problematica que los usuarios vienen realizando instalacion de red matriz de desagüe en los pasajes mistisuroya lado norte, calle 14 de febrero lado norte, estos hechos generan retrasos en los trabajos programados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 282 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

DEL 25/08/2026 AVANCE DE OBRA: Se deja constancia que en la fecha el Contratista dispuso el ingreso a obra de un mixer de concreto premezclado sin contar con la autorización previa de esta Supervisión y sin haber presentado previamente el diseño de mezcla correspondiente. Se precisa que la presentación del diseño de mezcla constituye documentación técnica necesaria para que esta Supervisión pueda verificar, previamente...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 284 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

... en pavimento en las progresiva 0+120 al 0+135 donde no se puede colocar concreto debido a intransigencia de los usuarios respecto a la existencia o no de martillos en su propiedad, este hecho genera retrasos no atribuibles al contratista. de igual manera en el tramo 0+480 al 0+505 lado derecho del jr. mistisuroya tienen problemas de alineamiento y no es posible realizar trabajo alguno tanto en vereda co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 282 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...es de cumplir con la presentacion de dicha documentacion y obtener la correspondiente autorizacion de la supervision. la presente ocurrencia no constituye unicamente una falta de comunicacion, sino el incumplimiento del procedimiento previo de control de calidad requerido para la autorizacion del concreto a incorporar a la obra. en ese sentido, se requiere al contratista presentar de manera inmediata el di...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 273 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...etente. el contratista debera continuar con la ejecucion de las partidas y frentes contractuales que se encuentren liberados y que no resulten afectados por la modificacion planteada, evitando generar retrasos en la programacion vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 268 · Adicionales · SOEC_SPV · 14/08/2026

...diente de la entidad. el contratista debera continuar con los trabajos programados y demas frentes disponibles que no se encuentren vinculados a la modificacion materia de evaluacion, evitando generar retrasos en la ejecucion contractual. cabe senalar tambien que se necesita dichos adicionales y deductivos en la av. misti suroya y pasaje tayta nino.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 217 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026

AVANCE DE OBRA DEL 14/07/2026: 1. Respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) INSTRUCCIÓN: Esta Supervisión toma conocimiento de la realización de las charlas diarias de seguridad. Se instruye al Contratista a remitir en el informe mensual los registros de asistencia firmados, así como los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y los permisos de trabajo correspondientes a las actividades del día (vaciado de concreto...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
