


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ampliacion del servicio de movilidad urbana en el jiron 11 (cuadras 03 al 12), jiron 12 (cuadras 01 al 06) y jiron 15 (cuadras 01 al 10) y calle 01 del promuvi i distrito de el algarrobal de la provincia de ilo del departamento de moquegua, meta 02: Jirón 12 y jirón 15.

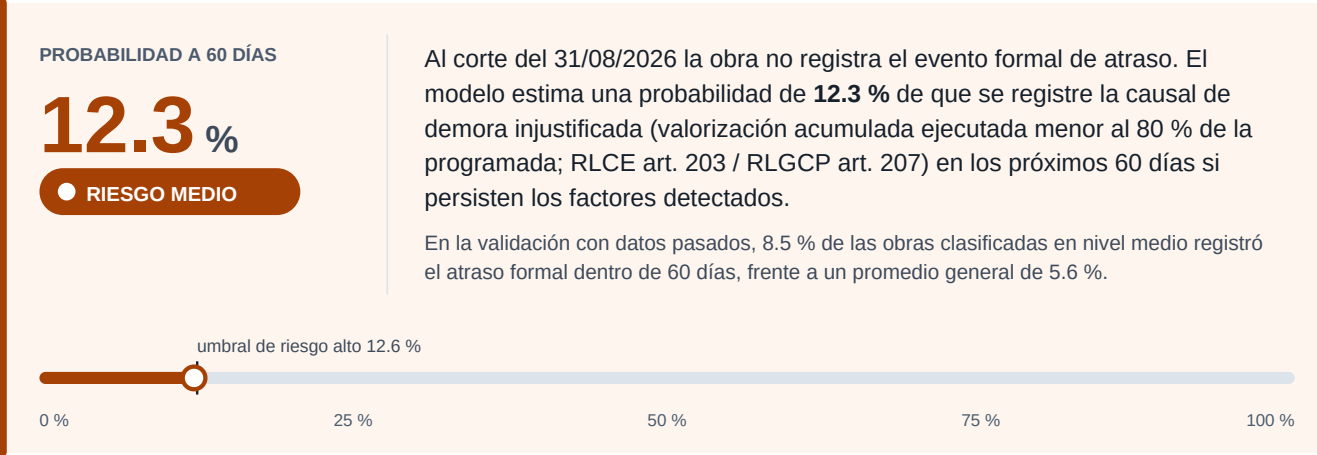


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	20 desde 22/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON 11 (CUADRAS 03 AL 12), JIRON 12 (CUADRAS 01 AL 06) Y JIRON 15 (CUADRAS 01 AL 10) Y CALLE 01 DEL PROMUVI I DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, META 02: JIRÓN 12 Y JIRÓN 15.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR SAN BARTOLOME
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	EL ALGARROBAL / ILO / MOQUEGUA
Código Único de Inversión (CUI)	2700316
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON 11 (CUADRAS 03 AL 12), JIRON 12 (CUADRAS 01 AL 06) Y JIRON 15 (CUADRAS 01 AL 10) Y CALLE 01 DEL PROMUVI I DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2402112
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,621,360.71
Cuaderno de obra digital	20 asientos entre 22/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

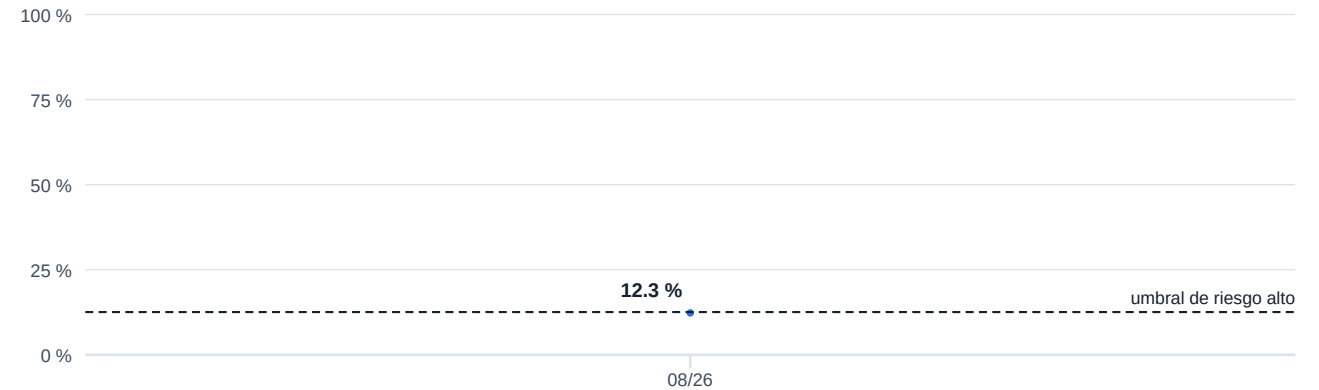

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.82 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.616
El 25 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.223
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.215
Hubo registros en el cuaderno 6 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		-0.165
Departamento: Moquegua	Características de la obra		+0.150
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.105
Extensión media de los asientos recientes: 1,480 caracteres	Contenido de los asientos		-0.075

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	12.3 %	12.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

CONTINUACION DEL ASIENTO N°19: ? Tendenciosamente, el residente afirma: "Se desvirtúa la observación sobre la validez del laboratorio Casas y Planos EIRL reiterando que si cuenta con registro vigente ante INACAL....", se indica al residente que lea e interprete correctamente lo señalado en el asiento N° 09 por la supervisión, asimismo, mientras esta supervisión no cuente físicamente con la documentación que indique que...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...actividad del sistema de alcantarillado sin alterar el diseño vial del proyecto.3. sobre la continuidad operativa y coordinación con la eps: con el objetivo de salvaguardar el tren de trabajo y evitar retrasos en la programación física, se comunica que esta residencia ya ha movilizado y gestionado la participación del coordinador técnico designado por la empresa prestadora de servicios (eps). a fin de fo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA: RESPECTO A LO INDICADO POR EL RESIDENTE EN ASIENTO N° 08, SE INDICA:• DENTRO DE LOS PLANOS DE REPLANTEO PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA PARA VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA (OBSERVADOS EN FORMA OPORTUNA POR LA SUPERVISIÓN), NO SE HIZO MENCIÓN A NINGUNA INCOMPATIBILIDAD GEOMÉTRICA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE EL NO HABER DETECTADO OPORTUNAMENTE ESTE TIPO DE DISCREPANCIAS, ASIMISMO EL ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 8 · Consultas · SOEC_RESI · 28/08/2026

...ra la modificación de la rasante en la prog. 0+450.28 a 0+540.38 y la autorización para el rebaje del buzón en la prog. 0+555.35 a 0+649, permitiendo la continuidad de las partidas viales sin generar retrasos contractualmente imputables a nuestra representada

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

de lo verificado en campo, se indica al contratista lo siguiente . de lo verificado en campo, se indica al contratista lo siguiente: incumplimiento en cuanto medidas de seguridad en obra, no se cuenta con caballetes, señales informativas y la colocación de mallas y cintas de seguridad es deficiente a la fecha, no se está cumpliendo con lo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 5 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

CONTINUA DEL ASIENTO N°04: EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ A LA FECHA CON PRESENTÓ EL ÁREA AUTORIZADA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXCEDENTE Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), LA OMISIÓN RESPECTO A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ACARREA: IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACIÓN DE HABILITACIÓN AMBIENTAL Y DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL ÁREA, ADEMÁS PODRÍA GENERAR CONSECUENCIAS COMO: PARALIZACIÓN DE TR...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 6 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

... asiento n05 . se recuerda al contratista y residente que estamos a fin de mes y por tanto se debe tener en cuenta plazos y fechas de presentación de la valorización del presente periodo y así evitar penalidades, teniendo en consideración que solamente se valorizara las partidas debidamente ejecutadas y con sus protocolos y pruebas respectivas según corresponda y debidamente aprobados, bajo responsabilidad

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 5 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026**

...arrea: imposibilidad de verificación de habilitación ambiental y documentación sustentatoria del área, además podría generar consecuencias como: paralización de trabajos de eliminación, aplicación de penalidades contractuales y responsabilidad administrativa. se reitera la presentación de lo solicitado, según carta n036-2026-sup- alg.el contratista no presentó el plan de manejo ambiental (pma) consolidado ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 4 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026**

... supervisión el día 26 de agosto 2026, de allí el desfase con la fecha de inicio de obra. dentro de lo normativo y lo indicado en expediente técnico respecto a seguridad en obra, el contratista viene incumpliendo con la seguridad en obra, la implementación de las condiciones visibles en obra no evidencian un sistema integral y sostenido de señalización y protección colectiva acorde con los peligros exist...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 5 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026**

...tivas y de mitigación, se solicita a priori la implementación de la cisterna para efectuar el humedecimiento durante el movimiento de tierras y la implementación de las demás partidas ambientales, el retraso o incumplimiento se considera una falta contractual estipulada en el cuadro de penalidades del contrato de la empresa ejecutora que podría generar aplicación de penalidades contractuales. se reitera...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
