


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: ¿mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas del centro poblado santa rosa de la cumbre del distrito de campanilla ¿ provincia de mariscal CÁCERES ¿ departamento de san martín¿ con CUI nº 2474363

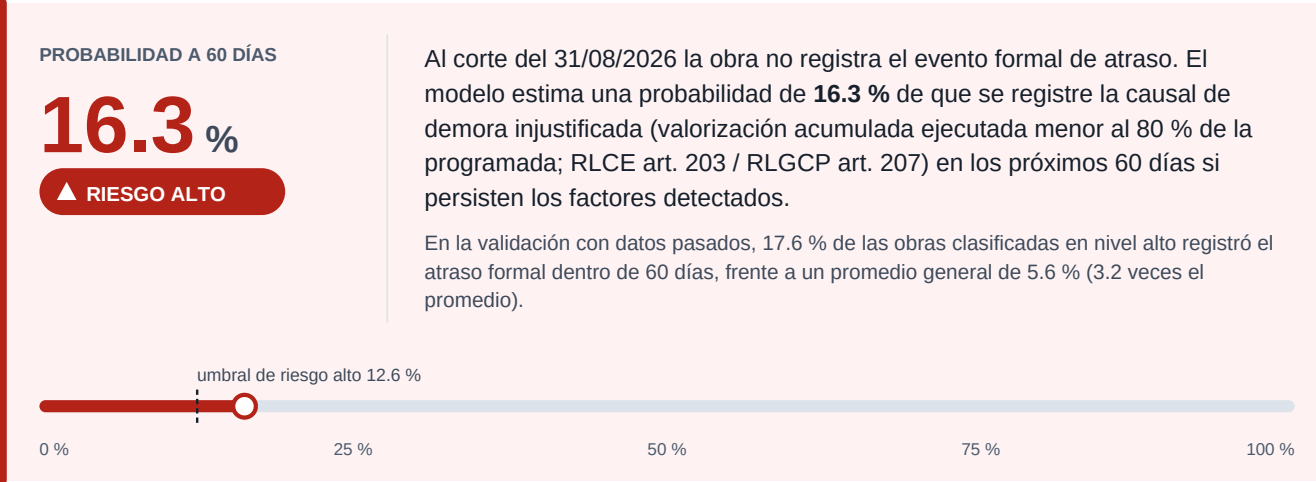


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	176 desde 16/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE LA CUMBRE DEL DISTRITO DE CAMPANILLA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿ CON CUI Nº 2474363
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Contratista	CONSORCIO LA LIBERTAD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAMPANILLA / MARISCAL CACERES / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2474363
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE LA CUMBRE DEL DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2381267
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,008,239.39
Cuaderno de obra digital	176 asientos entre 16/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

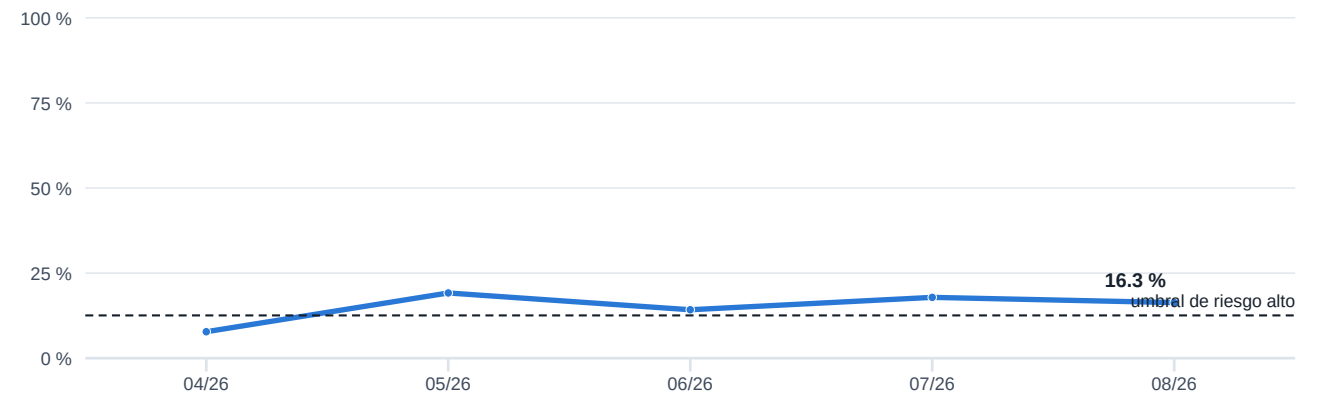

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.403
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.206
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.183
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.136
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.132
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.130
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.115
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.083

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	16.3 %	14.6 %	-1.7 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	16.3 %	14.7 %	-1.6 pp
Absolver todas las consultas pendientes	16.3 %	16.1 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	16.3 %	16.7 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 174 · Consultas · SOEC_RESI · 31/08/2026

...ua potable y el sistema de saneamiento basico. en ese sentido, una vez reiniciada la ejecucion de la obra, a fin de garantizar la adecuada planificacion y continuidad de los trabajos, asi como evitar retrasos durante la ejecucion de las partidas antes mencionadas, se formula la presente consulta a la supervision de obra y/o entidad, solicitando se sirvan precisar y/o confirmar los colores que deberan em...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 154 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 10/08/2026

...les. asimismo, una vez culminadas las precipitaciones, no fue posible reanudar las labores debido a la considerable saturacion del terreno, la inaccesibilidad a los diferentes frentes de trabajo y el bajo rendimiento operativo generado por la imposibilidad de realizar maniobras de construccion en condiciones seguras y adecuadas. se deja constancia de que las condiciones climatologicas adversas registradas en la p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 149 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 08/08/2026

ASIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA: CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2026, ESTA SUPERVISIÓN INDICA LO SIGUIENTE: - DE ACUERDO AL ASIENTO N°146 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL RESIDENTE DE OBRA, EN EL CUAL INDICA PRECIPITACIONES PLUVIALES - SE INDICA AL CONTRATISTA QUE ANTE UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, DEBIDO A LLUVIAS, SE DEBE TENER EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES QUE JUSTIFIQUEN DICHA SOLICITUD, ENTRE DICHAS CONSIDERACIONES ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 148 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 06/08/2026

...les. asimismo, una vez culminadas las precipitaciones, no fue posible reanudar las labores debido a la considerable saturacion del terreno, la inaccesibilidad a los diferentes frentes de trabajo y el bajo rendimiento operativo generado por la imposibilidad de realizar maniobras de construccion en condiciones seguras y adecuadas. es preciso indicar que la zona de mayor afectacion corresponde a la captacion, donde ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 143 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 01/08/2026

...as condiciones de seguridad y calidad de la obra. la ejecucion de las actividades en estas condiciones podria comprometer la estabilidad de las estructuras proyectadas, generar retrabajos y ocasionar incumplimientos de las especificaciones tecnicas y de los controles de calidad establecidos. en ese sentido, y en estricto cumplimiento de los principios de calidad, seguridad, durabilidad y correcta ejecuci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 139 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026

constancia de atraso en la ruta critica de la obra. . se deja constancia que, durante la verificacion efectuada en la fecha, se ha identificado que diversas partidas comprendidas dentro de la ruta critica del programa d...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 139 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026

CONSTANCIA DE ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA.: SE DEJA CONSTANCIA QUE, DURANTE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA EN LA FECHA, SE HA IDENTIFICADO QUE DIVERSAS PARTIDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AÚN NO HAN SIDO EJECUTADAS. EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 207.1 DEL ARTÍCULO 207 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, CUANDO SE VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE A...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 122 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 20/07/2026**

RESPUESTA A CONSULTA: CON FECHA 16 DE JULIO DEL 2026, ESTA SUPERVISIÓN INDICA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN AL ASIENTO N°116 DE FECHA 16/07/2026, MEDIANTE EL CUAL EL RESIDENTE DE OBRA FORMULA UNA CONSULTA RESPECTO A LA PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD TÉCNICA, INTERFERENCIAS FÍSICAS CON LA COBERTURA Y TEMA PRESUPUESTAL EN EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LAS CORREAS DE MADERA SOBRE LAS VIGAS DE MADERA EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAM...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 88 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 21/06/2026**

AUSENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO: EL DIA 12/06/2026, SE CONSTATÓ LA NO PRESENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR EL CUAL DE ACUERDO AL CUADRO DEL CONTRATO OTRAS PENALIDADES N°02 "EN CASO EL CONTRATISTA INCUMPLA CON SU OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LA PRESTACIÓN CON EL PERSONAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO", SE PROCEDERÁ A ELEVAR UN INFORME A LA ENTIDAD.

Fuente: cod-asientos202606.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
