


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

"mejoramiento del estadio municipal de huallanca distrito de huallanca, provincia de bolognesi, departamento de ancash¿ ¿ ii etapa con CUI nº 2312106.

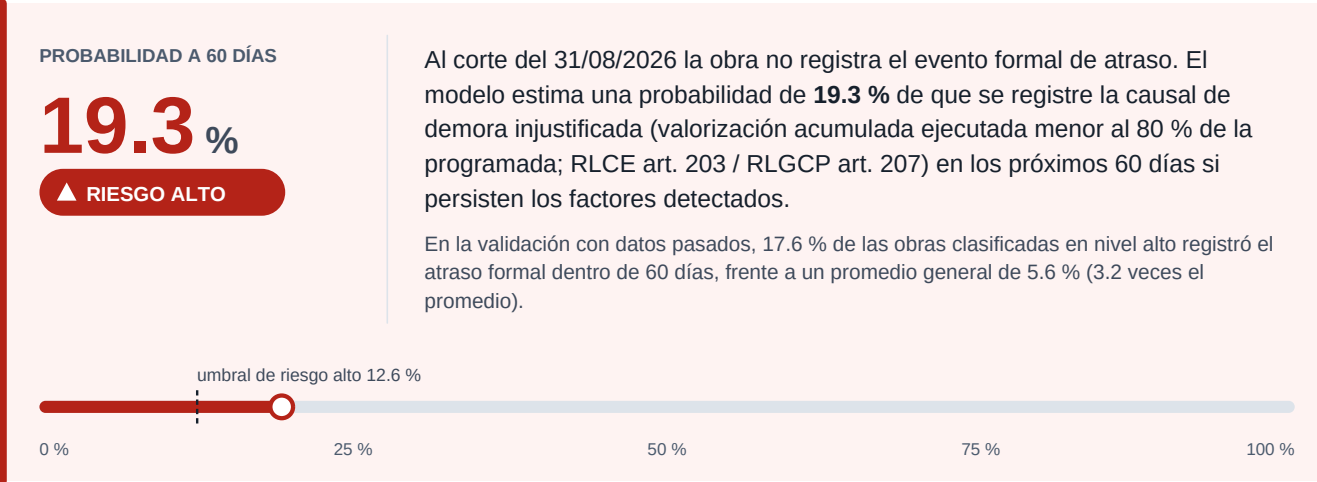


|                    |                |                        |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO  | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 1,938,000.77    | No publicado   | 94<br>desde 17/07/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE HUALLANCA DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ ¿ II ETAPA CON CUI Nº 2312106. |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA - BOLOGNESI                                                                                                       |
| Contratista                                     | CONSORCIO M Y L                                                                                                                                        |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | HUALLANCA / BOLOGNESI / ANCASH                                                                                                                         |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2312106                                                                                                                                                |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH                                                            |
| Función                                         | CULTURA Y DEPORTE                                                                                                                                      |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2408637                                                                                                                                                |
| Monto del contrato                              | S/ 1,938,000.77                                                                                                                                        |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 8,683,811.00                                                                                                                                        |
| Cuaderno de obra digital                        | 94 asientos entre 17/07/2026 y 31/08/2026                                                                                                              |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

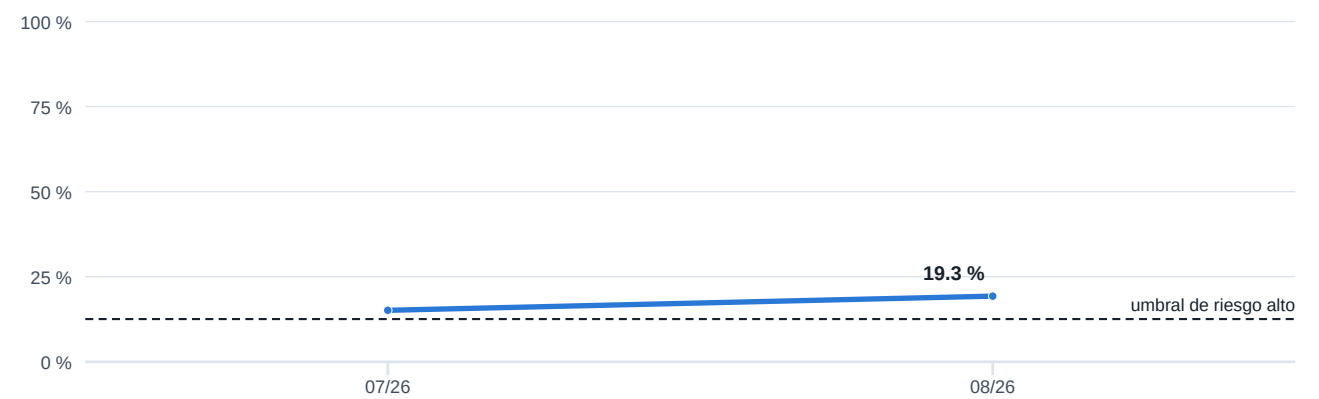

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.512 |
| El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.243 |
| El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.214 |
| 5 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.129 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.120 |
| Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes                                                    | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.106 |
| Extensión media de los asientos recientes: 698 caracteres                                               | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.059 |
| Departamento: Áncash                                                                                    | Características de la obra     | <div></div>    | -0.054 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                                | Actual | Escenario | Cambio  |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes                  | 19.3 % | 19.3 %    | +0.0 pp |
| Ejecución financiera al día (devengado en el último mes) | 19.3 % | 19.3 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 84 · Administración de riesgos · SOEC\_RESI · 28/08/2026

...ire y agua r-12 conflictos con la poblacion o autoridades por malos habitos o faltas del personal r-13 bloqueo de via de acceso a la obra, posiblemente durante los meses de diciembre a marzo, produce retrasos r-14 delincuencia y/o vandalismo r-15 uso de depositos de material excedentes (dme) no autorizados o propiedad de terceros r-16 cambios en la normativa que resulte de aplicacion en la ejecucion de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 79 · Consultas · SOEC\_RESI · 26/08/2026

consulta sobre dimensiones de graderias . al supervisor de obra se solicita coordine con la entidad para la aclaracion del incumplimiento de lo senalado en el rne norma a. 100, articulo 12 numeral 4 inciso c. donde define que, la distancia minima entre dos asientos de filas contiguas sera: en estadios: de 0.80 m. segun el expedi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 81 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 26/08/2026

...ificaron los trabajos ejecutados del asiento n78 del residente.en atencion al asiento n79 del residente, mediante el cual solicita que la supervision coordine con la entidad la aclaracion respecto al incumplimiento de la norma tecnica a.100 recreacion y deportes en relacion con el ancho de las graderias, esta supervision manifiesta que dicha solicitud no resulta objetiva en los terminos planteados, toda ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 70 · Órdenes · SOEC\_SPV · 20/08/2026

RESPUESTA DE CONSULTA: En atención al Asiento N°68 DEL RESIDENTE.Al respecto, esta Supervisión deja constancia que se revisaron los ensayos de suelo adjuntados a la consulta y, en función de la información presentada, se autoriza la ejecución de la mejora propuesta, precisándose expresamente que dicha ejecución se realizará bajo responsabilidad técnica y económica del Contratista.Asimismo, esta Supervisión recomienda...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 65 · Órdenes · SOEC\_SPV · 18/08/2026

NO AUTORIZACION DE VACIADO DE ZAPATAS: Se deja constancia que, a la fecha, el Residente de Obra no ha solicitado a la Supervisión la autorización correspondiente para el vaciado de las zapatas. Asimismo, la Supervisión no ha otorgado autorización para la ejecución de ningún vaciado programado para el día 18 de agosto de 2026.Del mismo modo, se deja constancia que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra de fecha 17 de a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 64 · Órdenes · SOEC\_SPV · 17/08/2026

ACTIVIDADE DEL DIA Y ORDENES: EN ATENCIÓN AL ASIENTO N°61 DEL RESIDENTE, SE LE SOLICITA A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN FISICO Y EN ORIGINAL PARA SU OPINIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE. LA SUPERVISIÓN NO TIENE FACULTADES PARA DEFINIR SI IRÁ CON .60M O .80M, YA QUE SE REALIZARÁ EL TRÁMITE AL PROYECTISTA POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. EN ATE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 60 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 16/08/2026

ACTIVIDADES, ORDENES Y RECOMENDACIONES: SE VERIFICARON LAS ACTIVIDADES DE LOS ASIENTOS N°57 Y 59.SE PRECISA SOBRE LOS ASIENTOS N°57 Y 58, QUE FUE UNA OBSERVACIÓN TÉCNICA HECHA POR LA SUPERVISIÓN. POR LO QUE, LA SUPERVISIÓN VERIFICA QUE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS CONSTITUYEN UNA CORRECCIÓN PUNTUAL DE LOS DETALLES DE ANCLAJE CONSIGNADOS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LAS CUALES RESULTAN TÉCNICAMENTE NECESARIAS PARA GA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 60 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 16/08/2026**

...o. se persiste en la solicitud de presentacion de las polizas o seguros correspondiente al mes de agosto para su control respectivo. se recomienda a aperturar otros frentes de actividades para evitar atrasos injustificados. se le reitera al contratista a presentar el informe del especialista en suelos y adjuntar los resultados del estudio de suelos en fisico, solicitado mediante el asiento n34 del supe...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 58 · Administración de riesgos · SOEC\_RESI · 15/08/2026**

... de ruido, polvos y/o contaminacion de fuentes de agua r05 riesgo de encontrar suelo incompetente, rellenos con características diferentes a la del diseno a profundidades de cimentacion r06 riesgo de atrasos por demora en atencion de consultas sobre ocurrencias de obra r07 riesgo de asentamiento en elementos estructurales r08 riesgo de accidentes graves y muy graves producto de la ejecucion de la obra ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
