


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: "mejoramiento del servicio de movilidad urbana en AV. Libertad, calle manco capac y calle mayta capa, distrito de casma de la provincia de casma del departamento de ancash", con CUI N° 2634646

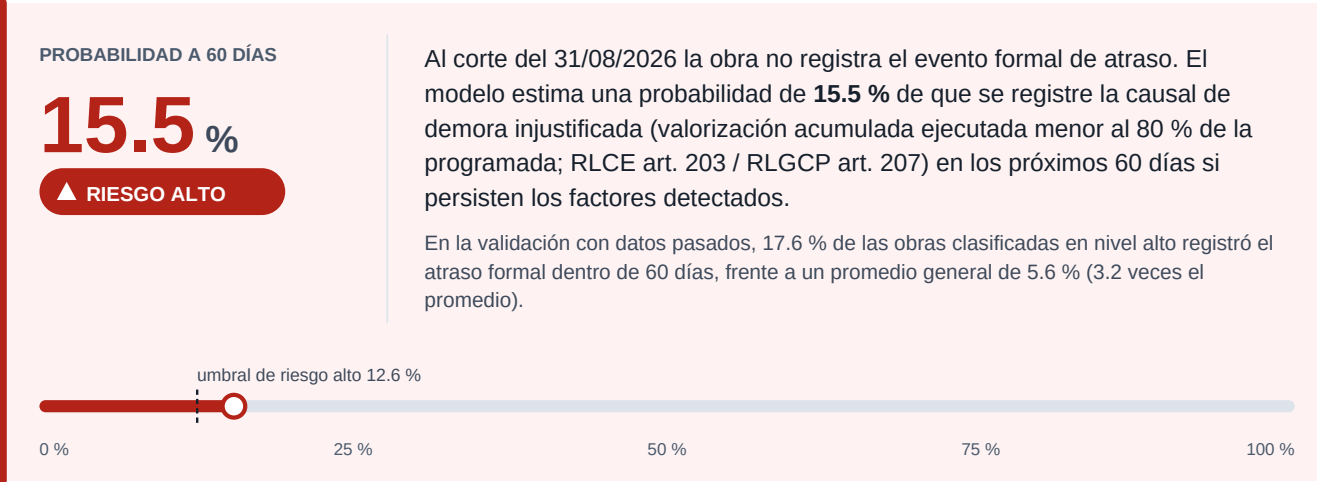


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	147 desde 17/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LIBERTAD, CALLE MANCO CAPAC Y CALLE MAYTA CAPA, DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2634646
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO
Contratista	INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CASMA / CASMA / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2634646
Inversión asociada	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LIBERTAD , CALLE MANCO CAPAC Y CALLE MAYTA CAPA DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2401386
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,944,818.54
Cuaderno de obra digital	147 asientos entre 17/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

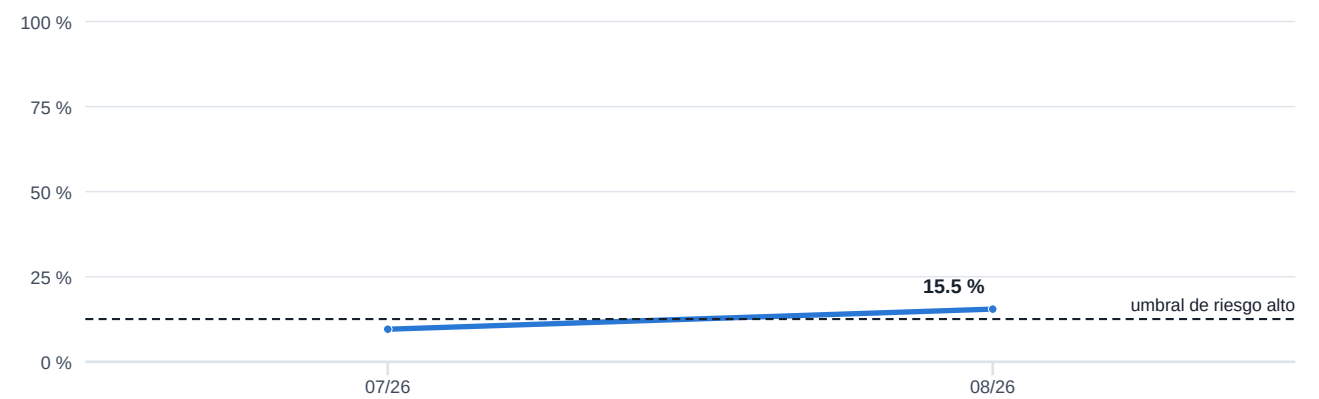

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.522
6 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.160
30 asientos de suspensión del plazo desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.134
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.132
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.096
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
30 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.069

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	15.5 %	15.0 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	15.5 %	15.3 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 147 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 31/08/2026

ACTIVIDADES DURANTE SUSPENSION DE PLAZO: SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, CONOS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DESVIAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS ZONAS DE OBRA SUSPENDIDAS, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD SEGURA EN LAS VÍAS INTERVENIDAS, ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN DE OBRA Y OFICINA, EL RESGUARDO DE MATERIALES, EQ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 143 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 31/08/2026

ACTIVIDADES DURANTE SUSPENSION DE PLAZO DEL 29/08/2026: SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, CONOS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DESVIAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS ZONAS DE OBRA SUSPENDIDAS, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD SEGURA EN LAS VÍAS INTERVENIDAS, ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN DE OBRA Y OFICINA, EL RESGUARDO DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 142 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 28/08/2026

ACTIVIDADES DURANTE SUSPENSION DE PLAZO: SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, CONOS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DESVIAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS ZONAS DE OBRA SUSPENDIDAS, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD SEGURA EN LAS VÍAS INTERVENIDAS, ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN DE OBRA Y OFICINA, EL RESGUARDO DE MATERIALES, EQ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 140 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 27/08/2026

ACTIVIDADES DURANTE SUSPENSION DE PLAZO: SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, CONOS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DESVIAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS ZONAS DE OBRA SUSPENDIDAS, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD SEGURA EN LAS VÍAS INTERVENIDAS, ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN DE OBRA Y OFICINA, EL RESGUARDO DE MATERIALES, EQ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 139 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 26/08/2026

ACTIVIDADES DURANTE SUSPENSION DE PLAZO: SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, CONOS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DESVIAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS ZONAS DE OBRA SUSPENDIDAS, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD SEGURA EN LAS VÍAS INTERVENIDAS, ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN DE OBRA Y OFICINA, EL RESGUARDO DE MATERIALES, EQ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 97 · Órdenes · SOEC_SPV · 12/08/2026

REPARACION DE RED DE DESAGUE, SEÑALIZACIÓN Y MITIGACION AMBIENTAL: viene2. DISPOSICIÓN Y REQUERIMIENTO PERENTORIO AL CONTRATISTAEn cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto, las especificaciones técnicas y la normativa ambiental vigente, esta Supervisión ORDENA al Contratista la ejecución inmediata e impostergable de las siguientes acciones mitigadoras en un plazo máximo de 24 horas:1. Drenaj...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 96 · Órdenes · SOEC_SPV · 12/08/2026

REPARACION DE REDES DE DESAGUE, SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL: Tras las inspecciones de campo realizadas de manera secuencial desde los días 10, 11 y 12 de agosto de 2026, la Supervisión reporta y deja constancia de lo siguiente:1. CONSTANTACIÓN TÉCNICO-AMBIENTAL Y HALLAZGOS• Anegamiento por Aguas Servidas (Foco Infeccioso): Se ha verificado la acumulación prolongada de aguas residuales y servidas en las zanja...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 84 · Órdenes · SOEC_SPV · 10/08/2026 REPARACIÓN DE RED DESAGÜE: Se exige al contratista la reparación inmediata de la rotura de red de desagüe en la Av. Libertad, situación que viene persistiendo desde la semana pasada, tal como se muestra en archivo adjunto. Hay quejas de los vecinos ante la falta de respuesta del contratista en solucionar estos problemas que están poniendo en peligro la salud pública. Es necesario la implementación un frente capacita... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 72 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 08/08/2026 ...fundamentos expuestos, toda vez que los argumentos desarrollados por la supervisión no desvirtúan las causales objetivas que motivaron la solicitud de suspensión, cuyo objeto no ha sido justificar un atraso de obra ni acreditar una afectación ya producida de la ruta crítica, sino dejar constancia de la imposibilidad material de continuar ejecutando determinadas prestaciones por hechos ajenos a la volun... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 71 · Órdenes · SOEC_SPV · 08/08/2026 PRESENCIA REBALSE DE AGUA SERVIDAS EN OBRA: EL DIA DE HOY SE CONSTATA LA PRESENCIA DE REBALSE DE AGUAS SERVIDAS QUE ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LOS VECINOS.NO HAY PERSONAL QUE REALICE LOS DESATOROS, CABE RECORDARLE QUE TODA EL AREA QUE ABARCA LA OBRA ESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.POR LO QUE SE ORDENA DE INMEDIATAMENTE IMPLEMENTAR UNA CUADRILLA A FIN REALIZAR LOS TRABAJOS Y DEJAR MINIMAMENTE EN ESTA OP... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 73 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 08/08/2026 ...o hasta dicha fecha y no demuestra que existan frentes de trabajo técnicamente disponibles para continuar con las prestaciones afectadas. la suspensión solicitada no se fundamenta en la existencia de atraso, sino en la imposibilidad objetiva de ejecutar determinadas actividades debido a las causales oportunamente comunicadas. Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 64 · Órdenes · SOEC_SPV · 07/08/2026 OCURRENCIAS EN OBRAS: Con respecto a las paralizaciones que hace mención el Contratista, estas son espontaneas. Estas se vienen dando del km 1+500 hacia adelante, lo que hace que los vecinos y propietarios afectados reclamen.Al respecto el día de hoy se evidencia la realización los siguientes trabajos:En el tramo del km 0+000 al km 0+160 (inicio de la Av. Libertad), se realizan trabajos de demolición de veredas con 0... Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
