


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: Ioarr renovacion de colector secundario, buzón y conexión domiciliaria de alcantarillado, en el(la) sistema de alcantarillado de la asoc. De VIV. Las viñas parcela 1 y la asoc. De VIV. Los ediles (sector cono sur este), dcfgal - tacna

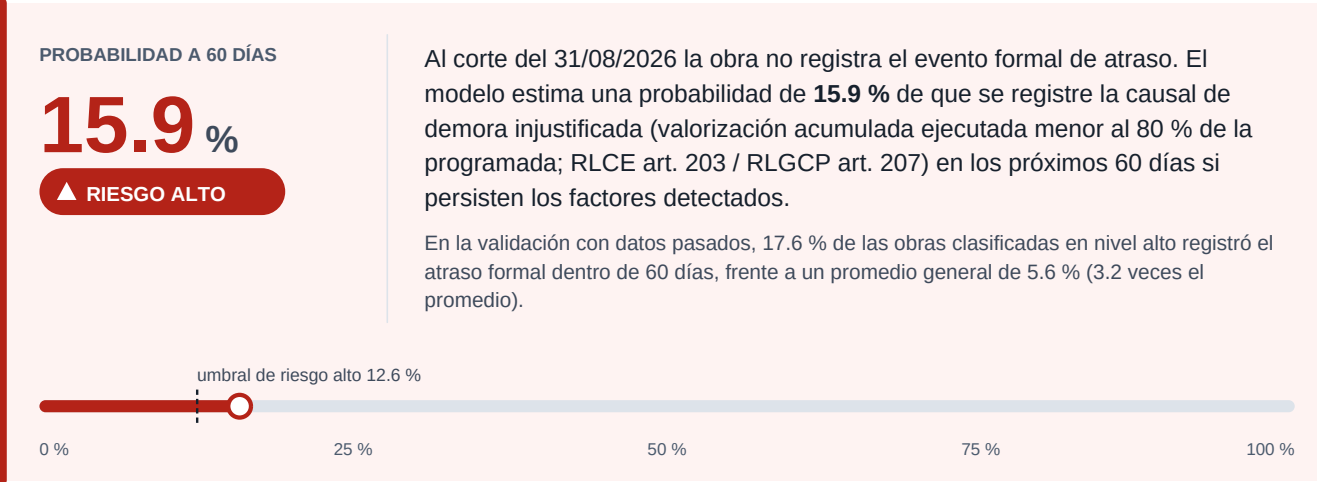


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	63 desde 08/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: IOARR RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASOC. DE VIV. LAS VIÑAS PARCELA 1 Y LA ASOC. DE VIV. LOS EDILES (SECTOR CONO SUR ESTE), DCGAL - TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2600893
Inversión asociada	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASOC. DE VIV. LAS VIÑAS PARCELA 1 Y LA ASOC. DE VIV. LOS EDILES (SECTOR CONO SUR ESTE), DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2391323
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,499,515.23
Cuaderno de obra digital	63 asientos entre 08/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

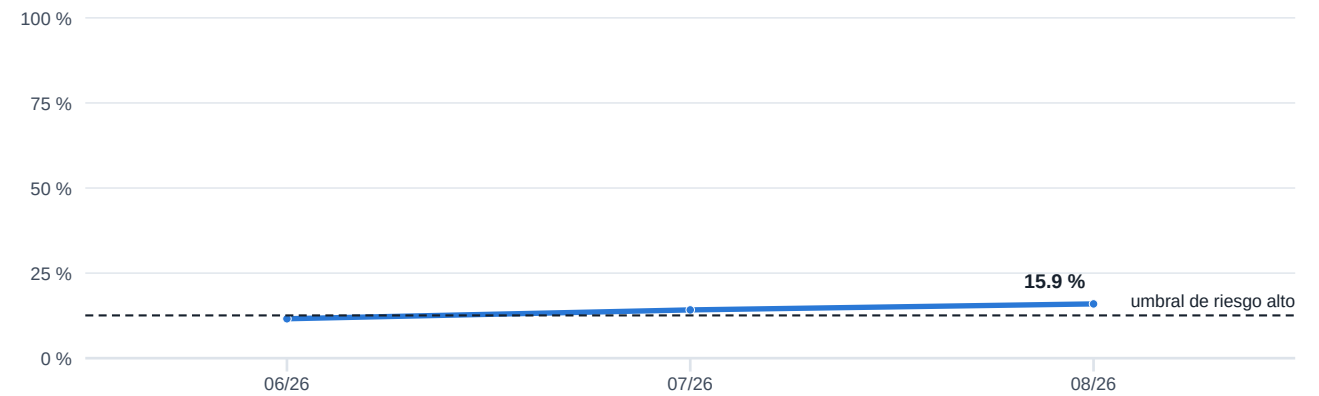

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.585
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.243
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.207
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.166
Hubo registros en el cuaderno 7 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		-0.121
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.117
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.095
11 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.085

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.9 %	15.7 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 62 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

...includados a la red colectora bloqueada, y la partida 02.05.01 buzones de inspeccion h<=3.00m vence el 29/08/2026 sin poder ejecutarse los buzones dependientes de la solucion de reemplazo del bz-16.el incumplimiento de estas fechas es consecuencia directa y exclusiva de la falta de aprobacion de la pao n 01, situacion no imputable al consorcio centauro.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 58 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 24/08/2026

... sobre las reconexiones domiciliarias de dichos tramos. todos estos elementos forman parte de partidas de ruta critica con vencimiento inminente entre el 25 de agosto y el 05 de septiembre de 2026.el incumplimiento de las fechas de conclusion de dichas partidas es consecuencia directa y exclusiva de la falta de aprobacion de la pao n 01, situacion no imputable al consorcio centauro.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

*PARALIZACIÓN DE OBRA POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS — LLUVIAS INTENSAS EN TACNA
PARTIDAS DE RUTA CRÍTICA AFECTADAS PARTE 02: Las condiciones de lluvia intensa generan la imposibilidad técnica de ejecutar las siguientes partidas activas en ruta crítica según el Cronograma de Ejecución de Obra aprobado: la partida 02.03.02 Excavación de Zanja c/Maquinaria TUB 200mm, A=0.80m, H 1.20m hasta 2.50m (vigente hasta ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

... causal no imputable al contratista conforme al art. 158 del reglamento de la ley n 32069. se deja constancia del inicio de la paralización a partir del día de hoy, acumulandose al computo de días de retraso no imputable al contratista. el consorcio centauro se reserva el derecho de formalizar la solicitud de ampliacion de plazo correspondiente una vez concluida la causal, con el sustento meteorologico,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 17/08/2026

.../2026 conforme al art. 210.3 del mismo reglamento. a la fecha de hoy, 17/08/2026, la valorizacion n 01 continua sin ser cancelada, acumulando 17 días calendario de mora en el pago.la persistencia del incumplimiento agrava el impacto financiero sobre el consorcio centauro, comprometiendo de manera creciente el pago oportuno de proveedores, personal tecnico y obrero, asi como la adquisicion de materiales e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 10/08/2026

riesgo falta de pago de valorizacion n 01 mes de junio 2026 incumplimiento contractual de la entidad . estado: activo en morala valorizacion n 01 correspondiente al mes de junio de 2026 fue presentada por el consorcio centauro con fecha 03/07/2026, dentro del plazo e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/07/2026

...das asociadas a la ejecucion de dichos buzones, redes y conexiones domiciliarias se encuentran en la ruta critica del proyecto (holgura total = 0), por lo que su no ejecucion traslada directamente el retraso al termino del plazo contractual, al no contar dichas actividades con holgura disponible que absorba la demora.una vez culminada la causa que origina el presente retraso, el contratista, de correspo...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 35 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 14/07/2026

....hitos afectados: las partidas 02.03.01, 02.03.02, 02.03.03, 02.03.04, 02.03.05, 02.03.06, 02.03.07, 02.04.01, 02.05.01 y 02.05.02 permanecen bloqueadas en los tramos afectados, acumulando 30 días de retraso no imputable al contratista desde el 14/06/2026. el consorcio centauro se reserva el derecho de formalizar la ampliacion de plazo conforme al art. 158 del reglamento de la ley n 32069.

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/07/2026**

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS: EN ATENCIÓN A LAS ANOTACIONES REALIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, ESTA SUPERVISIÓN TOMA CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES REPORTADAS RESPECTO A LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO DEL IMPEDIMENTO DE ACCESO A LA UBICACIÓN DEL BUZÓN BZ-16 Y LA GESTIÓN EFECTUADA ANTE EPS TACNA S.A., CUYA RESPUESTA SE ENCONTRARÍA PENDIENTE. ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA DE LA ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 27 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 06/07/2026**

RIESGO ACTIVO: BZ-16 EN PROPIEDAD PRIVADA — RESPUESTA EPS TACNA PENDIENTE: IMPEDIMENTO DE ACCESO A PREDIO PRIVADO (BZ-16 Y RED COLECTORA VINCULADA) Estado: ACTIVO — PENDIENTE DE RESPUESTA DE EPS TACNA Con fecha 30/06/2026, el Consorcio Centauro presentó ante EPS Tacna S.A. la Carta N° 023-2026-WDML-CC, solicitando información técnica del sistema de alcantarillado existente en el área de influencia de los Buzones BZ-14,...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
