


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de la Red de Servicio(s) de Movilidad Urbana en 12 Unidades Productoras de Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito Santiago de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima ¿CUI 2686013¿ (Primera Etapa)

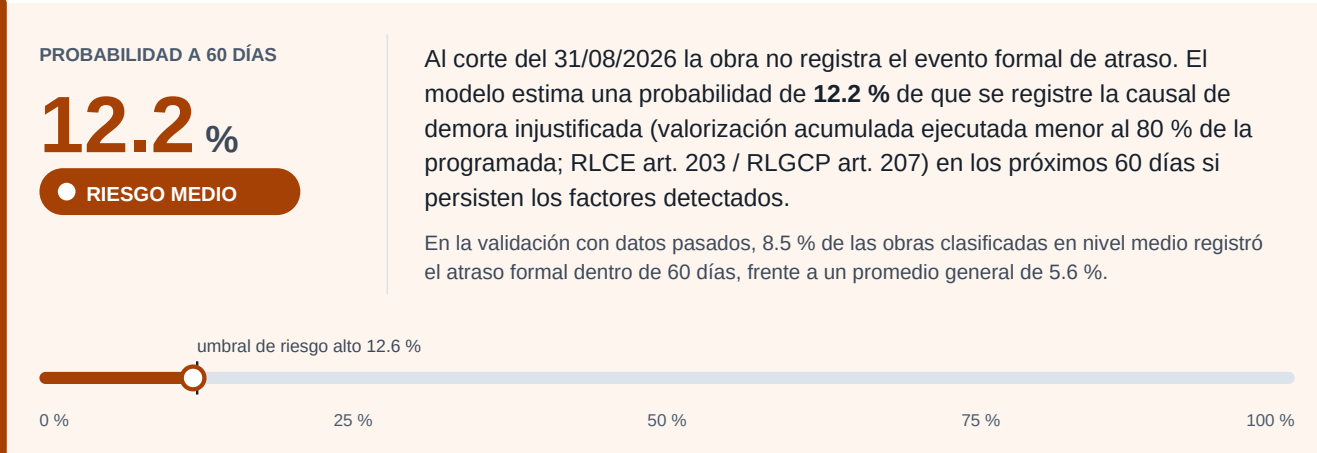


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 16,356,036.75	300 días	289 desde 22/01/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Mejoramiento de la Red de Servicio(s) de Movilidad Urbana en 12 Unidades Productoras de Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito Santiago de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima ¿CUI 2686013¿ (Primera Etapa)
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Contratista	R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2686013
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA RED DE SERVICIO(S) DE MOVILIDAD URBANA EN 12 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2366730
Monto del contrato	S/ 16,356,036.75
Monto aprobado de la inversión	S/ 23,221,100.35
Cuaderno de obra digital	289 asientos entre 22/01/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

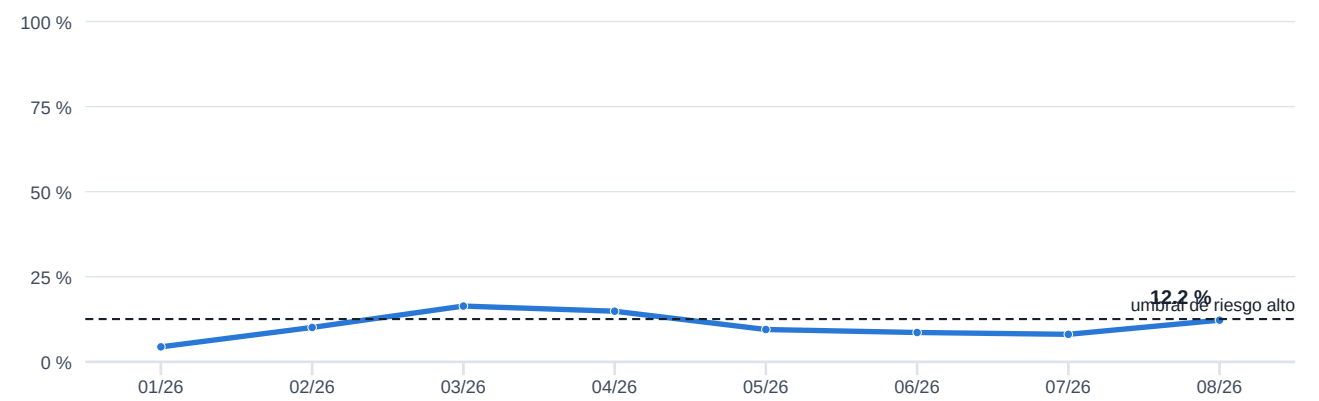

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.489
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.165
Faltan 78 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.162
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.159
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.141
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 6,178,427	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.124
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.123
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.088

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.2 %	12.1 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.2 %	12.2 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	12.2 %	12.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 288 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...e obra dl proyecto. se exhorta a la la contratista tomar las acciones del caso para evitar caer en el cumplimiento de su programacion de obra , tanto contractual como del adicional y caer en posibles penalidades por el no cumplimiento de la misma.se deja esto indicado para los fines del caso.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 289 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

...acion de material excedente, partidas de 05.01 drenaje y 06.00 comunicaciones, y sus sucesoras, por lo que de acuerdo al art. 198 el contratista comunica continua la causal de ampliacion de plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, hasta la culminacion de trabajos de la concesionaria sedapal sobre las redes de agua y desagüe.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 285 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...os ya ejecutados , deberan levantar las observaciones dentro de su plazo contractual, sino lo hiciesen y llegado el plazo final , no lo concluyen , se dara por no terminada la obra . pudiendo caer en penalidades por el no cumplimiento de la ejecucion de las partidas en el plazo dado segun contrato suscrito con la entidad municipal.por lo tanto, se exorta a la contratista tomar en cuenta este asiento de obr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 277 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 20/08/2026

...acion de material excedente, partidas de 05.01 drenaje y 06.00 comunicaciones, y sus sucesoras, por lo que de acuerdo al art. 198 el contratista comunica continua la causal de ampliacion de plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, hasta la culminacion de trabajos de la concesionaria sedapal sobre las redes de agua y desagüe.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 269 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

...lognesi (cdras. 1, 2, 3,4), batalla de ayacucho (cdras. 2 y 3), saenz pena, calle tacna,4,5. en tal sentido y de acuerdo a lo indicado en el informe n183-2026-ebz-sgomo, concluye que no se aplicaran penalidades, retenciones ni afectaciones a sus garantias por dichas intervenciones de terceros, habiendose procedido a requerir formalmente a las empresas concesionarias la reparacion integral y restitucion a ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 266 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

...lognesi (cdras. 1, 2, 3,4), batalla de ayacucho (cdras. 2 y 3), saenz pena, calle tacna,4,5. en tal sentido y de acuerdo a lo indicado en el informe n183-2026-ebz-sgomo, concluye que no se aplicaran penalidades, retenciones ni afectaciones a sus garantias por dichas intervenciones de terceros, habiendose procedido a requerir formalmente a las empresas concesionarias la reparacion integral y restitucion a ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 259 · Consultas · SOEC_RESI · 05/08/2026

...entidad contratante no cumplen con lo senalado en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora, la cual se computa desde la fecha en la que la falta de ejecucion de los trabajos materia de la consulta genere impacto en la ruta critica del programa de ejecucion vigente para tal fin se remite ca...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 259 · Consultas · SOEC_RESI · 05/08/2026

ASIENTO DE LA RESIDENCIA: Por medio de la presente se comunica a la supervisión que se pueda hacer la gestión con la entidad contratante para la atención de CONSULTAS 08,11,12,15,16,17,18, 19, todo esto de acuerdo al art. 190.4. "Si .. la entidad contratante no cumplen con lo señalado en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 253 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026

OPTIMIZACION DE BUZONES Y BUZONETAS EN OBRA- CONSULTA 18: LA SUPERVISION DEJA INDICADO LO SIGUIENTE:- LA CONTATISTA DEJA INDICADO EN SU ASIEN TO N° 248 - RESIDENTE DE OBRA , QUE DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS HALLADAS EN LAS EXCAVACIONES JR JOSE GALVEZ Y JR ALEMANIA , INDICAN LA OPTIMIZACION DE LAS EJECUCION DE BUZONES Y BUZONETAS DE COMUNICACIONES , REALIZANDO LA REDUCCION DE LAS MISMAS , SEGUN ARCHIVO ADJUNTO AL ASIE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 252 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/07/2026

...03 eliminacion de material excedente, partidas de drenaje y comuniciaones. y sus sucesoras, por lo que de acuerdo al art. 198 el contratista comunica el inicio de la causal de ampliacion de plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, hasta la culminacion de trabajos de la concesionaria sedapal sobre la renovacion de redes de agua y desagüe.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 248 · Consultas · SOEC_RESI · 23/07/2026

ASIEN TO DE LA RESIDENCIA: Se comunica al supervisor que de la revisión de los documentos del contrato (Exp. Técnico y Exp. adicional 01) se hace la consulta de optimizar buzones y buzonetas teniendo en consideración que recién al haber demolido y excavado en su totalidad la calle se aprecia nuevas interferencias de redes de servicios en la calle galvez cuadra 03 y Alemania que solo se han podido detectar con la zanja...

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 78

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
