


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra del proyecto ¿mejoramiento de la institucion educativa secundaria de menores san miguel de villa de arma, distrito de arma, provincia de castrovirreyna -huancavelica

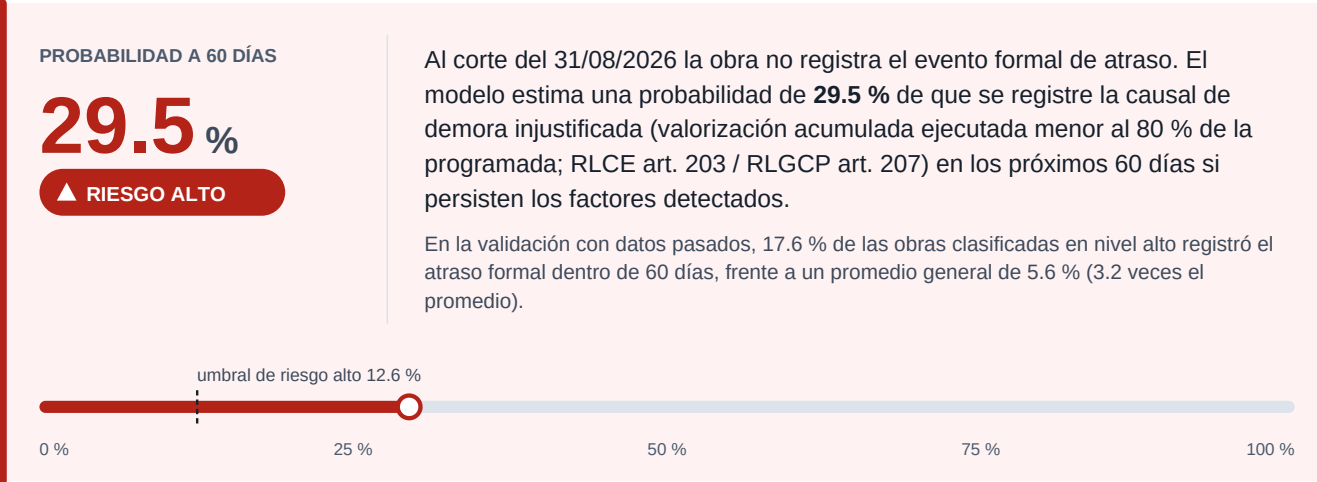


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	143 desde 24/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN MIGUEL DE VILLA DE ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ARMA / CASTROVIRREYNA / HUANCAVELICA
Código Único de Inversión (CUI)	2126280
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN MIGUEL DE VILLA DE ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2400120
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,038,883.06
Cuaderno de obra digital	143 asientos entre 24/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

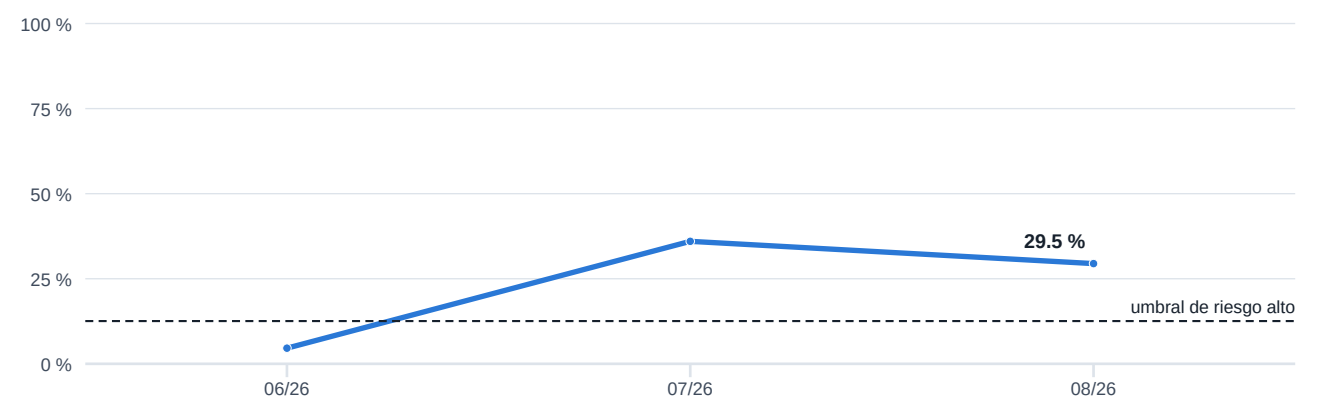

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.77 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.714
El 21 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.285
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.267
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.134
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.110
5 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
7 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.085

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	29.5 %	28.2 %	-1.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	29.5 %	29.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 139 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 28/08/2026

residente de obra . se deja constancia que la entidad comunica al consorciado la aceptacion del cambio de residente, se adjunta carta emitida por la entidad para mayor veracidad sinembargo en merito al numeral 189.3 y 189.5 del articulo 189 del reglamento de la ley n. 32069, aprobado mediante d.s. n. 009-2025-ef s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 131 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 26/08/2026

sustitucion de residente de obra . referente alasiento 125, el dia de hoy mediante carta n029-2026-csm/rc/ebm se comunico a la entidad sustitucion del cambio de residente de obra por falta de pronunciamiento y se solicito la habilitacion del acceso al cuaderno de obra digital al ing. jaimo o. pepe de la cruz. asimismo el ingeniero residente continua con la ejecucion d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 127 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...do de fondos y tapas de vigas, asi como la colocacion de acero en vigas. asimismo con carta n. 028-2026-csm/rc/ebm se presento descargo y sustento documentario frente a la propuesta de aplicacion de penalidad julio 2026

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 122 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

ausencia del residente, incumplimiento g.050, avance de obra . -no se encuentra en obra el residente ni su equipo clave de acuerdo al cronograma presentado- la especialista de seguridad presentado como personal clave, desde...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 122 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

ausencia del residente, incumplimiento g.050, avance de obra . -no se encuentra en obra el residente ni su equipo clave de acuerdo al cronograma presentado- la especialista de seguridad presentado como personal clave, desde inicio ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 117 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 23/08/2026

...equerimientos se sustenten tecnicamente y sean formulados bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y rigor tecnico, evitando observaciones o imputaciones desproporcionadas que puedan generar penalidades y costos no previstos y afectar la economia y ejecucion de la obra, en concordancia con los principios de la ley n. 32069 y su reglamento, aprobado por d.s. n. 009-2025-ef y modificatorias. asismism...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 121 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 23/08/2026

...ha notificado formalmente que su persona haya sido designada como reemplazo del ing. madueno, quien suscribio el acta de inicio.por ello, solicitamos evitar anotaciones reiterativas sobre la supuesta ausencia del residente y personal clave, mas aun cuando se advierten referencias a posibles penalidades sin considerar el cronograma de participacion establecido.solicitamos actuar con razonabilidad, proporcionalidad y cri...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 121 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 23/08/2026

..., quien suscribio el acta de inicio.por ello, solicitamos evitar anotaciones reiterativas sobre la supuesta ausencia del residente y personal clave, mas aun cuando se advierten referencias a posibles penalidades sin considerar el cronograma de participacion establecido.solicitamos actuar con razonabilidad, proporcionalidad y criterio tecnico, priorizando la correcta ejecucion y el avance de la obra. mi rep...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 121 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 23/08/2026

...zando la correcta ejecucion y el avance de la obra. mi representada atiende las recomendaciones sustentadas y concordantes con el expediente tecnico, mas no aquellas que, sin sustento, puedan generar retrasos o entorpecer la ejecucion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 106 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026**

AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE, AVANCE DE OBRA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE OBRA: -ING RESIDENTE DE OBRA Y EQUIPO TECNICO NO SE ENCUENTRAN EN OBRA-SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENCIA EN OBRA DEL TOPOGRAFO PARA LIBERAR FRENTES-MEDIANTE CARTA N°19-2026/RPC/RO/CSM DE FECHA 18/08/2026 LA CONTRATISTA ENTREGO A ESTA SUPERVISION EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TECNICA DE LA UNIDAD DE ALBAÑILERIA PIRAMIDE KING KONG TIPO V...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 98 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026**

AUSENCIA DE EQUIPO CLAVE-INGRESO DE MATERIAL A OBRA- AVANCE DE OBRA: --A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL ING RESIDENTE NI SU EQUIPO NI SU PERSONAL CLAVE-A LA FECHA NO ESTA EN CAMPO EL TOPOGRAFO PARA LIBERAR LOS FRENTES DE TRABAJO, TODO PROCESO ES NETAMENTE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA--SE SOLICITA AL CONTRATISTA REITERADAMENTE LA PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA Y SU CERTIFICADO DE CALIDAD CON TRAZABILIDAD CON...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
