


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación de la ejecucion de la obra: ¿mejoramiento del servicio de educación secundaria de la IE dos de mayo del centro poblado paccha del distrito de chulucanas - provincia de morropon - departamento de piura, con CUI N°2418983

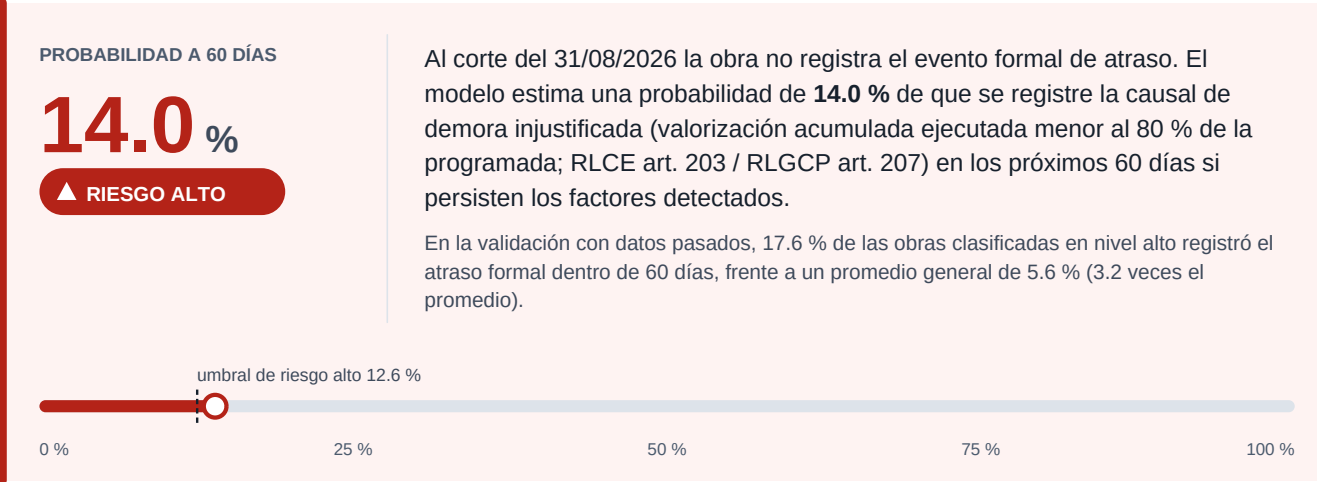


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 21,923,461.46	450 días	491 desde 06/09/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO PACCHA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CUI N°2418983
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Contratista	CONSORCIO FRONTERA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHULUCANAS / MORROPON / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2418983
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO PACCHA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2339873
Monto del contrato	S/ 21,923,461.46
Monto aprobado de la inversión	S/ 12,748,856.67
Cuaderno de obra digital	491 asientos entre 06/09/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

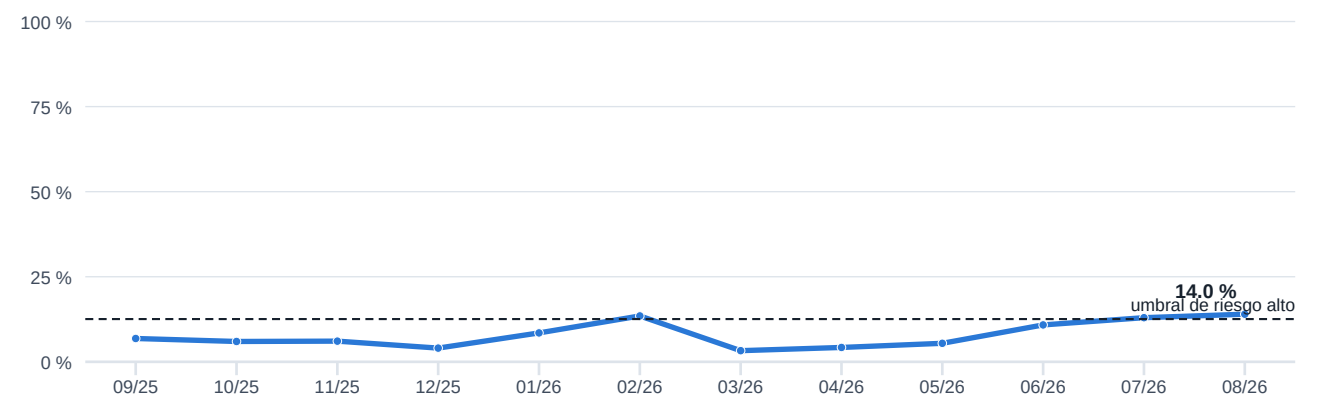

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.631
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.229
Faltan 87 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.186
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.111
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.107
Departamento: Piura	Características de la obra		-0.072
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.066
Extensión media de los asientos recientes: 1,416 caracteres	Contenido de los asientos		-0.056

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.0 %	13.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.0 %	14.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 488 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...e a la normativa y al procedimiento contractual aplicable.-se reitera al contratista aumentar su personal en los frentes de trabajo, así como los materiales necesarios para ello, a fin de revertir el atraso de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 478 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REITERACIÓN PARA REVERTIR EL ATRASO: - INICIA LA JORNADA CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CARGO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA.- SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO DE AFIRMADO EN CAPA DE 0.20 M DE AULA 03 DEL BLOQUE 01. ASIMISMO SE CONTINÚA CON EL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MEZCLADO CON HORMIGÓN EN PROPORCIÓN 50% DE C/U EN AULA 01, 02 Y ESCALERA DE ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 478 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

avance de ejecucion contractual y reiteracion para revertir el atraso . - inicia la jornada con las charlas de seguridad y salud en el trabajo a cargo del especialista del contratista.- se trabaja en el relleno compactado de afirmado en capa de 0.20 m de aula 03 del b...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 478 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...mismo, se le recuerda al contratista que, de acuerdo con las disposiciones contractuales, debe cumplir oportunamente con el pago semanal y/o quincenal de sus trabajadores, debiendo tener presente las penalidades establecidas en el contrato, a fin de evitar su aplicacion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 474 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

avance de ejecucion contractual y reiteracion para revertir el atraso . - inicia la jornada con las charlas de seguridad y salud en el trabajo a cargo del especialista del contratista.- se realiza ensayo de densidad de campo a la capa de relleno con material propio me...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 470 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

avance de ejecucion contractual y reiteracion para revertir el atraso . - inicia la jornada con las charlas de seguridad y salud en el trabajo a cargo del especialista del contratista.- se realiza el vaciado del concreto f c= 210 kg/cm2 en columnas y sobrecimientos de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 463 · Adicionales · SOEC_RESI · 12/08/2026

*RESPUESTA AL A.C.O N° 462 DE SUPERVISOR - PROCEDER CON TRÁMITE DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA: * EN RESPUESTA A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SUPERVISOR EN EL A.C.O N° 462 DE FECHA 11.08.2026, EN LA CUAL SOLICITA AL CONTRATISTA PROCEDER DE MANERA INMEDIATA CON EL TRÁMITE DE PRESTACIÓN ADICIONAL, EL SUSCRITO MANIFIESTA:- MEDIANTE CARTA MULTIPLE N° D000075-2026-MPMCH-SI DE FECHA 07.08.26 LA ENTIDAD NOTÍFICA, AL CONTRA...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 464 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 12/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N.º 455 DEL RESIDENTE SOBRE INICIO DE CIRCUNSTANCIA QUE DETERMINA AMPLIACIÓN DE PLAZO: LA SUPERVISIÓN, EN ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 455 DEL RESIDENTE, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE REGISTRAR EL INICIO DE UNA CIRCUNSTANCIA QUE DETERMINA AMPLIACIÓN DE PLAZO, DEJA CONSTANCIA QUE, LUEGO DE REVISAR LA ABSOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, LA PROGRAMACIÓN VIGENTE, LAS RELACIONES ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 87

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
