


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecucion de la obra: ¿creacion del servicios de espacios públicos urbanos en la mz d lote 1 del A.H. Nuevo amanecer del distrito de nuevo chimbote de la provincia de santa del departamento de ancash¿, con CUI N° 2643671.

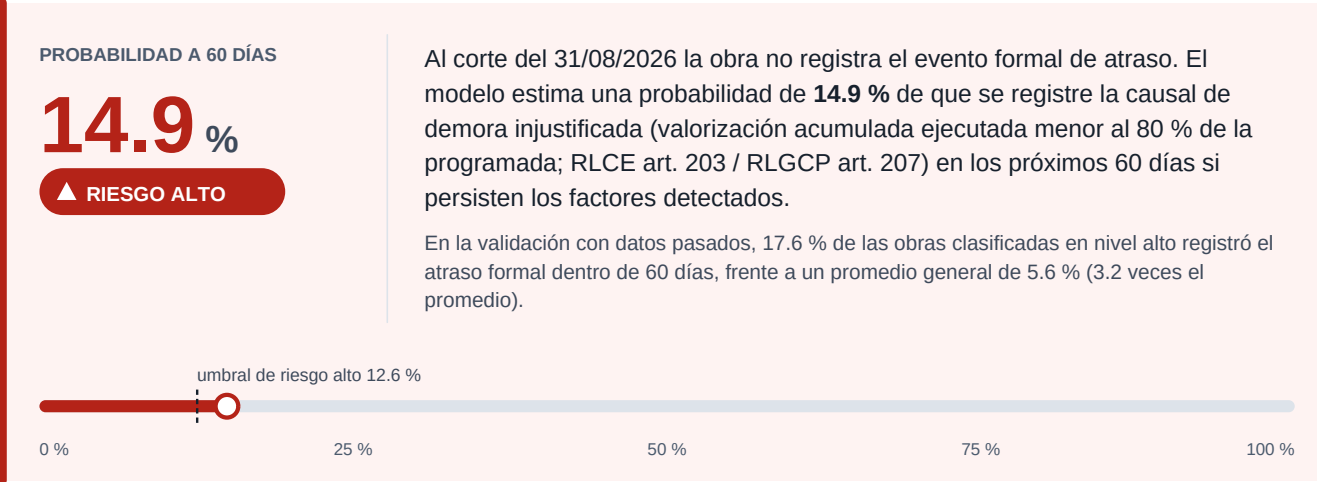


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	157 desde 07/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA MZ D LOTE 1 DEL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH¿, CON CUI N° 2643671.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
Contratista	CONSORCIO NUEVO AMANECER
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	NUEVO CHIMBOTE / SANTA / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2643671
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA MZ D LOTE 1 DEL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	AMBIENTE
Identificador del contrato (SEACE)	2384807
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,649,104.23
Cuaderno de obra digital	157 asientos entre 07/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

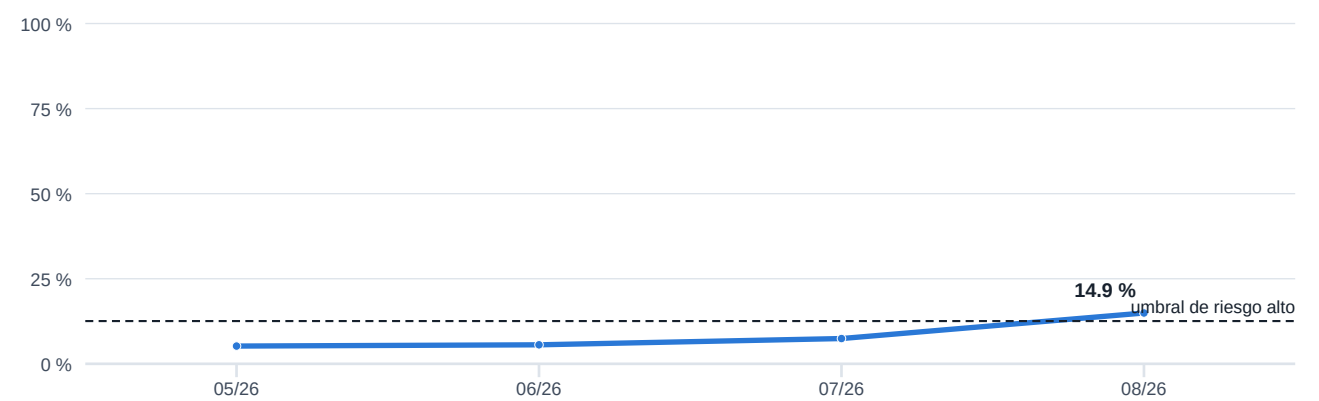

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.539
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.212
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.176
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.139
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.133
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.073
Departamento: Áncash	Características de la obra		-0.069

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	14.9 %	12.0 %	-2.9 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.9 %	14.7 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	14.9 %	14.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 156 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

...es de agosto del 2026.se comunica al supervisor de obra que se tiene un avance de obra (01 al 25 de agosto del 2026) real de 30.36% y un avance acumulado de 89.02%, por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en 7.26% respecto del calendario valorizado de avance de obra programado al inicio de obra.se procede a compilar los documentos administrativos para la presentacion de dicha valorizacion de acuerd...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 157 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

...verificado los metrados ejecutados en el periodo del 01/08/26 al 25/08/26, correspondiente al mes de agosto, con un porcentaje de ejecucion de 30.36%, siendo el acumulado 89.02%, la obra se encuentra atrasada en 7.26%. por lo que se aprueba a la residencia los metrados ejecutados durante dicho periodo del 01 al 25 de agosto del 2026, por lo cual se recomienda la presentacion del informe de valorizacion...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 145 · Consultas · SOEC_SPV · 22/08/2026

CONSULTA 08. VEREDA AL REDEDOR DE LA CISTERNA: EL 20.08.2026 Mediante Asiento N°142 la Residencia realiza la consulta respecto a la VEREDA AL REDEDOR DE LA CISTERNA PRIMERO. Se formula la presente consulta técnica respecto a las líneas que se encuentran alrededor de la cisterna, así mismo, esta línea y lo que se encuentra dentro de la línea no esta designado o escrito como tal, es solo líneas que se encuentran alrede...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 137 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...neles peraltados en el jr. el sol, respetando sus dimensiones del elemento.se comunica a la residencia que el día 14.08.2026 se notifico via correo electronico a la empresa consorcio nuevo amanecer la penalidades aplicada segun se detalla en el asiento del cod del supervisor n117 y mediante carta n30/2026-smcb-rc-csnm se comunico a la entidad con tramite administrativo n51966-2026

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 126 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 06/08/2026

...nto n121 del residente de obra indicando que se procede con el levantamiento de observaciones emitidas por la supervision por lo cual se recomienda la subsanacion en su totalidad con el fin de evitar penalidades.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 121 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

...de los servicios de espacios publicos urbanos en la mz d lote 1 del a.h. nuevo amanecer...", se le otorga un plazo perentorio de [48 horas] para corregir las observaciones señaladas. de persistir el incumplimiento, se procedera con la cuantificacion e inicio del procedimiento para la aplicacion de la penalidad contractual detallada en el contrato del contratista clausula decimaquinta: penalidades. se so...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 117 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 03/08/2026

APLICACIÓN DE PENALIDAD SEGÚN INDICA EN EL ITM ÍTEM 14 DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA: - Según los asientos del supervisor N° 92 de fecha 16.07.2026 y el asiento del supervisor N°101 de fecha 21.07.2026, se vino recomendando a la residencia junto a su especialista de calidad tener mayor control exhaustivo en los acabados.- Desde hoy 03.08.2026 Se procederá con la cuantificación e inicio del procedimiento para la aplica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 117 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 03/08/2026

aplicacion de penalidad segun indica en el itm item 14 del contrato del contratista . - segun los asientos del supervisor n 92 de fecha 16.07.2026 y el asiento del supervisor n101 de fecha 21.07.2026, se vino recomendando a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 115 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/07/2026 ...I 31 de julio del 2026.se comunica al supervisor de obra que se tiene un avance de obra (01 al 31 de julio del 2026) real de 15.23% y un avance acumulado de 58.66%, por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en 3.34% respectodel calendario valorizado de avance de obra programado al inicio de obra.se procede a compilar los documentos administrativos para la presentacion de dicha valorizacion de acuerdo... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 114 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 31/07/2026 NOTIFICACION DE LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA N°04,05,06 Y 07: El día de hoy 31.07.2026 la entidad notifico a la Supervisión la Absolución de consultas N°04, 05, 06 y 07 por lo cual se recomienda a la residencia cumplir con lo indicado por la Entidad, SE ANEXA DICHOS INFORMES DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 110 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/07/2026 SE REITERA LA NO EJECUCION DE PARTIDAS REFERENTE A LA CONSULTA N°05 HASTA LA ABSOLUCION DE LA MISMA: Por error de digitación en el asiento N°109 del supervisor se anoto lo siguiente "Se inicia con la excavación para sardineles peraltados en área de juego de niños, respetando los niveles, dimensiones y formas que corresponde" y el asiento N°108 del supervisor "Se continua con la conformación de sub base para pisos en ... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
