


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra ¿mejoramiento y ampliacion de transitabilidad vehicular y peatonal de la via ecologica de interconexion entre tio grande -tio chico - pedro vilcapaza y pasos del señor, distrito de sachaca - provincia de arequipa - departamento de arequipa¿, CUI 2389879¿

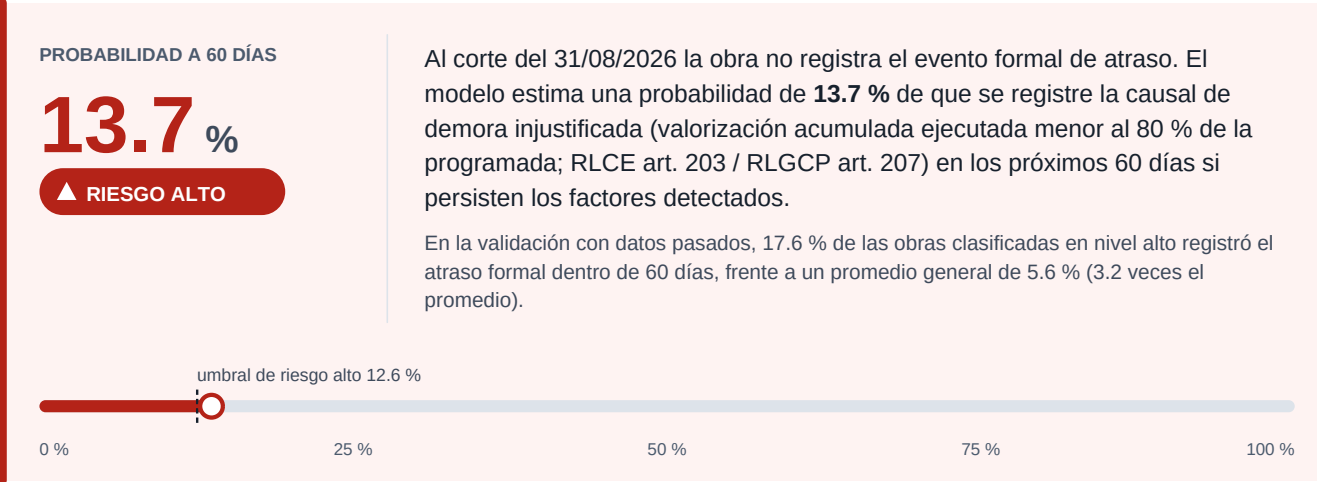


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 10,120,294.87	180 días	152 desde 17/02/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA ECOLOGICA DE INTERCONEXION ENTRE TIO GRANDE -TIO CHICO - PEDRO VILCAPAZA Y PASOS DEL SEÑOR, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿, CUI 2389879¿
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Contratista	V & C SERVICIOS S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SACHACA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2389879
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA ECOLOGICA DE INTERCONEXION ENTRE TIO GRANDE ¿ TIO CHICO - PEDRO VILCAPAZA Y PASOS DEL SEÑOR, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2375409
Monto del contrato	S/ 10,120,294.87
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,005,550.00
Cuaderno de obra digital	152 asientos entre 17/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

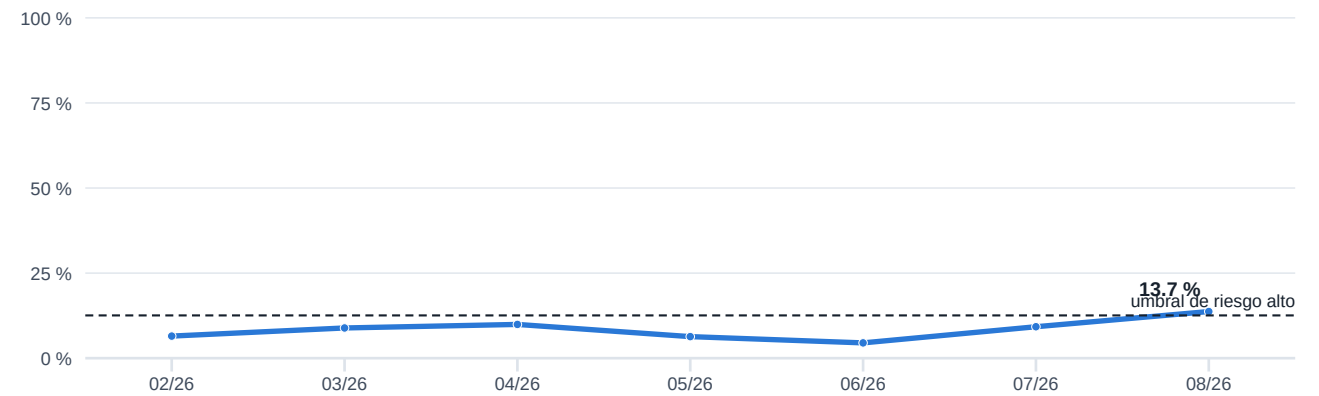

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.555
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.212
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.185
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.125
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.118
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,672,103	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.093
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.084
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.079

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.7 %	12.9 %	-0.8 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.7 %	13.7 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	13.7 %	13.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 150 · Adelantos · SOEC_RESI · 28/08/2026

...riales . por medio del presente se deja constancia que se ha hecho efectivo el deposito de adelanto de materiales solicitado, por tanto, se solicitara las ampliaciones de plazo correspondientes a los atrasos no atribuibles al contratista que afectaron la ruta critica de acuerdo a los procedimientos y plazos que exige la norma.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 149 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...o tanto, se adoptaran las medidas necesarias segun la absolucion de consultas. asi mismo se deja constancia de que se continuara con los tramites de ampliacion de plazo correspondiente a la causal de demora en absolucion de consultas, lo cual provoco retrasos no atribuibles al contratista afectando en la ruta critica

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 144 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

retrasos no atribuibles al contratista por falta de absolucion de consultas . mediante el presente se deja constancia que a la presente fecha no han sido absueltas las consultas formuladas en los asientos 9...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 139 · Adelantos · SOEC_RESI · 17/08/2026

ATRASOS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: Se deja constancia que, con fecha 10 de julio del 2026 mediante carta N°057-2026-CCV-MDS, se solicitó adelanto de materiales en cumplimiento de los plazos establecidos en bases integradas sección 3.15, correspondiente a los materiales de Adoquín de concreto de 0.20x0.10x0.08m f'c=420kg/cm2, cemento portland tipo IP (42.5kg), acero corrugado fy=4200 kg/cm grado 60, a la presente ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 138 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

sobre cambio de residente . el dia de hoy se retomaron las actividades desde el dia viernes 14 de agosto ya que el dia sabado se tomo el feriado correspondienta a la provincia de arequipa.sobre el cambio de la ing. zandra gon...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 139 · Adelantos · SOEC_RESI · 17/08/2026

atrasos no atribuibles al contratista . se deja constancia que, con fecha 10 de julio del 2026 mediante carta n057-2026-ccv-mds, se solicito adelanto de materiales en cumplimiento de los plazos establecido...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 137 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 13/08/2026

CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA: Mediante el presente se deja constancia que, a partir de la presente fecha 13 de agosto del 2026, quien suscribe, Ing. Zandra Gonzáles Galván CIP 162189, ha asumido el rol de residente de obra, de la presente obra. Así mismo se indica que en referencia a lo solicitado por el supervisor de incrementar personal, se deja constancia que a la presente fecha la Entidad no ha otorgado el último ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 137 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 13/08/2026

cambio de residente de obra . mediante el presente se deja constancia que, a partir de la presente fecha 13 de agosto del 2026, quien suscribe, ing. zandra gonzales galvan cip 162189, ha asumido el rol de residente de o...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 92 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 07/07/2026

ACTIVIDADES DE OBRA ENCOFRADO MC-8 IZQUIERDO Y ACLARACION DE CISTERNA: SE INICIA LA JORNADA LABORAL CON LA CHARLA DE CINCO MINUTOS A CARGO DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, SE INDICA QUE SE VIENE REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:1. SE HA INICIADO EL ENCOFRADO DE LA PANTALLA DEL MURO MC-8 LADO IZQUIERDO, SE ESTARÁ PRESENTANDO LOS PROTOCOLOS DEL ENCOFRADO PARA QUE SE PUEDA AUTORIZAR EL VACIADO DE DICHO MURO CON CONC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
