


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de obra proyecto de inversión: "mejoramiento de la vía departamental ruta SM-103, DV. Ruta SM-849 (saposoa) centro poblado el dorado, distrito de saposoa provincia de huallaga - departamento de san martin" CUI: 2571304.

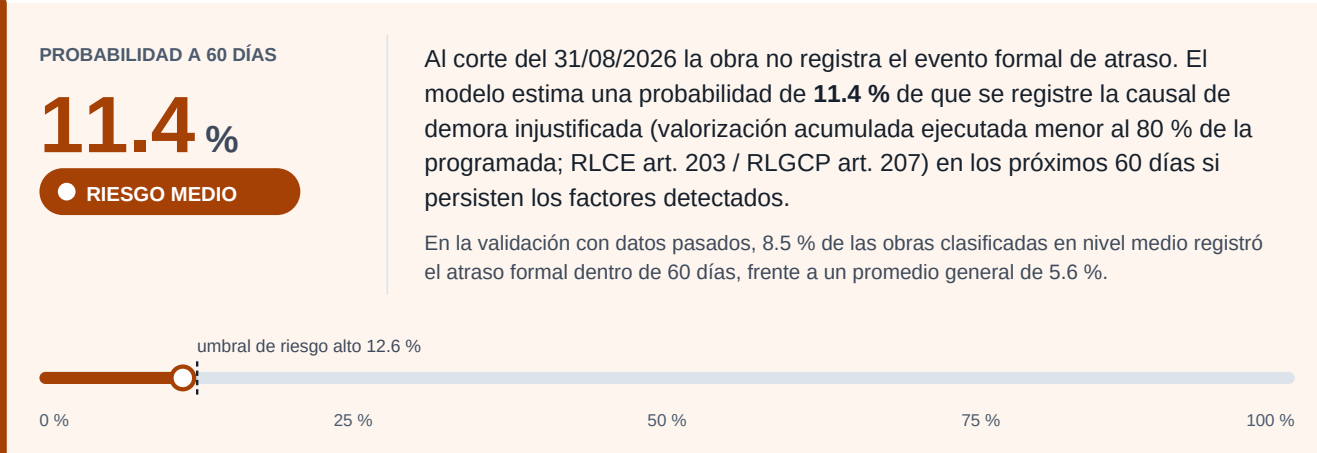


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 56,768,703.32	365 días	753 desde 01/09/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE OBRA PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL RUTA SM-103, DV. RUTA SM-849 (SAPOSOA) CENTRO POBLADO EL DORADO, DISTRITO DE SAPOSOA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI: 2571304.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL
Contratista	CONSORCIO VIAL EL DORADO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAPOSOA / HUALLAGA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2571304
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL RUTA SM-103, DV.RUTA SM-849 (SAPOSOA) - CENTRO POBLADO EL DORADO DISTRITO DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2339944
Monto del contrato	S/ 56,768,703.32
Monto aprobado de la inversión	S/ 21,726,055.04
Cuaderno de obra digital	753 asientos entre 01/09/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

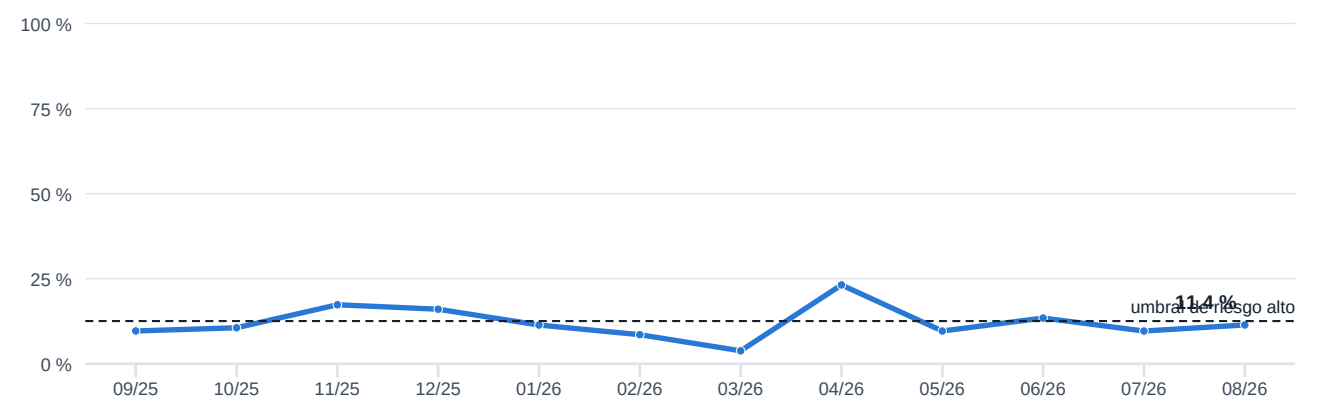

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.461
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.213
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.155
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 4,847,595	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.142
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.123
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.097
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.093

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.4 %	11.0 %	-0.4 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.4 %	11.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 731 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 26/08/2026

...n 32069, ley general de contrataciones publicas, aprobado mediante decreto supremo n 009-2025-ef y modificado por decreto supremo n 001-2026-ef, el contratista puede solicitar ampliacion de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que estas modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento de la solicitud.en ese sentido, la supervision...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 728 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...n de obra vigente, por lo que nuestro plazo de ejecucion contractual se ve afectado, en tal sentido, se deja constancia que continua la causal de ampliacion de plazo, teniendo en consideracion que el atraso en la ejecucion de estas partidas es ajenas a la voluntad del contratista. se adjunta fotografias que evidencian el suelo saturado y presencia de lluvia en la zona de trabajo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 727 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 24/08/2026

AFECCIÓN POR PRECIPITACIONES PLUVIALES Y VERIFICACIÓN DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: ... CONTINÚA DEL ASIENTO ANTERIORLA INCIDENCIA DE DICHA SITUACIÓN SOBRE LA RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE.POR LO TANTO, LA SUPERVISIÓN TOMA CONOCIMIENTO DEL INICIO DE LA CAUSAL INVOCADA POR EL CONTRATISTA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL RECONOCIMIENTO NI LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO, QUEDANDO SU PROCEDENCIA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 726 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 24/08/2026

...taciones publicas, aprobado mediante decreto supremo n 009-2025-ef y modificado por decreto supremo n 001-2026-ef, en las obras, el contratista puede solicitar la ampliacion del plazo contractual por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que estas modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento de la solicitud.en ese sentido, la sola ocurre...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 724 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

... de plazo siempre que la causal modifique la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento de la solicitud, cumpliendose asi la siguiente causal mencionada en articulo 198.1 inciso a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, de la ley de contrataciones del estado, ley n32069, razon por la cual se deja anotado el inicio de la causal de ampliacion de plazo, por...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 689 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

RECOMENDACIÓN SOBRE ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES (CEMENTO, TMC Y ACERO): Por medio del presente asiento, la Supervisión deja constancia de las observaciones realizadas durante el recorrido de inspección en campo respecto a la gestión, almacenamiento y acopio de los materiales, emitiendo las siguientes recomendaciones al Contratista Residencia de Obra a fin de garantizar la calidad de los insumos y el cumplim...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 665 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 656 - MAYOR METRADO DE OBRA N° 02: En relación a lo anotado por el Residente de Obra en el Asiento N° 656, donde comunica la presentación del informe técnico (CARTA N° 061-2026-VABM-RC/CVED) sobre mayores metrados en las partidas 07.03 y 07.04, se instruye al contratista a revisar el procedimiento establecido en el Artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 32069.Al respecto, se precisa lo sigui...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 605 · Órdenes · SOEC_SPV · 16/06/2026**

OBSERVACIONES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 16 JUNIO 2026: Por este medio se comunica al contratista levantar las observaciones que se indica, que viene ocurriendo durante el proceso constructivo, del cual se indica: Km 1+423 Limpiar y señalizar para la entrada y salida de alcantarilla TMCKm 2+260 Limpiar y señalizar para la entrada y salida de alcantarilla TMCKm 4+320 Señalizar, riesgo de desprendimiento de roca en tal...

Fuente: cod-asientos202606.csv
- Asiento N.º 575 · Órdenes · SOEC_SPV · 04/06/2026**

OBSERVACIONES POR FALTA DE ENCAUZAMIENTO DE ALCANT TMC: En la fecha, luego de un monitoreo a las alcantarillas colocadas, en su totalidad. Se observa que éstas requieren su encauzamiento, por cuanto se ordena al Residente encauzar las alcantarillas en la entrada y salida, así como las cunetas que entregan el drenaje hacia ellas. Asimismo, la excavación donde se fundarán los cabezales, no fue necesario realizarlas, deb...

Fuente: cod-asientos202606.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
