


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion del componente i y ii del proyecto ioarr: "adquisición de equipo de rayos x digital, construcción de laboratorio y área de desinfección, remodelación de ambiente de dispensación y expendio, además de otros activos en el(la) eess habana - habana en la localidad habana, distrito de habana, provincia moyobamba, departamento san martin¿ con CUI N°2540767

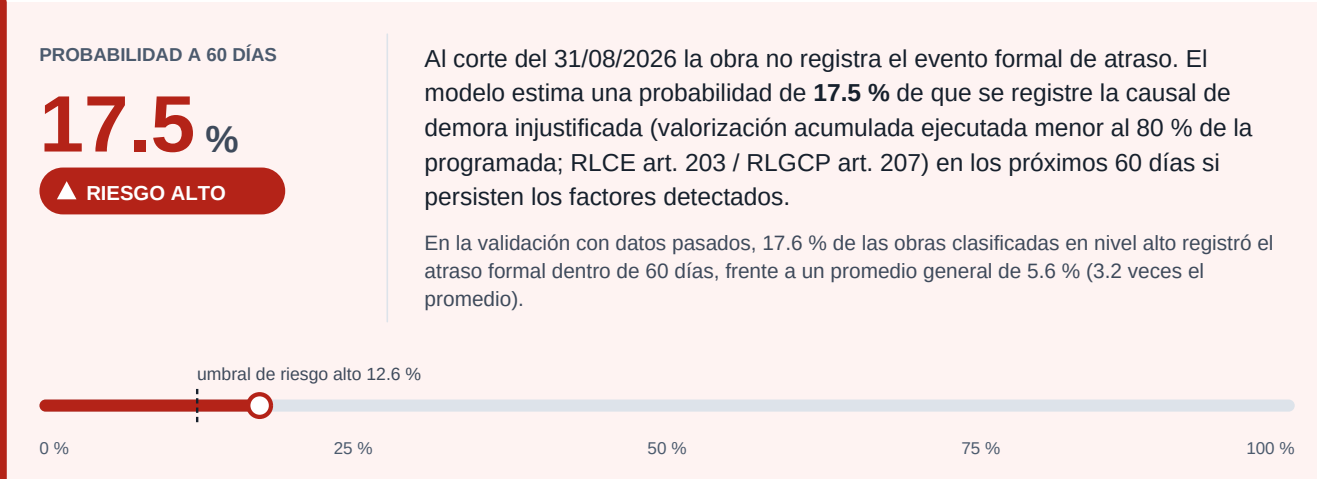

|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 133<br>desde 16/06/2026 | 31/08/2026     |


01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE I Y II DEL PROYECTO IOARR: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y ÁREA DE DESINFECCIÓN, REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE DISPENSACIÓN Y EXPENDIO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HABANA - HABANA EN LA LOCALIDAD HABANA, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ CON CUI N°2540767 |
| Entidad contratante                             | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Sede Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contratista                                     | CONSORCIO EJECUTOR CHAMIKIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | HABANA / MOYOBAMBA / SAN MARTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2540767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inversión asociada                              | ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y AREA DE DESINFECCION REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HABANA - HABANA EN LA LOCALIDAD HABANA, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN                                                                                                 |
| Función                                         | SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2396855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Monto aprobado de la inversión | S/ 3,988,314.25                            |
| Cuaderno de obra digital       | 133 asientos entre 16/06/2026 y 31/08/2026 |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

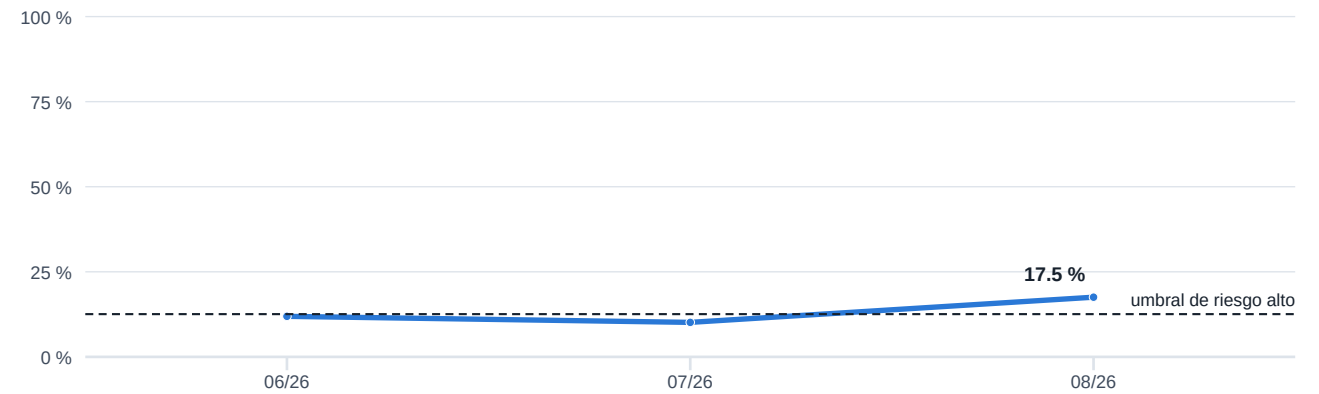

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.515 |
| El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.222 |
| El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.206 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.115 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)                     | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.097 |
| Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes                                                    | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.077 |
| El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.077 |
| El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.065 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes | 17.5 % | 17.5 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 130 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 31/08/2026

... tabiquería, falso cielorraso, puertas y ventanas forman parte de la secuencia constructiva y se encuentran vinculados a la ruta crítica del calendario de avance de obra valorizado (caov) vigente. la demora en la entrega de dicha documentación técnica impide el normal desarrollo de los frentes de trabajo, lo cual viene generando restricciones y podría configurar causal de ampliación de plazo, de conform...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 123 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 28/08/2026

...a omisión y no adjunción de los referidos planos de detalle en la comunicación electrónica remitida. en tal sentido, y a fin de salvaguardar la correcta ejecución técnica y evitar incompatibilidades o retrasos en la programación de los trabajos correspondientes, se solicita a la entidad remitir a la brevedad los planos y laminas de detalle técnico omitidos, debidamente suscritos por la proyectista/especi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 118 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 27/08/2026

...ca del cronograma de ejecución vigente, impidiendo la oportuna adquisición de materiales, habilitación en taller e instalación en obra de las partidas involucradas. en tal sentido, se advierte que la demora en la entrega de esta información técnica viene comprometiendo el plazo contractual, configurándose una causal no atribuible al contratista que podría dar lugar a futuras solicitudes de ampliación de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 117 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 27/08/2026

...ca del cronograma de ejecución vigente, impidiendo la oportuna adquisición de materiales, habilitación en taller e instalación en obra de las partidas involucradas. en tal sentido, se advierte que la demora en la entrega de esta información técnica viene comprometiendo el plazo contractual, configurándose una causal no atribuible al contratista que podría dar lugar a futuras solicitudes de ampliación de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 110 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 25/08/2026

...sido requeridos de manera oportuna tanto por el contratista como por el supervisor. 4.- es preciso señalar que, la demora de la entidad, en la entrega de lo solicitado, viene generando actualmente el incumplimiento de la ejecución de ciertas partidas conforme a lo establecido en el programa de ejecución de obra vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 107 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 21/08/2026

REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL CONTRATISTA (REITERACIÓN): 1.- El día de hoy, se ha remitido al contratista los siguientes documentos:- CARTA N°034-2026-FRAO-CO-EESSH, mediante la cual se solicita, de manera reiterada, la presentación de las fichas técnicas de la especialidad de comunicaciones, lo cual fue requerido inicialmente por el supervisor por medio de la CARTA N°020-2026-FRAO-CO-EESSH (de fecha 28 de julio de 2026)...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 103 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 20/08/2026

...a 23/06/2026), habiendo transcurrido, hasta la fecha actual, un periodo de cincuenta y ocho (58) días calendario sin que se tenga respuesta alguna de la entidad al respecto. es preciso señalar que, el incumplimiento de la entidad, en la entrega oportuna de dichos planos, viene ocasionando actualmente el atraso en la ejecución de ciertas partidas, que de persistir la demora, podría ocasionar, en cualquier ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 97 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 17/08/2026

...anzado los planos de detalles solicitados, generando actualmente esta demora, de la entrega de la información, el atraso en la ejecución de las partidas correspondientes a puertas y falso cielorraso, incumpliendo el inicio de dichas actividades conforme a lo establecido en el programa de ejecución de obra vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 28/07/2026

REMISIÓN DE DOCUMENTOS: 1.- El día de hoy, se ha remitido al contratista los siguientes documentos:- CARTA N°019-2026-FRAO-CO-EESSH, mediante la cual se comunica las observaciones formuladas a las fichas técnicas del equipamiento médico, presentadas por el contratista a través de la CARTA N°022-2026-CONSORCIO HORCON/RC (de fecha 20/07/2026).- CARTA N°020-2026-FRAO-CO-EESSH, mediante la cual se solicita la presentació...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
