


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en AV. Villa del mar mz E5, F5, G5, calle pescadores MZ. J5, K5, I5, H5, jr, miramar y JR. 28 de julio distrito de coishco de la provincia del santa del departamento de ancash, con CUI 2630374

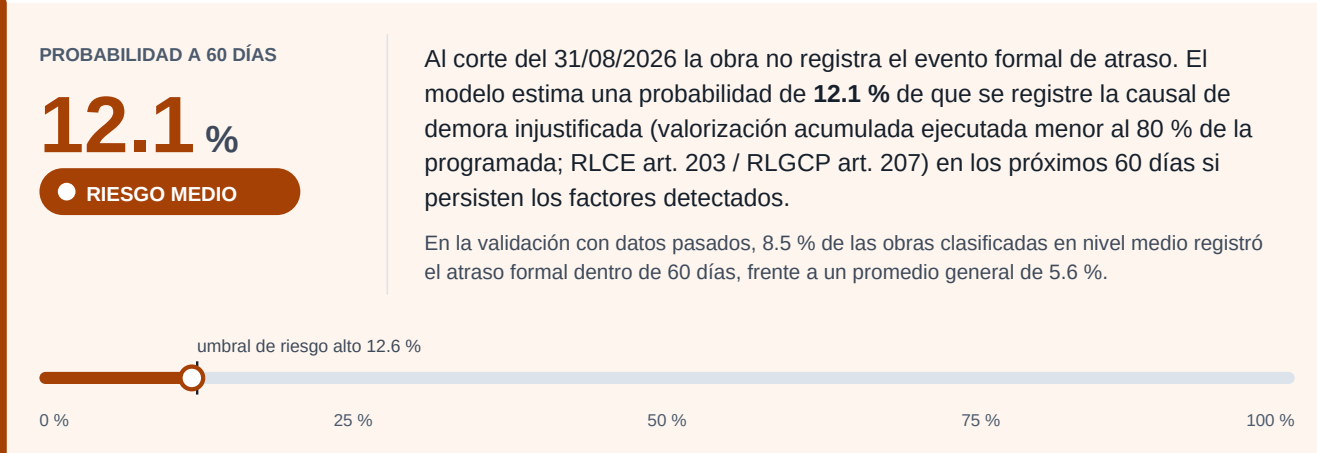


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 8,379,706.41	240 días	184 desde 20/12/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. VILLA DEL MAR MZ E5, F5, G5, CALLE PESCADORES MZ. J5, K5, I5, H5, JR, MIRAMAR Y JR. 28 DE JULIO DISTRITO DE COISHCO DE LA PROVINCIA DEL SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2630374
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO
Contratista	CONSORCIO DASSO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	COISHCO / SANTA / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2630374
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV VILLA DEL MAR, MZ E5,F5,G5, CALLE PESCADORES MZ. J5,K5,I5,H5, JR. MIRAMAR Y JR. 28 DE JULIO DISTRITO DE COISHCO DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2364019
Monto del contrato	S/ 8,379,706.41
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,441,399.78
Cuaderno de obra digital	184 asientos entre 20/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

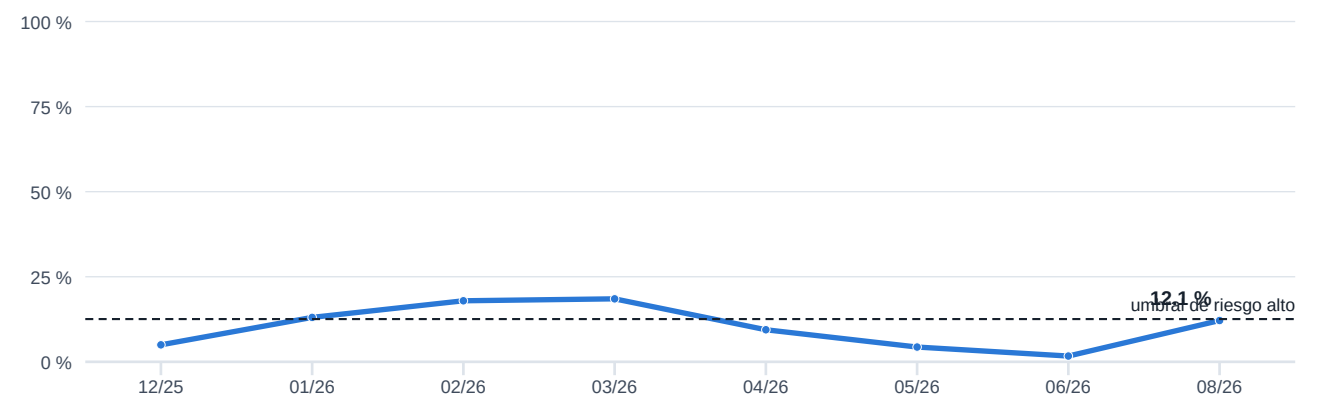

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.570
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.217
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.193
6 asientos de calendario de avance valorizado desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092
Según el último avance declarado en el cuaderno, se ejecutó el 139 % de lo programado	Avance declarado en el cuaderno		-0.076
Hubo registros en el cuaderno 15 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.075
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.065

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.1 %	12.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 180 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

... calle miramar son de transito pesado y danaría el pavimento rigido por lo que se solicita a la supervision las coordinaciones con la entidad para su pronunciamiento correspondiente y evitar posibles atrasos no atribuibles al contratista ya que dicha obra tiene como finalidad mejorar el transito pesado y peatonal de las personas aledanas

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

REITERA INCREMENTE Y/O HABILITE MAYORES FRENDES DE TRABAJO: Se reitera al Residente de Obra que deberá INCREMENTAR Y/O HABILITAR MAYORES FRENDES DE TRABAJO, disponiendo de manera oportuna los recursos necesarios de personal, equipos, materiales y herramientas, a fin de garantizar la continuidad y el normal desarrollo de las actividades programadas. Asimismo, deberá implementar una adecuada planificación y distribución...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 172 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

ausencia del residente de obra durante la visita de supervision y gerencia de infraestructura de la entidad . se deja constancia que, durante la visita de la supervision y la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

... adecuada planificacion y distribucion de los recursos en los diferentes sectores de intervencion, priorizando las actividades que forman parte de la ruta critica y/o aquellas que presenten riesgo de atraso, evitando la concentracion de recursos en un solo frente de trabajo. se formula de manera reiterativa, debido a la necesidad de mantener un ritmo de ejecucion acorde con el calendario de obra vigente...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 170 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

INCREMENTE Y/O HABILITE MAYORES FRENDES DE TRABAJO: De la verificación efectuada al avance de los trabajos y considerando la programación vigente de la obra, se advierte la necesidad de que el Contratista INCREMENTE Y/O HABILITE MAYORES FRENDES DE TRABAJO, así como disponga oportunamente de mayores recursos de personal, equipos, materiales y herramientas, de corresponder, con la finalidad de mantener el ritmo de ejec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 170 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...cucion previsto y cumplir con las metas programadas. en tal sentido, se requiere al contratista adoptar las medidas de caracter tecnico y operativo que resulten necesarias para evitar la generacion de atrasos y/o desviaciones respecto del calendario de ejecucion vigente, asimismo, debiera efectuarse una adecuada planificacion y coordinacion de los diferentes frentes de trabajo, garantizando que la ejecuc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 164 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE OBRA: En atención a lo señalado por el Residente de Obra en el Asiento N.º 163 y a la documentación presentada por el Contratista mediante Carta CONSORCIO COISHCO, de fecha 13 de agosto de 2026, respecto a la actualización del Calendario de Obra Aprobado Vigente, se deja constancia de que la Supervisión de Obra ha recibido la documentación para su correspondiente revisión y evaluación ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 129 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 25/03/2026

APROBACION DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y ACTUALIZADO POSTA AMPLIACION DE PLAZO 05: SE INFORMA AL INSPECTOR DE OBRA QUE EN LA FECHA SE RECEPCIONO CARTA MULTIPLE N° 120-2026-MDNCH – GEIN - SGOPU/JCCQ, de fecha 23/03/2026 mediante la cual se aprueba el calendario de avance de obra actualizados post ampliación de plazo 05 prorrogado desde el día 29/01/2026 al 01/03/2026, tramite iniciado por el contratista...

Fuente: cod-asientos202603.csv

Asiento N.º 103 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 09/03/2026

SUSTENTO DE ATRASO EN EL PERIODO DE FEBRERO CAUSAL NO ATRIBUINLE AL CONTRATISTA: 1. En atención al asiento 96 respecto al ATRASO del avance ejecutado acumulado, en un 6.86%, a la fecha se encuentra en trámite de absolución consulta N°4 PAVIMENTO RIGIDO, debido a la consulta N°02 que se absolvió parcialmente siendo su absolución NO OBJETIVA NI TECNICAMENTE VIABLE PARA SU EJECUCION por ello se remite al supervisor de ...

Fuente: cod-asientos202603.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
