


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Creación del servicio de movilidad urbana en c.p francisco bolognesi distrito de chancay de la provincia de huaral del departamento de lima, con CUI N° 2680902.

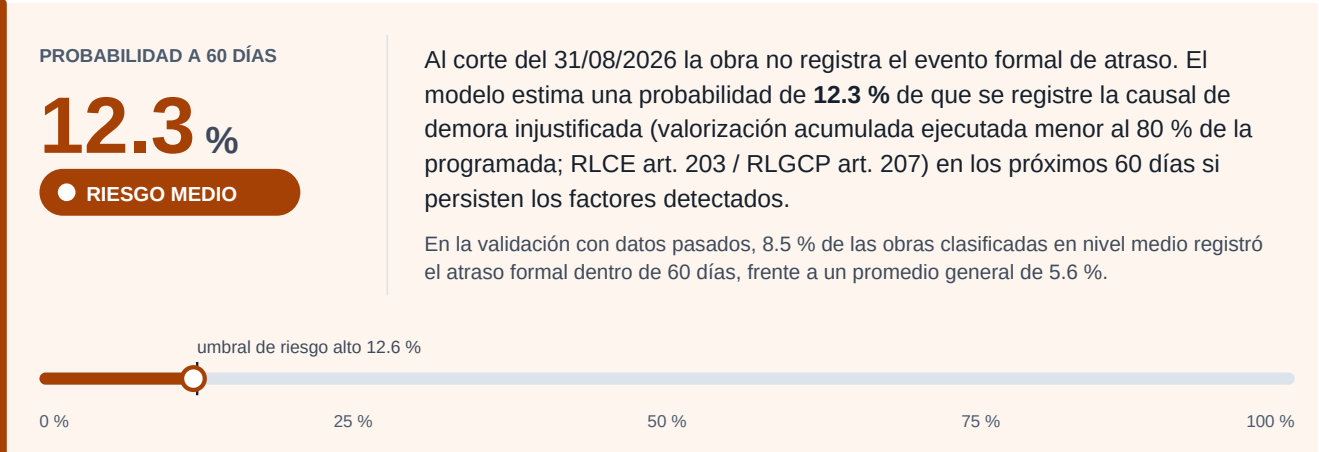


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	134 desde 30/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN C.P FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHANCAY DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2680902.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY - HUARAL
Contratista	CONSORCIO HUANDARO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHANCAY / HUARAL / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2680902
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN C.P FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHANCAY DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2403863
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 955,066.49
Cuaderno de obra digital	134 asientos entre 30/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

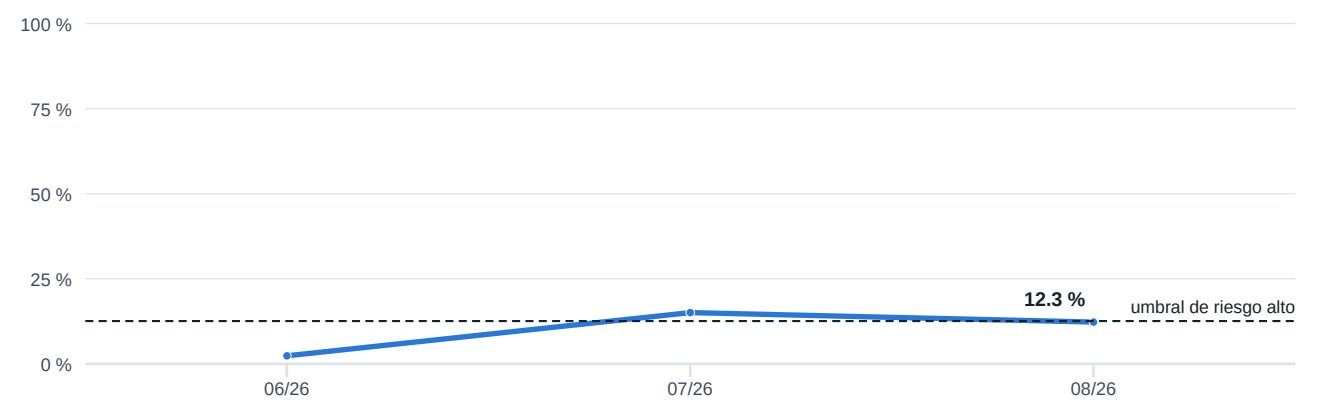

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.442
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.167
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.121
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.094
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.090
71 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.066
Entidad contratante: municipalidad distrital	Características de la obra		-0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.3 %	12.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026

VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS: EN LA FECHA, EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA, SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE HAN VERIFICADO TRABAJOS DE EJECUCIÓN EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EVIDENCIÁNDOSE LA AUSENCIA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DURANTE LA JORNADA. EN TAL SENTIDO, SE RECUERDA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE COMPUTA EN DÍAS CALENDARIO, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER Y ADOPTAR LAS MEDI...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026

...ejecucion de la obra se computa en días calendario, por lo que el contratista debera prever y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del cronograma de obra aprobado. cualquier retraso en los plazos contractuales establecidos sera de su exclusiva responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 42 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

...cuencia, el contratista debera adoptar las medidas tecnicas y operativas necesarias para optimizar los rendimientos y garantizar el cumplimiento del cronograma contractual, precisandose que cualquier atraso o menor rendimiento imputable a la organizacion, recursos, equipos o personal a cargo del contratista sera de su exclusiva responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 39 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/07/2026

...nacion de material excedente, no se ejecuto durante la presente jornada, las cuales son necesarias para la continuidad de los trabajos. por lo expuesto, esta supervision deja constancia que cualquier retraso, afectacion al cronograma de ejecucion de obra o consecuencia derivada de la falta de continuidad y no ejecucion oportuna de las partidas sera de responsabilidad del contratista, en tanto dicha situ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 27 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 13/07/2026

... fecha, se deja constancia que no se han ejecutado trabajos de campo, habiendose desarrollado unicamente labores de gabinete, sin evidenciarse avances fisicos en la obra. en ese sentido, de generarse atrasos o incumplimiento del cronograma de avance de obra programado, la responsabilidad recaera en el contratista. asimismo, respecto a los informes vinculados a las consultas efectuadas por el contratista...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 22 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026

VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: EL DIA DE HOY SOLO SE HAN VERIFICADO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PARTIDA DE LIMPIEZA MANUAL EN OBRA , LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD , INICIANDO EL DIA CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD. SE RECARGA AL CONTRATISTA QUE CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2026 SE TENIA PROGRAMADO EL INICIO Y FINALIZACION DE LA PARTIDA DE ELIMINACION, DE IGUAL FORMA LA PARTIDA DE DE...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/07/2026

VERIFICACION DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS: EL DIA DE HOY 04/07/2026, SE VERIFICÓ LA CONTINUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONTINUA LA DEMOLICIÓN (1.01.02.02 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y VEREDAS EXISTENTES, ESPESOR 4" C/MAQUINARIAS, DESMONTAJE, REMOCIONES. ASIMISMO, SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TRAZO Y REPLANTEO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN, EFECTUÁNDOSE EL MARCADO DE LOS EJES, ALINEAMIENTOS Y NIVELES DE REFER...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
