


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución del saldo de obra del proyecto de inversión: Construcción y equipamiento de la sede del ministerio publico en el distrito judicial cañete en el marco del nuevo código procesal penal

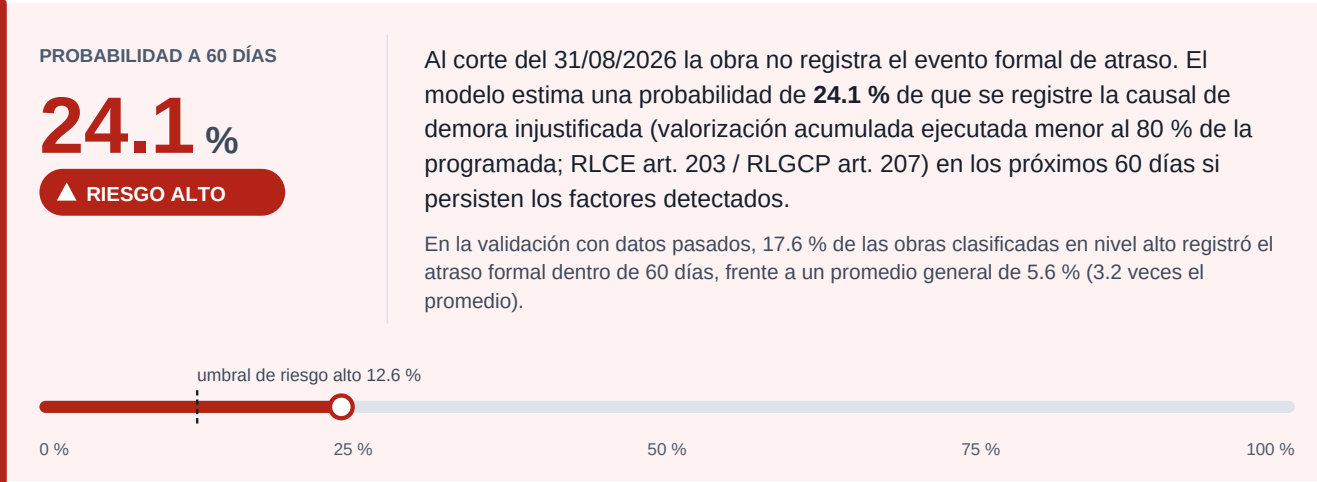


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	650 desde 24/07/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO JUDICIAL CAÑETE EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Entidad contratante	MINISTERIO PUBLICO
Contratista	CONSORCIO PORFISA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN VICENTE DE CAÑETE / CAÑETE / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2335842
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	650 asientos entre 24/07/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

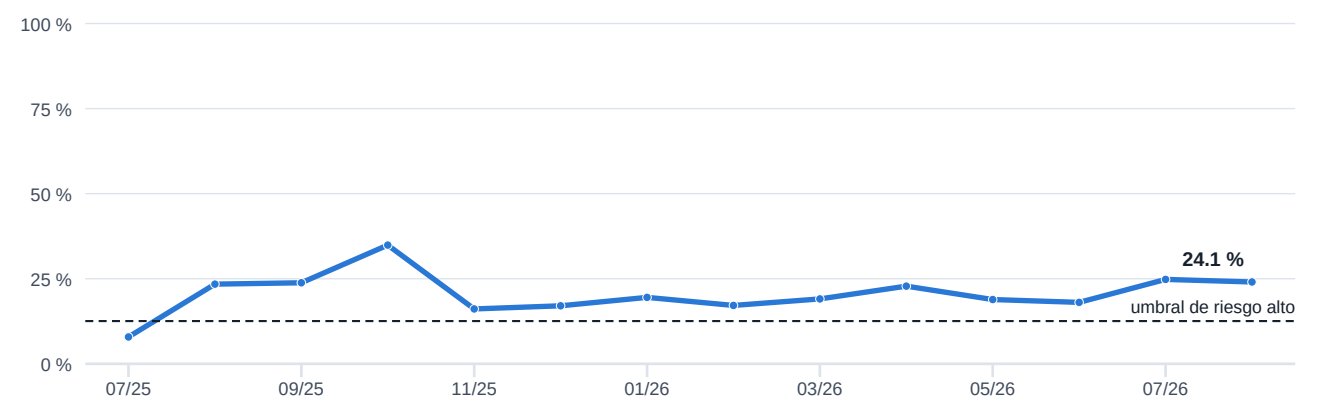

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (14 cortes, del 31/07/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.601
El 62 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.317
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.232
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.186
8 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.080
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.074

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	24.1 %	24.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 645 · Órdenes · SOEC_SPV · 26/08/2026

ORDENES DE INCREMENTAR EL PERSONAL EN OBRA E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ARMADO Y USO DE ANDAMIOS: 1. El día de hoy se encuentran trabajando en obra 46 trabajadores, se advierte que el número de trabajadores que ejecutan los trabajos, no son los suficientes para ejecutar las obras de acuerdo al Programa de Ejecución de obra vigente. Por lo expuesto, se ordena al contratista que incremente el personal en obr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 641 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 24/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA N° 14 SISTEMA DE AISLAMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO: Mediante la presente anotación se comunica al Contratista que, con fecha 24 de agosto del 2026, la Entidad remitió a la Supervisión de Obra, la Carta N° 000067-2026-MP-FN-GG-OGINVER, mediante la cual comunica que, la Entidad ha emitido la Absolución de la Consulta de Obra N.º 14 – Base de apoyo y Sistema de Aislamiento del Grupo Electrónico, rela...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 640 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...de avance establecido en el programa de ejecución de obra vigente. se indica al contratista que, debe incrementar el personal en obra, para poder ejecutar los trabajos programados, y evitar riesgos de atrasos en función del avance programado para el periodo y acumulado. b) respecto a la anotación hecha por la residencia en asiento n 639, se menciona la siguiente: 1. se verifica el vaciado de contrapisos d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 635 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN: Con fecha 25 de julio del 2026, mediante Carta N° 018-2026/YMGB-RESIDENTE, la Residencia de obra presenta a la Supervisión el Plan de Recuperación y Mitigación operativa de 4 semanas, considerando una programación de trabajos desde el 27 de julio del 2026 al 23 de agosto del 2026. En el Anexo 1 de dicho Plan, se establece una dotación promedio de 70 ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 634 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

ORDEN AL CONTRATISTA DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRA: El día de hoy, se evidencian trabajos en la parte de la azotea correspondientes al vaciado de columnas, con exposición a riesgo de caída a diferente nivel. Por lo expuesto, se ordena al Contratista implementar las medidas de prevención y protección correspondientes antes de continuar con los trabajos, conforme a los artículos 49 y 50 de la Ley N.º 2978...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 614 · Órdenes · SOEC_SPV · 11/08/2026

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN: Con fecha 25 de julio del 2026, mediante Carta N° 018-2026/YMGB-RESIDENTE, la Residencia de obra presenta a la Supervisión el Plan de Recuperación y Mitigación operativa de 4 semanas, considerando una programación de trabajos desde el 27 de julio del 2026 al 23 de agosto del 2026. En el Anexo 1 de dicho Plan, se establece una dotación promedio de 70 ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 610 · Órdenes · SOEC_SPV · 07/08/2026

ORDEN A LA RESIDENCIA DE REPONER LA BARANDA DE PROTECCIÓN COLECTIVA UBICADA EN EL TERCER NIVEL: De la verificación de los trabajos que se vienen ejecutando en obra, hoy 07 de agosto del 2026, a la 11: 00 de la mañana, se evidencia que las barandas de protección colectiva ubicadas en el Pasadizo del tercer nivel han sido retiradas, sin autorización expresa de la Supervisión de Obra, dejando el borde expuesto y sin nin...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 604 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026**

... amarre en el cuarto nivel.se indica al contratista que debe incrementar el ritmo de avance en la ejecucion del encofrado y vaciado de concreto en viguetas de amarre del cuarto nivel, para no generar atrasos en obra.8. se verifica la ejecucion de encimado de albanileria de ladrillo en muros del cuarto nivel.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 559 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/07/2026**

...cando las acciones a realizar y principalmente los tiempos que demandaran cada actividad, para asegurar que los trabajos se ejecuten dentro del plazo previsto, minimizando el riesgo de que se generen atrasos injustificados.4. por lo expuesto anteriormente se reitera al contratista que presente oportunamente el cronograma detallado solicitado.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
