


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto: Creación del Malecón Norte y Sur en le Frontera Perú ¿ Ecuador, distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Región Tumbes¿ - CUI N° 2288094

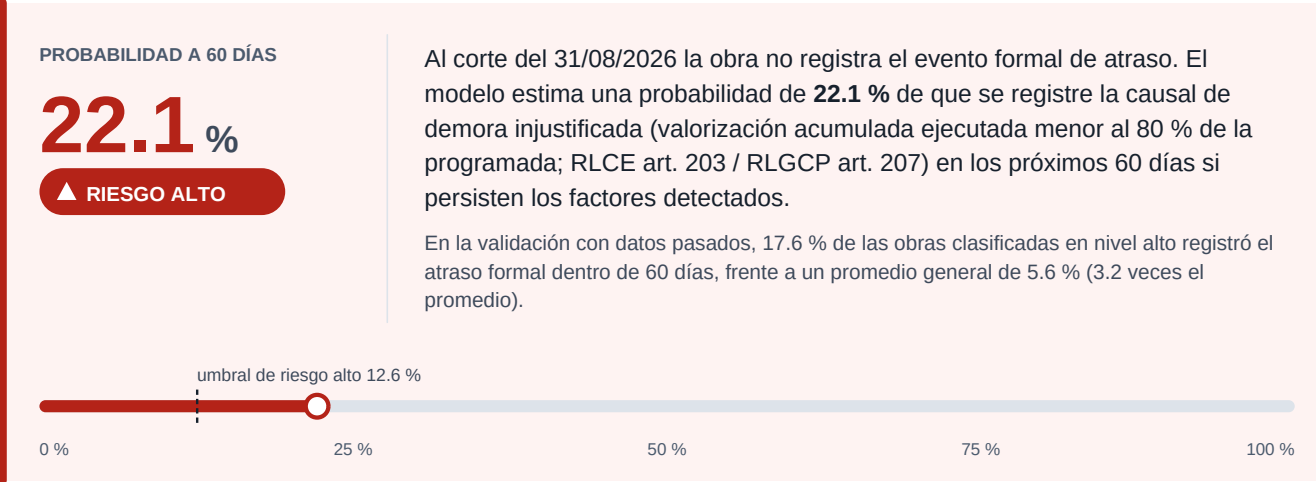


|                    |                |                        |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO  | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 21,582,092.47   | 350 días       | 52<br>desde 07/08/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto: Creación del Malecón Norte y Sur en le Frontera Perú ¿ Ecuador, distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Región Tumbes¿ - CUI N° 2288094 |
| Entidad contratante                             | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - Administración General                                                                                                                                            |
| Contratista                                     | CONSORCIO SOL                                                                                                                                                                                                          |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | AGUAS VERDES / ZARUMILLA / TUMBES                                                                                                                                                                                      |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2288094                                                                                                                                                                                                                |
| Inversión asociada                              | CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES                                                                                        |
| Función                                         | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                                                                                                                                                                                           |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2357209                                                                                                                                                                                                                |
| Monto del contrato                              | S/ 21,582,092.47                                                                                                                                                                                                       |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 14,126,071.00                                                                                                                                                                                                       |
| Cuaderno de obra digital                        | 52 asientos entre 07/08/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                              |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

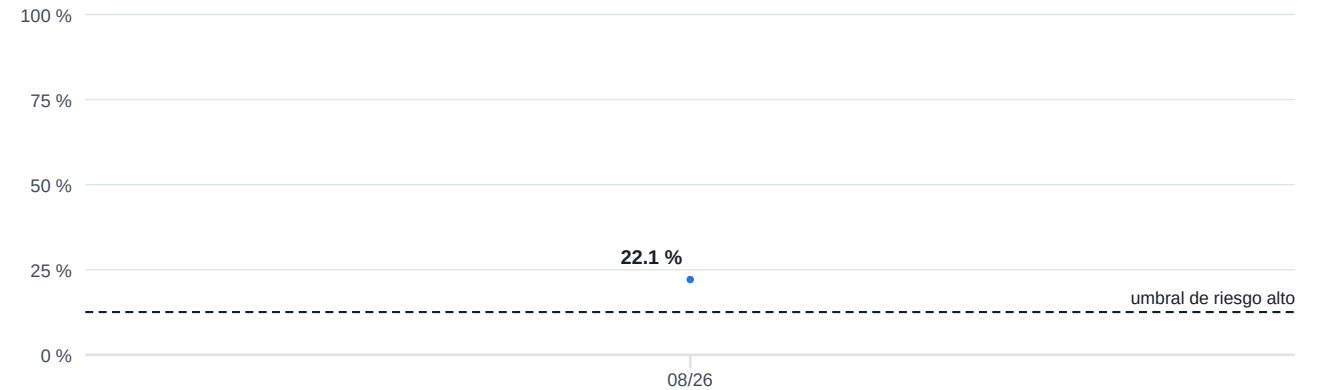

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.530 |
| El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.238 |
| El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                         | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.238 |
| El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal                       | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.205 |
| Faltan 58 días para el fin del plazo original                                                           | Datos del contrato             | <div></div>    | +0.167 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.110 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)                     | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.105 |
| Extensión media de los asientos recientes: 1,297 caracteres                                             | Contenido de los asientos      | <div></div>    | -0.086 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 22.1 % | 21.5 %    | -0.6 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 47 · Entregables · SOEC\_SPV · 28/08/2026

...orme.2. notificar que el retraso en la subsanacion del bep/plan de trabajo y la falta de actualizacion de modelos bim en el entorno comun de datos (cde) dara inicio a la aplicacion acumulativa de las penalidades de 0.20 uit por dia de retraso (por el plan de trabajo/bep) y 0.10 uit por dia de retraso (por los modelos del eir).

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 47 · Entregables · SOEC\_SPV · 28/08/2026

...ra evitar contingencias, la realizacion de las scc es un requisito contractual obligatorio. en tal sentido:1. requerir formalmente mediante anotacion en cuaderno de obra e informe.2. notificar que el retraso en la subsanacion del bep/plan de trabajo y la falta de actualizacion de modelos bim en el entorno comun de datos (cde) dara inicio a la aplicacion acumulativa de las penalidades de 0.20 uit por dia...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 19/08/2026

...uenta con facultad para intervenir directamente sobre dicha infraestructura.se deja constancia de la continuidad de esta afectacion para conocimiento y seguimiento de la supervision, pudiendo generar atrasos en las actividades programadas de mantenerse la condicion descrita.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 27 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 18/08/2026

... (7) dias contados desde el dia siguiente de recibida la documentacion, plazo que vencio hoy 18 de agosto de 2026. a la fecha, la entidad no ha efectuado la transferencia al patrimonio fideicometido, incumpliendo el citado numeral 181.2 y el numeral 184.3 del articulo 184 del reglamento de la ley n 30225. la circunstancia se iniciara el 19 de agosto de 2026 y se mantiene en curso, sin fecha prevista de c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 28 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 18/08/2026

INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE TRANSFERENCIA DEL ADELANTO DIRECTO VÍA FIDEICOMISO: 4. Le siguen en ruta crítica, con inicio inmediato posterior: Partida 1.2.1.1.5.2. Demolición de muro de concreto — Zona 2 (inicio: 24/08/2026), Partida 1.2.1.1.5.1. Demoliciones masivas para piso de concreto — Zona 2 (inicio: 31/08/2026), Partida 1.1.1.1.5.2. Demolición de muro de concreto — Zona 1 (inicio: 07/09...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 28 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 18/08/2026

...responde a la materializacion del riesgo r-16 del estudio de evaluacion de riesgos y vulnerabilidad aprobado, referido a la afectacion del cronograma y del flujo de caja del contratista ejecutor por retrasos en los pagos, cuya asignacion es compartida entre la entidad y el contratista ejecutor: consorcio sol. 76. el contratista ejecutor: consorcio sol continua la ejecucion con recursos propios en resgua...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 17/08/2026

...odria encontrarse asociado a una fuga o rotura de tuberia ubicada fuera del area de intervencion contractual, sobre la cual el contratista no cuenta con autorizacion para intervenir, pudiendo generar atrasos a la normal ejecucion de los trabajos por razones ajenas a la voluntad del contratista.agradecere su verificacion y esperamos sus instrucciones.

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 19 · Administración de riesgos · SOEC\_SPV · 13/08/2026

...ontingencia presentado es generico y no dimensiona equipos de bombeo ni establece umbrales de alerta.2. riesgos de patrimonio cultural (arqueologia): se identifica la materializacion de un riesgo por incumplimiento procedimental. se ha constatado la ejecucion de movimiento de tierras y excavaciones en la zona sur sin la presencia inicial del arqueologo responsable del contratista. esta omision contravien...

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 20 · Administración de riesgos · SOEC\_SPV · 13/08/2026**

*...: se ha verificado el inicio de las partidas de demolicion y excavacion, la generacion de material particulado (polvo) en exceso debido a la circulacion de volquetes sin el regado preventivo de vias, incumpliendo las medidas de mitigacion del plan de manejo ambiental. asi mismo, si bien existe la designacion del responsable de gestion social en respuesta ante posibles conflictos con los comerciantes de l...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 11/08/2026**

*VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ASIENTO N°14: SE VERIFICA EL INICIO DE LAS PARTIDAS DESCRITAS POR EL RESIDENTE EN EL ASIENTO N°14, SIN EMBARGO, LA EJECUCIÓN DE LA 02.02.01.01.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE/MATERIAL SUELTO C/EQUIPO DEMANDA LA PRESENCIA URGENTE DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN CAMPO. EN TAL SENTIDO, SE HA CURSADO LA CARTA N°005-2026/EAVHR/SO/DONEDUARDOHJ/SAC A FIN DE QU...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 10 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 10/08/2026**

*INICIO DE DEMOLICION DE LOSA, ZONA SUR: Se hace de conocimiento a la Supervisión, que se colocó cintas de seguridad a lo largo del cerco que fue sustraído por manos ajenas, sobre la calle San Francisco. Habiendo procedido a los trabajos de trazo. nivelación y replanteo, en la fecha iniciamos la demolición de la losa de la calle San Francisco, para lo cual estamos utilizando una excavadora marca CAT, CCH-EXC-002 para...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 11 · Participación del personal clave · SOEC\_SPV · 10/08/2026**

*procedencia de cambio de supervisor de obra . mediante carta no1554-2026-vivienda/sg-oga-oacp del 07 de agosto del 2026, luego de la evaluacion tecnica del cambio de personal clave (supervisor de obra), presentado por don eduardo h.j. s.a.c., para la supervision de la elaboracion del expediente tecnico y supervision de la ejecucion de obra del proyecto creacion del maleco...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
