


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de obras por paquete de los proyectos de saneamiento de agua potable y alcantarillado a nivel de la provincia de trujillo,con CUI N°2686702,CUI N°2666745 y CUI N°26932770

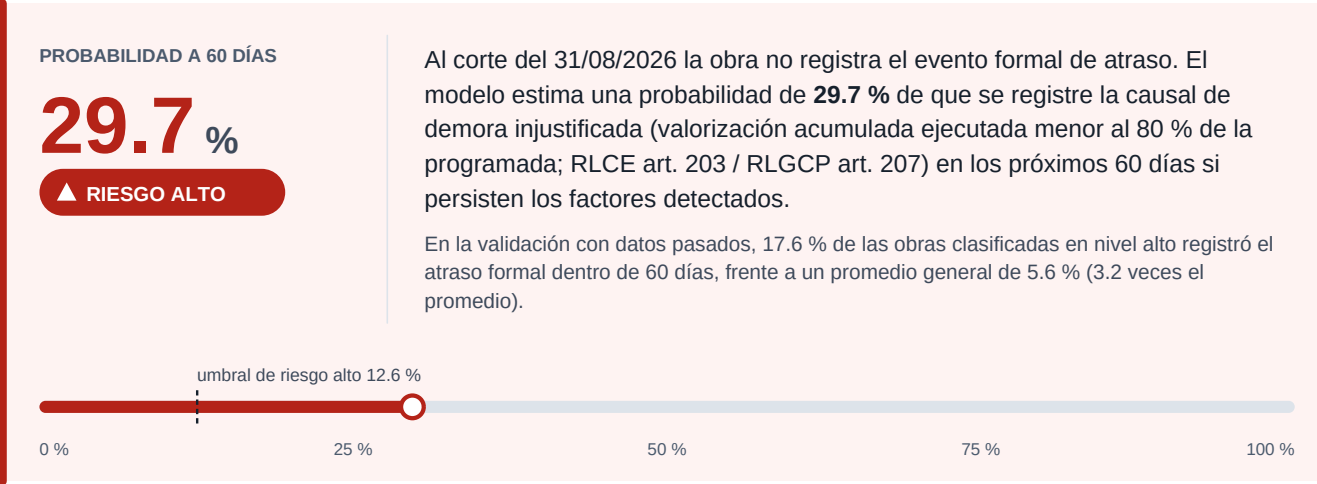


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	49 desde 31/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A NIVEL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,CON CUI N°2686702,CUI N°2666745 Y CUI N°26932770
Entidad contratante	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD
Contratista	CONSORCIO OBRAS TEINGECON
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2686702
Inversión asociada	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE LOS INCAS CDRA.5 - DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2411743
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 404,188.52
Cuaderno de obra digital	49 asientos entre 31/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

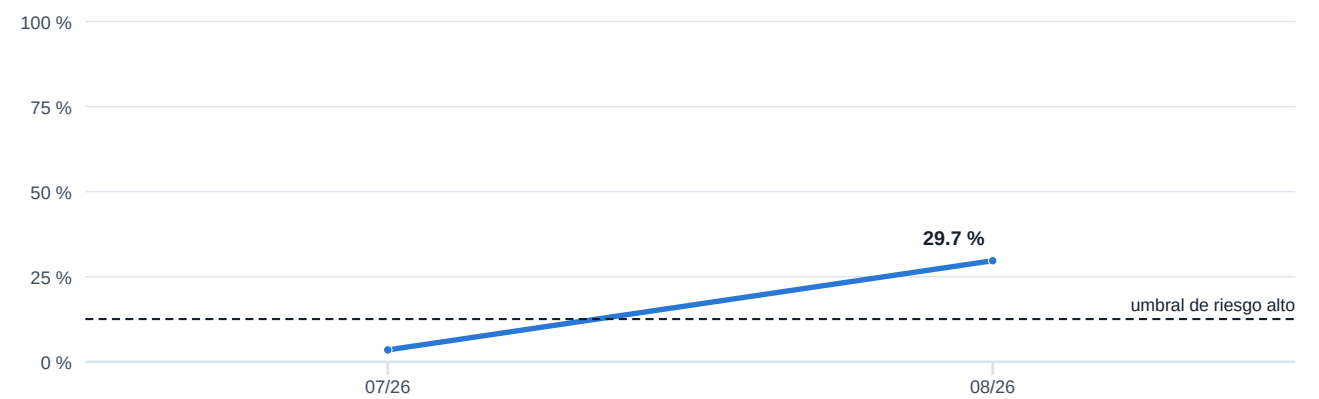

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.793
El 16 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.334
El 27 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.264
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.130
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.127
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
El 53 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.100

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	29.7 %	25.4 %	-4.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 47 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...esta hora de la noche no cumplido con registrar en el cuaderno de obra el cierre de valorización mensual ni el porcentaje de avance físico correspondiente, ante esta omisión, y con la finalidad de no retrasar los trámites administrativos, esta supervisión está porciendo a registrar el avance físico mensual ejecutado y controlado en campo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

...el supervisor, se proceso la valorización 2 arrojando un avance físico mensual de 13.19 % y un acumulado de 21.38 % y de acuerdo a lo programado tenemos un acumulado de 65.03 %, encontrándose la obra retrasada.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...rial o accidente personal que ocurra debido a estas omisiones será de exclusiva responsabilidad civil y penal del contratista, eximiendo de toda carga a la supervisión y a la entidad. 4. evaluación de penalidades: correspondientes por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo a lo establecido en el contrato de seguridad de salud en el trabajo. se solicita al residente de obra el cumplimiento...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

OTRAS OCURRENCIAS: Se realiza la inspección en campo de los frentes de trabajo correspondientes a las excavaciones para conexiones domiciliarias. Se constata y deja constancia de lo siguiente: • Falta de señalización: No se cuenta con mallas de seguridad, cintas de peligro, conos ni letreros informativos que adviertan el riesgo de caída. • Falta de pasarelas: No existen puentes peatonales provisionales para garantizar ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...ción de reinicio: el contratista no podrá reanudar los trabajos de excavación hasta que implemente la señalización completa y los puentes peatonales normados. 3. deslinde de responsabilidad: cualquier retraso en el cronograma, daño material o accidente personal que ocurra debido a estas omisiones será de exclusiva responsabilidad civil y penal del contratista, eximiendo de toda carga a la supervisión y a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...l incumplimiento de pago al proveedor del equipo por parte del contratista. impacto en el proyecto: se advierte al contratista que estas situaciones son de su entera responsabilidad y están generando retrasos injustificados en la ruta crítica del cronograma de ejecución vigente. por lo expuesto, se requiere al contratista subsanar de manera inmediata los compromisos económicos con su personal y proveedor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

..., generando una pérdida de 2.5 horas de la jornada laboral de este día. paralización de equipo: se constato que la maquinaria retroexcavadora se encuentra paralizada en el frente de trabajo debido al incumplimiento de pago al proveedor del equipo por parte del contratista. impacto en el proyecto: se advierte al contratista que estas situaciones son de su entera responsabilidad y están generando retrasos ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

OTRAS OCURRENCIAS: Se hace de conocimiento al Residente de la Contratista que, a la fecha, no se ha cumplido con la presentación de la ficha técnica y documentación de calidad correspondiente al suministro de la tubería HDPE, requerida para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de calidad establecidas en el Expediente Técnico. Esta supervisión reitera la exigencia de la entrega de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

...a directamente a las siguientes partidas que componen la ruta critica del proyecto como las conexiones domiciliarias de agua y desague que segun programacion empiezan el 30 de agosto. esta lentitud e incumplimiento en las actividades criticas impacta negativamente en el plazo total de la obra, poniendo en riesgo la fecha de termino contractual establecida para el 27 de setiembre esta supervision determin...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 18/08/2026

aplicacion de penalidades . el supervisor que suscribe deja constancia de que, habiendose constituidos la inspeccion de campo habitual por la tarde (despues de almuerzo) en los frentes de trabajos se verifico la ausencia to...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
