


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la avenida los incas de la localidad de crucero del distrito de crucero de la provincia de carabaya del departamento de puno, CUI 2707495

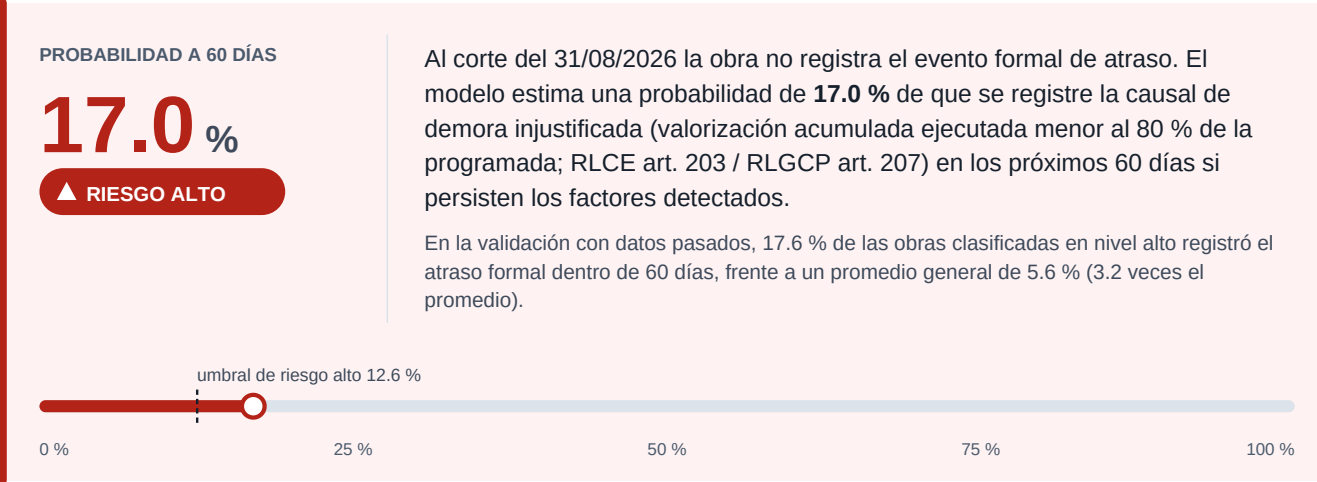


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	60 desde 15/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS INCAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL DISTRITO DE CRUCERO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CUI 2707495
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Contratista	R & SOTO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CRUCERO / CARABAYA / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2707495
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS INCAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL DISTRITO DE CRUCERO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407676
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,530,898.57
Cuaderno de obra digital	60 asientos entre 15/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

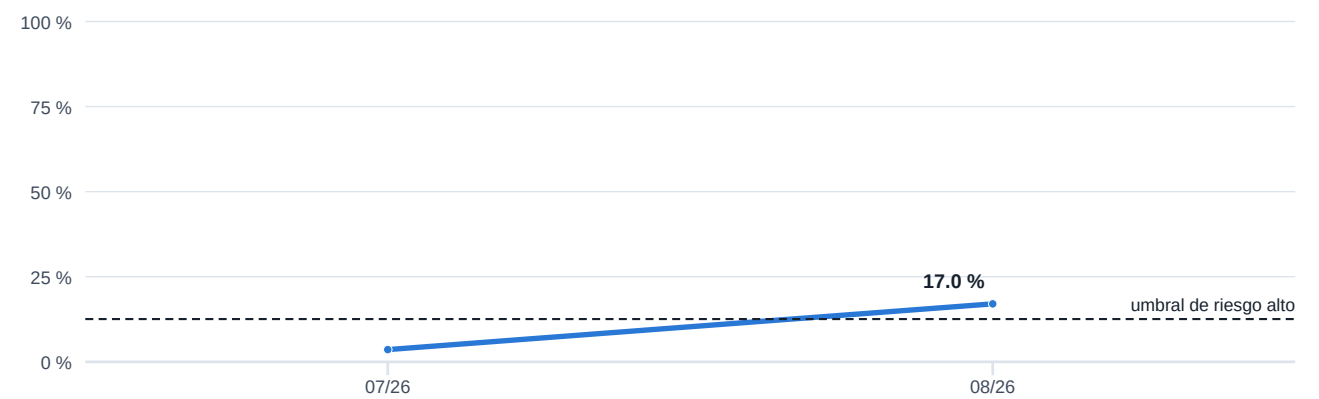

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.560
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.258
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.228
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.211
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.085
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.070
Extensión media de los asientos recientes: 1,150 caracteres	Contenido de los asientos		-0.055

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.0 %	16.3 %	-0.7 pp
Absolver todas las consultas pendientes	17.0 %	17.0 %	-0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	17.0 %	17.0 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	17.0 %	17.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 57 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

...ransito, impidiendo el avance de las partidas de movimiento de tierras, perfilado y compactado y conformacion de sub base de la ruta critica. esta situacion es ajena a la empresa contratista y genera atraso en el cronograma contractual, por lo que se solicita las acciones correspondientes para su liberacion.la residencia deja expresa constancia para salvaguardar el derecho del contratista a la cuantifi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 54 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ransito, impidiendo el avance de las partidas de movimiento de tierras, perfilado y compactado y conformacion de sub base de la ruta critica. esta situacion es ajena a la empresa contratista y genera atraso en el cronograma contractual, por lo que se solicita las acciones correspondientes para su liberacion.la residencia deja expresa constancia para salvaguardar el derecho del contratista a la cuantifi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 26/08/2026

continuidad de causal de ampliacion de plazo por indisponibilidad de terreno y desfase en cronograma vigente. . se deja constancia de que, a la fecha 26 de agosto del 2026, persiste el incumplimiento de la municipalidad distrital de crucero sobre la entrega y liberacion total del terreno en la av. los incas, tramo prog. 0+000 al 0+650. este frente esta bloqueado por la existencia de redes ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 26/08/2026

...a iniciar hoy, su ejecucion es imposible debido al desfase y deficiencias tecnicas indicadas. partidas 02.02.02 y 03.01.01: continuan afectadas y paralizadas en el tramo comprometido, consolidando un retraso no imputable al contratista.la residencia deja expresa constancia para salvaguardar el derecho del contratista a la cuantificacion y formalizacion de la ampliacion de plazo correspondiente, al verse...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...ha observado hundimientos notorios en la ubicacion de las zanjas de conexiones domiciliarias de agua y desague ejecutados por los vecinos y moradores de la av .los incas. este caso se presenta por el incumplimiento en el procedimiento de la compactacion de relleno con material propio. asi mismo se observa fallas en las conexiones de agua al punto de colapsar el sistema en dos de las nuevas conexiones de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 45 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 25/08/2026

TRAZABILIDAD EN EJECUCION Y CIERRE DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: • RESPECTO DE LAS ABSOLUCIONES A LAS CONSULTAS TECNICAS N° 01, 02 Y 03, SE EVIDENCIA LA DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SE COINCIDE CON LA ANOTACION DEL RESIDENTE SOBRE LA NECESIDAD DE FORMULARSE UNA PRESTACION ADICIONAL Y EJECUCION DE MAYORES METRADOS. • RESPECTO DEL CIERRE DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO, SE CONSIDERA QUE CORRESPONDE POR LA R...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 47 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

...usal de ampliacion de plazo acumulativa (prog. 0+000 al 0+650): se ratifica a la supervision el estado de la ruta critica: la partida 02.01.01 corte en terreno normal debio culminar hoy, 25.ago.2026, incumplandose por causas no imputables, la partida 03.01.01 excavacion manual sigue en plazo programado. ambas continuan paralizadas por interferencias de redes de agua y desague de moradores. al bloquearse...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

...e vicio imputable a la entidad, el incremento geometrico obligatorio generara mayores metrados y/o adicionales por ingenieria complementaria, a formularse segun el rlgcp, excluyendo al contratista de retrasos por resolver dicha deficiencia estructural.2. segmentacion de causal de ampliacion de plazo y control (ruta critica): la causal por falta de disponibilidad de terreno (asientos n20 r.o y 21 s.o) se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 24/08/2026

...0): continua abierta y acumulativa la causal de ampliacion de plazo. al estar bloqueado el 70% del frente por redes particulares de moradores (instalacion de agua y desagüe domiciliaria), persiste el incumplimiento de entrega de terreno por la municipalidad de crucero.3. exigencia de trasabilidad in situ: se solicita y exige a la supervision efectuar la trazabilidad diaria, verificacion topografica y de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 42 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 21/08/2026

RESPUESTA SOBRE POSIBLE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: • SE TOMA CONOCIMIENTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE EFECTIBIZAR UNA SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN LO DESCRITO POR EL RESIDENTE EN EL ASIENTO Nº 41, BASANDOSE EN LA FALTA DE ABSOLUCION DE LAS CONSULTAS Nº 01, 02 Y 03. • AL RESPECTO SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DICHAS CONSULTAS FUERON REMITIDAS A ESTA SUPERVISION EN FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2026 Y LA ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
