


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Saldo de obra: Renovación de línea primaria, en el alimentador MZ-02 desde santa rosa hasta derivación a boca colorado por incremento de carga, en el distrito de madre de dios, provincia de manu, departamento madre de dios

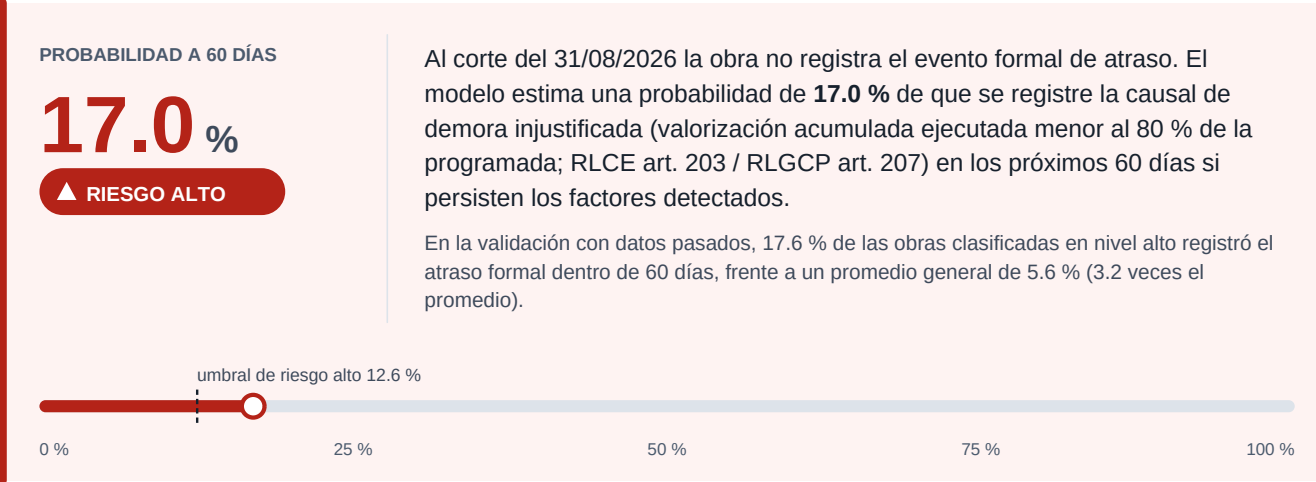


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	42 desde 01/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	SALDO DE OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, EN EL ALIMENTADOR MZ-02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
Entidad contratante	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.
Contratista	BURGA SALAZAR ARTURO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MADRE DE DIOS / MANU / MADRE DE DIOS
Código Único de Inversión (CUI)	2601594
Inversión asociada	RENOVACION DE LINEA PRIMARIA EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2397509
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,794,488.10
Cuaderno de obra digital	42 asientos entre 01/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

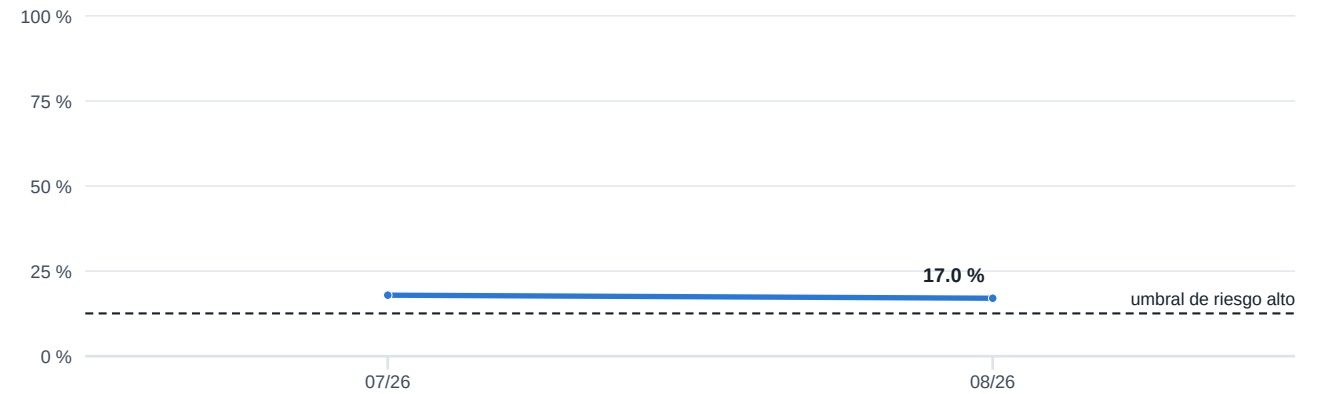

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.77 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.689
El 22 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.229
Departamento: Madre de Dios	Características de la obra		-0.217
El 64 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.201
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.196
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
6 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.083

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 40 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 27/08/2026
incumplimiento de personal clave y personal adicional en obra. . esta supervision de obra deja constancia que hasta la fecha el contratista solo ha dispuesto en obra, 01 residente de obra, 01 asistente de re...
Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

incumplimiento a la ejecucion contractual. . segun lo manifestado por el residente de obra en la anotacion n 34 de fecha 17 de agosto 2026, del cumplimiento de ejecucion contractual, esta supervision deja co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 19/08/2026

NO SE EVIDENCIA PARTICIPACIÓN DEL INGENIERO PREVENCIÓNISTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FECHA NO SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DEL INGENIERO PREVENCIÓNISTA EN OBRA TAL COMO SE NOTIFICA MEDIANTE CARTA N° 031-2026-CVII/JCCC-SO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2026, CABE RECORDARLE AL CONTRATISTA QUE LA PARTICIPACIÓN DE DICHO PROFESIONAL ES EN OBRA, NO COMO LO SUSTENTA QUE ESTA REALIZANDO FUNCIONES DE UN ADMINISTRADOR Y SUS TRABAJO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

.....viene.en conclusion el contratista a la fecha continua actividades de forma irregular con el replanteo de obra, por lo que se identifica como riesgo el incumplimiento y/o retraso en la ejecucion de las partidas contractuales programadas, situacion que podría generar una afectacion directa al cronograma de ejecucion y a la ruta critica de la obra. de persist...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

partidas contractuales en retraso y en proceso de ejecucion.viene.en conclusion el contratista a la fecha continua actividades de forma irregular con el replanteo de obra, por lo q...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 30 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

partidas contractuales en retraso y en proceso de ejecucion. . esta supervision de obra viene insistiendo, advirtiendo en varias oportunidades mediante el presente cuaderno de incidencias de obra sobre la no disponibilidad de los re...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 06/08/2026

...n de esta partida contractual mediante cartas y anotaciones de cuaderno de obra, en el asiento n 24 de fecha 31 se advirtio por ultima vez del mes de julio y el contratista no muestra revertir dichos atrasos generados.a la fecha se continua el riesgo y no acata las ordenes de la supervision que se hizo en el requerimiento de disponibilidad de personal bajo la anotacion n 25 del 31 de julio de 2026, rev...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 31/07/2026

...acion del plazo contractual de acuerdo al calendario de obra aprobado, la presente es para notificarle, se exige la movilizacion inmediata de los recursos requeridos para la ejecucion contractual. la demora, inaccion o falta de diligencia por parte del contratista en la activacion de esta partida de trabajo no configurara causal de ampliacion de plazo ni suspension de penalidades, siendo de su entera re...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 24 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 31/07/2026

...la ejecucion contractual. la demora, inaccion o falta de diligencia por parte del contratista en la activacion de esta partida de trabajo no configurara causal de ampliacion de plazo ni suspension de penalidades, siendo de su entera responsabilidad la asignacion de recursos suficientes para cumplir en el plazo pactado.se le recuerda que la ejecucion del replanteo topografico repercute para el inicio de los...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 21 · Participación de profesionales adicionales al personal clave · SOEC_SPV · 21/07/2026

SOBRE LOS TRABAJOS PRELIMINARES SEGÚN CALENDARIO DE OBRA VIGENTE.: DE ACUERDO CON LA ANOTACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA N° 17 Y 18 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026, DONDE PONE EN CONOCIMIENTO AL SUPERVISOR DE OBRA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DE SU GERENTE ARTURO BURGA ZEBALLOS.POR LO QUE ESTA SUPERVISIÓN PONE EN CONOCIMIENTO POR SEGUNDA VEZ DISPONGA A LA BREVEDAD SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA DEL PERSONAL PROFESIONAL...

Fuente: cod-asientos202607.csv

05

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
