


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra:¿mejoramiento de la capacidad de los servicios de la gerencia sub regional utcubamba, unidad ejecutora N°004, distrito de bagua grande, provincia de utcubamba, region amazonas ¿ i etapa¿ CUI N° 2193299

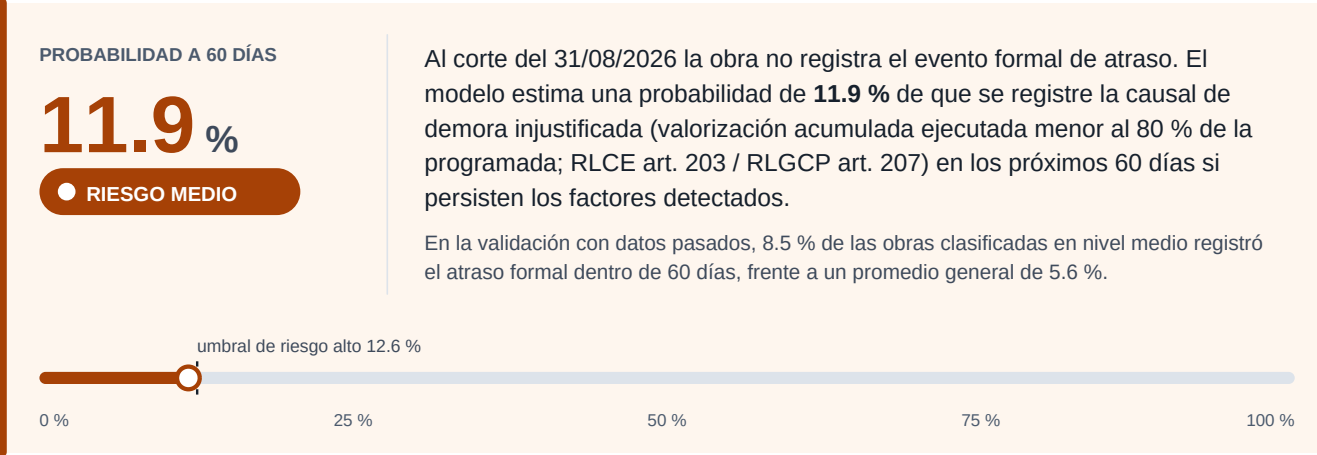


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	256 desde 30/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA:¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA, UNIDAD EJECUTORA N°004, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS ¿ I ETAPA¿ CUI N° 2193299
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Contratista	CONSTRUCCIONES RAYED SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	BAGUA GRANDE / UTCUBAMBA / AMAZONAS
Código Único de Inversión (CUI)	2193299
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA, UNIDAD EJECUTORA N 004, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2382692
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,780,299.00
Cuaderno de obra digital	256 asientos entre 30/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

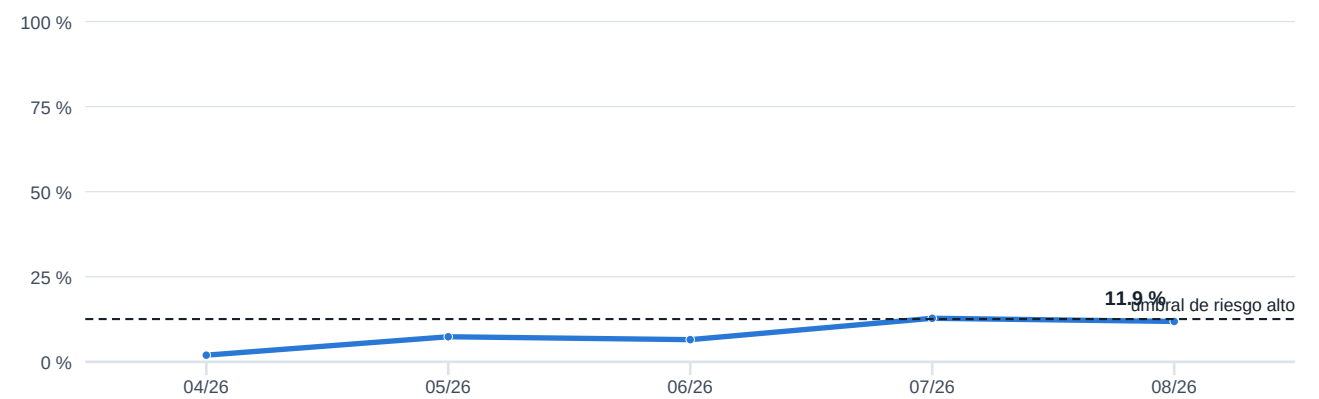

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.566
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.198
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,659,767	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.100
14 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.098
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.098
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.088
Departamento: Amazonas	Características de la obra		-0.072

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.9 %	11.7 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.9 %	11.9 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.9 %	11.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 242 · Adicionales · SOEC_SPV · 26/08/2026

EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE: Se hace de conocimiento que se ha recibido la CARTA N° 043-2026-RAYED/GG/OBRA/GSRU con fecha de hoy 26.08.2026, mediante el cual el Contratista ejecutor de Obra CONSTRUCCIONES RAYED SCRL, alcanza a esta supervisión el Expediente Técnico correspondiente a la Prestación adicional de Obra N° 02, en concordancia con el literal d), del numera...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 241 · Adicionales · SOEC_RESI · 26/08/2026

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL–DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N.º 02: En la fecha, se deja constancia de que, en estricto cumplimiento de los plazos y formalidades previstos en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley N.º 32069, el Contratista ejecutor ha cumplido con elaborar y presentar formalmente el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N.º 02 y su Deductivo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 215 · Consultas · SOEC_SPV · 20/08/2026

... interior, el paso del agua se mantiene libre y con la misma presion. de lo expuesto se le solicita alcanzar el detalle mediante plano de manera formal a fin de autorizar los trabajos y no se generen retrasos que afecten la ruta critica del programa de ejecucion vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 191 · Consultas · SOEC_RESI · 14/08/2026

...de gerencia sub regional n 351 2025 gra/gsrug, de fecha 15 de diciembre del 2025, de lo indicado el contratista esta implementando las acciones de riesgos a fin de mitigar sus efectos antes posibles demoras de la entidad en absolver las consultas, comunicando permanentemente bajo el este medio y realizando la comunicaciones con la entidad, a fin de no generar tramites de posibles ampliaciones de plazo,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Adicionales · SOEC_SPV · 11/08/2026

FIN DE ASIENTO DE NECESIDAD DE EJECUTAR PRESTACIONES ADICIONALES: Viene de Asiento anteriorTal como indica el Residente de Obra en su Asiento N° 177, las ocurrencias generadas por las consultas formuladas y la correspondiente absolución de la Entidad, conlleva a una modificación de los planos del proyecto y a la ejecución de trabajos no previstos en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realizaci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 179 · Adicionales · SOEC_SPV · 11/08/2026

CONTINUA ASIENTO DE NECESIDAD DE EJECUTAR PRESTACIONES ADICIONALES: Viene de Asiento anterior:- Mediante anotación en el cuaderno de incidencia de Obra – Asientos N° 55, 56 y 57, efectuado por el Residente, y tramitado mediante Carta N° 022 – 2026 – RAYED/GG/OBRA GSRU, de fecha 25.06.2026, el Contratista ejecutor de Obra formula consultas (Consulta 108 y 109), el cual mediante asiento N° 058 del suscrito, infor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 178 · Adicionales · SOEC_SPV · 11/08/2026

NECESIDAD DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA: En relación a los Asientos N° 175, 176 y 177 del Residente de Obra, informamos lo siguiente:- Mediante anotación en el cuaderno de incidencia de Obra – Asiento N° 023 efectuado por el Residente, y tramitado mediante Carta N° 008 – 2026 – RAYED/GG/OBRA GSRU, de fecha 07.05.2026, el Contratista ejecutor de Obra formula un paquete N° 02 de consultas (Consulta 16 hasta la 10...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 174 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 10/08/2026**

...de la obra. se deja constancia que, durante la madrugada se presento una fuerte precipitacion pluvial, ocasionando la saturacion del terreno en las areas de trabajo. esta condicion climatica genero un retraso en el inicio de las actividades programadas, debido a que fue necesario esperar a que las condicion del terreno permitieran el ingreso y desplazamiento seguro del personal y equipos, asi como la e...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 173 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026**

actividades y ocurrencias del día . previo a las actividades, a partir de las 7am se registro lluvia de intensidad moderada, la cual duro aproximadamente 01 hora, hecho que retraso el inicio de la jornada, dificultando los frentes de trabajo programados para el día de hoy.se retomo los trabajos, iniciando con el dictado de las charlas de seguridad a cargos de los profesionales...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 159 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 06/08/2026**

CONTINÚA ASIENTO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS: Viene de Asiento anterior N° 158- Carta Múltiple 000130-2026-G.R.AMAZONAS/GSRU, mediante el cual se notifica el Pronunciamiento de la Unidad de estudios según Informe N° 000218 - 2026 - G.R.AMAZONAS/UDE, respecto a las consultas formuladas del Paquete 02 (Consulta 16 hasta la 107), en la cual solo están respondiendo desde la consulta 16 hasta la 51, que corresponde a la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
