


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico y ejecución de obra de la inversión tipo ioarr ¿construcción de sistema de bombeo, en el (la) ptar ventanilla para la adecuada disposición final de sus efluentes ¿ distrito de ventanilla, provincia constitucional del callao, departamento callao¿

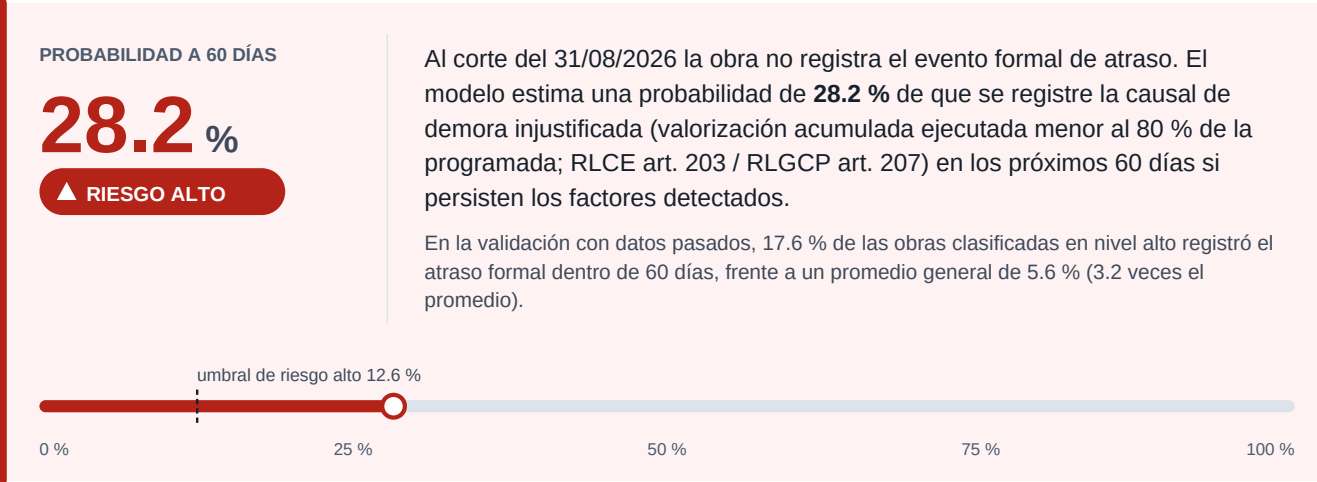


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	33 desde 15/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN TIPO IOARR ¿CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, EN EL (LA) PTAR VENTANILLA PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE SUS EFLUENTES ¿ DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO¿
Entidad contratante	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Contratista	MEJESA S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VENTANILLA / CALLAO / CALLAO
Código Único de Inversión (CUI)	2576452
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) PTAR VENTANILLA PARA LA ADECUADA DISPOSICION FINAL DE SUS EFLUENTES - DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2277679
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 17,600,806.42
Cuaderno de obra digital	33 asientos entre 15/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

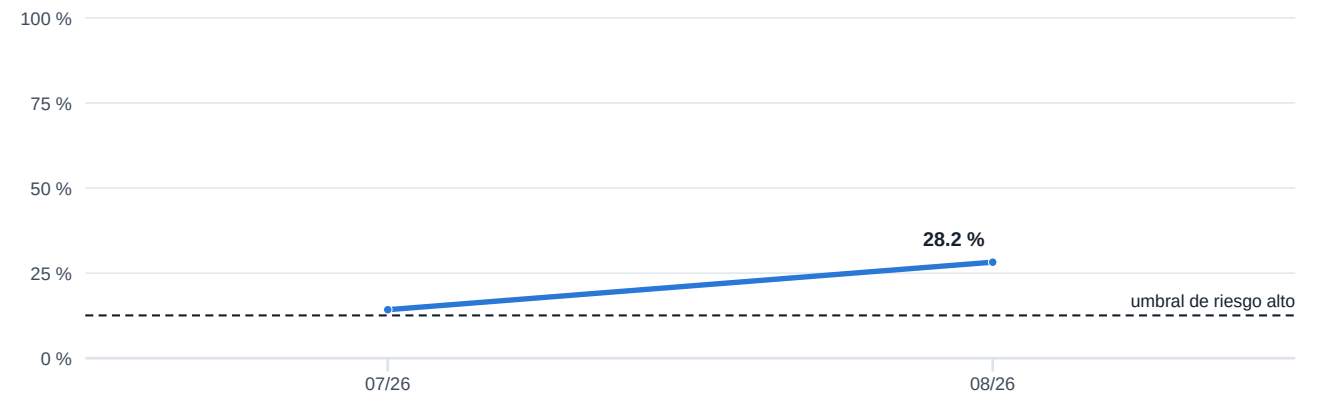

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.69 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.744
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.264
Departamento: Callao	Características de la obra		+0.202
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.138
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.118
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.77 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	28.2 %	24.3 %	-3.9 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA: El contratista viene ejecutando trabajos de :- Conformación de terraplen en la laguna N° 04 con la compactación por capas de e=0.30m, la supervisión vien verificando la compactación con densidad de campo mínima de 95% DMS, un minimo de 3 pruebas por capa.- Demolición de h=020m (mínimop) en los muros del canal abierto, identificación de patologías del canal abierto, la supervisión le ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 21/08/2026

...ta el procedimiento de habilitacion de la estructura metalica c-1, asimismo, indicar que la actividad 01.01.02.02.01 se encuentra dentro de la ruta critica.se recomienda tomar las previsiones y evitar retrasos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

PLANOS DE REPLANTEO: A lo señalado por el contratista en el asiento N° 12 donde indica que se ha iniciado con los trabajos de habilitación de acero para el canal enterrado, se le requiere a la residencia que presente los planos de replanteo de estructuras del canal enterrado, actividad previa al inicio de los trabajos.Se le recuerda que la contratista debe presentar los planos de replanteo para ser revisado y apobado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

CRONOGRAMA CON FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA: Se le requiere al contratista que presente el Cronograma de ejecución de obra, calendario de adquisición de materiales, insumos , equipos, calendario valorizado, compatibilizado con la fecha de inicio de ejecución de obra al 15.07.2026 y la fecha de termino de obra de acuerdo a los plazos del contrato y sus adendas.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 5 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 27/07/2026

...ta por la entidad, en carta n 2609 -2026-eo e informe n 2009-2026-eo/ercha, los profesionales presentados por el contratista se encuentran observados, por lo que de acuerdo al ítem n01 de la tabla de penalidades para la etapa de ejecucion del contrato, corresponderia imponer la penalidad por cada profesional y por día prevista a partir del 15 de julio del 2026.en atencion a lo expuesto, se envía el present...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 5 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 27/07/2026

PREAVISO DE APLICACIÓN DE PEALIDAD POR AUSENCIA DE PROFESIONALES: De acuerdo a la comunicación remitida al contratista por la entidad, en carta N° 2609 -2026-EO e informe N° 2009-2026-EO/ERCHA, los profesionales presentados por el contratista se encuentran observados, por lo que de acuerdo al Ítem N°01 de la tabla de penalidades para la etapa de ejecución del contrato, correspondería imponer la penalidad por cada pro...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
