


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de interpretación cultural en casa hacienda san juan grande de centro poblado santiago de surco distrito de santiago de surco de la provincia de lima del departamento de lima con CUI n.º 2670629

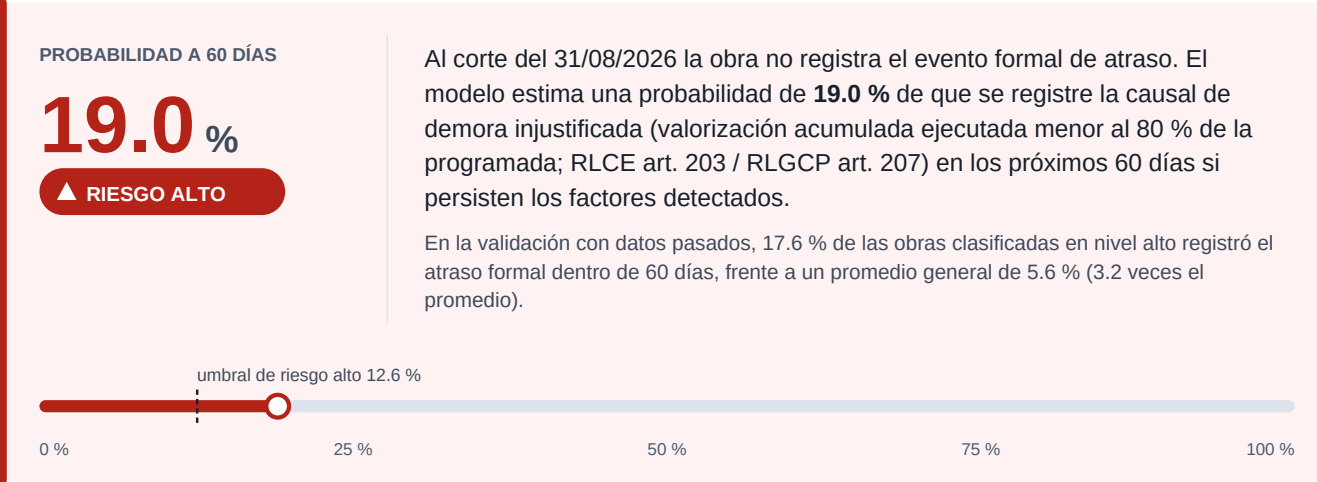


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 9,737,250.84	240 días	171 desde 11/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN CASA HACIENDA SAN JUAN GRANDE DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N.º 2670629
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Contratista	CONSORCIO LIMA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2670629
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN CASA HACIENDA SAN JUAN GRANDE DE CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2380419
Monto del contrato	S/ 9,737,250.84
Monto aprobado de la inversión	S/ 10,029,900.49
Cuaderno de obra digital	171 asientos entre 11/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

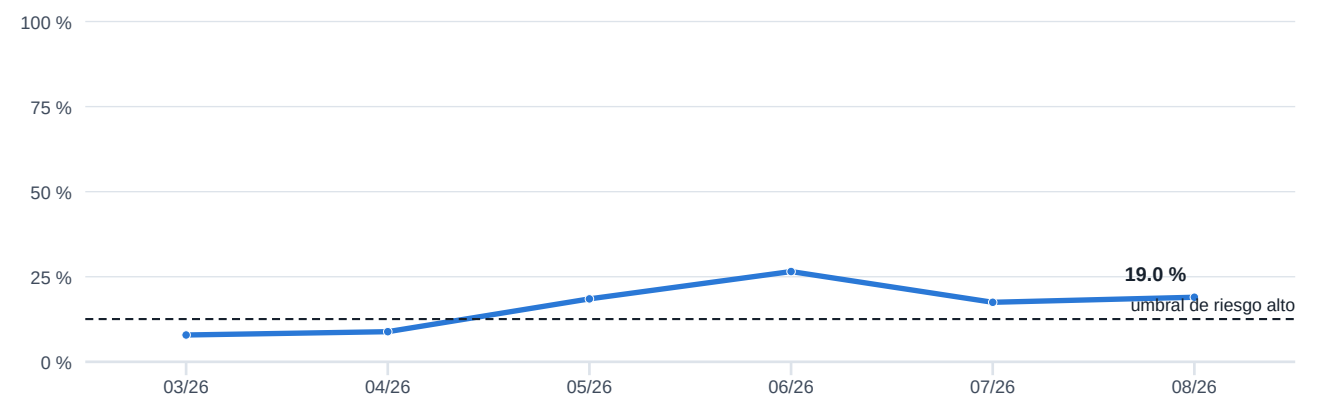

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.558
El 28 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.240
Faltan 65 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.191
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.155
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.136
22 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.088
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.080

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	19.0 %	18.2 %	-0.8 pp
Absolver todas las consultas pendientes	19.0 %	19.0 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	19.0 %	19.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 162 · Consultas · SOEC_RESI · 19/08/2026

FALTA DE ATENCIÓN A CONSULTAS FORMULADAS - CISTERNA: Por medio del presente registro, se pone en conocimiento al Supervisor de Obra lo siguiente: El Contratista ha realizado consultas técnicas relacionadas al componente denominado Cisterna, de acuerdo a lo establecido en el artículo 190° del Reglamento de la Ley N°32029. A continuación, pasamos a detallar el estado situacional de las consultas formuladas por el Contrat...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 163 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 19/08/2026

...cado por el supervisor de obra en la anotación n129 del cuaderno de incidencias, de fecha 24.06.2026, así mismo, a través de la carta n026-2026-ccp-ro, de fecha 30.06.2026, se informo a la entidad, la demora en la aprobación a los planos de replanteo de movimiento de tierras del componente denominado pergola sol y sombra. Al respecto, se reitera nuevamente al supervisor de obra que, tome a bien dar atenci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 162 · Consultas · SOEC_RESI · 19/08/2026

...a entidad contratante no cumplen con lo señalado en el numeral preceden y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora (...) por lo mencionado en los párrafos precedentes, nos reservamos el derecho de solicitar una ampliación de plazo con el reconocimiento de mayores gastos generales, por la afectación del cronograma ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 153 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 08/08/2026

...ampliación de plazo a la entidad contratante y a la supervisión en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la notificación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización (...), del inciso 200.1 del artículo 200 procedimiento de ampliación de plazo en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, el contratista cumpli...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 157 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 08/08/2026

AMPLIACIÓN DE PLAZO POR AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA – PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04: viene del registro anterior En virtud a lo mencionado en el párrafo precedente, y acorde a lo establecido en inciso 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley N°32069, que a la letra indica que "(...) en el caso de obras, el contratista puede solicitar ampliaciones de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 157 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 08/08/2026

...sta puede solicitar ampliaciones de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen a ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud: a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista b) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra (...), el contratista presentará la solici...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 136 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 10/07/2026

RESTRICCIONES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL CERCO PERIMÉTRICO: Se cumple con registra lo siguiente: conforme al programa de ejecución de obra y el calendario de avance de obra vigente, para el día de hoy, viernes 10.07.2026, se tenía programado el inicio de las actividades exclusivas de construcción correspondientes a la "Demolición del cerco perimétrico existente" ubicado en el Jr. Coronel Eudocio Rabines, p...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 129 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/06/2026

SOBRE LOS PLANOS DE REPLANTEO DE SOL Y SOMBRA.: En referencia al Asiento N° 122 del Residente, mediante el cual presenta el Informe Técnico N°006-2026-AGVD.Esta Supervisión no tiene permitido aprobar modificaciones al expediente técnico contractual, en ese sentido, la aprobación solicitada de los planos de replanteo solicitada por el Residente de obra, constituye una modificación al expediente que impacta en el presu...

Fuente: cod-asientos202606.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 65

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
