


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la ioarr: Construcción de zona de estacionamiento, zona de campamento y mirador turístico, reparación de sendero, además de otros activos en el(la) recurso turístico laguna 69, distrito de yungay, provincia yungay, departamento ancash - CUI N°2451236

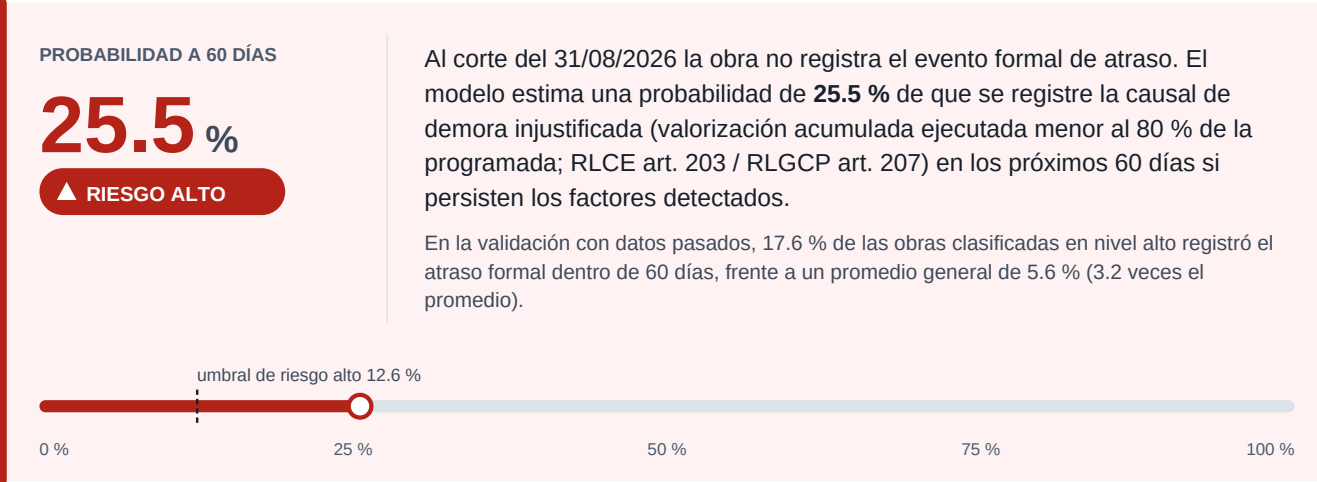


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 171<br>desde 05/05/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCIÓN DE LA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, ZONA DE CAMPAMENTO Y MIRADOR TURÍSTICO, REPARACIÓN DE SENDERO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO LAGUNA 69, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH - CUI N°2451236 |
| Entidad contratante                             | PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratista                                     | CONSORCIO CIRCUITO BARRANCO                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | YUNGAY / YUNGAY / ANCASH                                                                                                                                                                                                                                                |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2451236                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inversión asociada                              | CONSTRUCCION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, ZONA DE CAMPAMENTO Y MIRADOR TURISTICO REPARACION DE SENDERO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) RECURSO TURISTICO LAGUNA 69, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH                                          |
| Función                                         | TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2386628                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 1,124,058.35                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuaderno de obra digital                        | 171 asientos entre 05/05/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                              |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

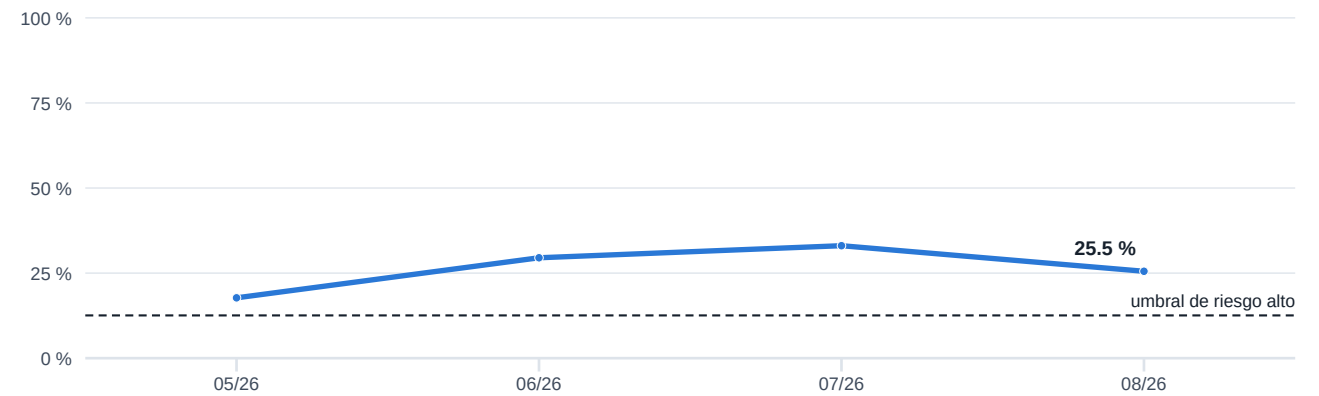

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                 | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.68 (escala de 0 a 1)      | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.759 |
| El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.248 |
| Entidad contratante: otra entidad pública                                                       | Características de la obra     | <div></div>    | +0.152 |
| El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal               | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.151 |
| 1 asiento de órdenes en los últimos 90 días                                                     | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.123 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.102 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)             | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.091 |
| Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | -0.090 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 25.5 % | 24.6 %    | -0.9 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes                 | 25.5 % | 25.5 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 166 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 25/08/2026

*comunico cambio de especialista ssoma . mediante el presente asiento comunicamos a la supervision la aprobacion del cambio de especialista ssoma, habiendo recepcionado por parte de la entidad la carta n 942 - 2026 - mincetur/dm/uic...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 145 · Adicionales · SOEC\_SPV · 10/08/2026

*...vo vinculante n01, que fue notificado con carta n34-2026consorcio supervisor laguna 69, en fecha 30.07.2026, lo solicitado en virtud que es su responsabilidad y obligacion. ademas se indica que, todo retraso y demora en la presentacion de dicho adicional es causa imputable a la contratista.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 145 · Adicionales · SOEC\_SPV · 10/08/2026

*SE REITERA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°02-DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.: SE DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE CARTA N° 019-2026-JAACH/JS-CS-LAGUNA 69, EN FECHA 10.08.2026, SE REITERA AL CONTRATISTA ALCANZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N°02-DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 (ADJUNTO)ASI MISMO SE INDICA AL CONTRATISTA QUE, DEBE P...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 141 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 04/08/2026

*...programacion de la obra.en tal sentido, se deja expresa constancia de que este evento ha generado un impacto directo y negativo en la ruta critica del calendario de avance de obra vigente, provocando retrasos no imputables al contratista. por lo que la cuantificacion y el sustento de estos atrasos se efectuara en su debido momento, a traves de la solicitud de ampliacion de plazo correspondiente, bajo la...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 140 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 04/08/2026

*...programacion de la obra.en tal sentido, se deja expresa constancia de que este evento ha generado un impacto directo y negativo en la ruta critica del calendario de avance de obra vigente, provocando retrasos no imputables al contratista. por lo que la cuantificacion y el sustento de estos atrasos se efectuara en su debido momento, a traves de la solicitud de ampliacion de plazo correspondiente, bajo la...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 136 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 03/08/2026

*...es de julio del 2026 (valorizacion n03) indicando que el avance acumulado ejecutado es de 40.94%, el mismo que representa el 85.19% del avance programado acumulado, afirmando que la obra se encuentra atrasada en 7.12%,con respecto al porcentaje programado para el mes de julio( 48.06%) sobre esta afirmacion debemos aclarar que este atraso esta justificado debido a la demora en absoluciones de consultas ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 133 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 01/08/2026

*RECOMENDACIONES: SE INDICA QUE, AL CIERRE DEL MES DE JULIO DEL 2026, EL AVANCE ACUMULADO EJECUTADO ES DE 40.94%, REPRESENTA EL 85.19% DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (48.06%) PARA EL PERIODO JULIO DEL 2026, POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 7.12%.SE LE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE EL AVANCE PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2026 ES DE 22.26% Y EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES DE 70.32%POR LO QUE SE LE...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 91 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 08/07/2026

*RESPUESTA AL ASIENTO N° 87 Y 88 DEL SUPERVISOR: En atención a los asientos 87 y 88 del supervisor de obra, con respecto a la solicitud del SCTR, este documento se le está alcanzando mediante el presente asiento, con respecto al personal nuevo que ingresa se le indica que está recibiendo la inducción correspondiente y cumple con los requisitos solicitados exámenes, SCTR y es registrado en los ATS correspondientes a lo...*

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 46 · Órdenes · SOEC\_RESI · 03/06/2026

*SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO: Por el presente asiendo indicamos al inspector de obra, para que tome en cuenta, que nuestra represenatad mediante CARTA N° 017-2026-CM de fecha 02 Junio de 2026, se gha solicitado formalmente a la Unidad Ejecutora de Inversiones en Comercio Exterior y Turismo -UICET , del MINCETUR, la modificación de la CLAUSULA OCTAVA al CONTRATO, La Adecuación y Modificación...*

Fuente: cod-asientos202606.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
