


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contrato N°04-2026-MDL/GM

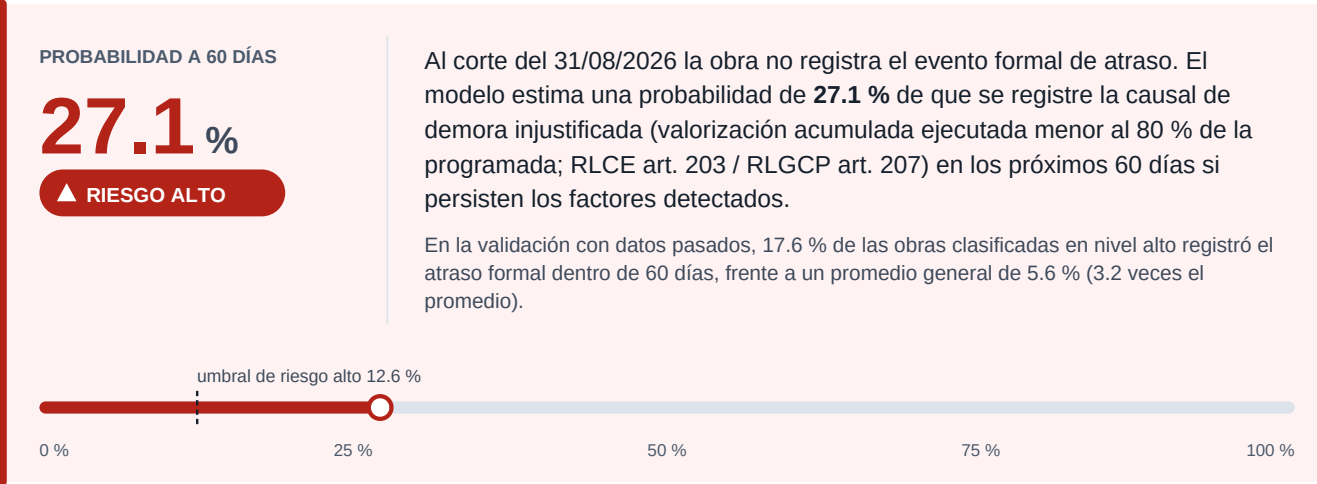


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	31 desde 11/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATO N°04-2026-MDL/GM
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Contratista	CONSORCIO M7
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LAGUNAS / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2402248
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	31 asientos entre 11/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

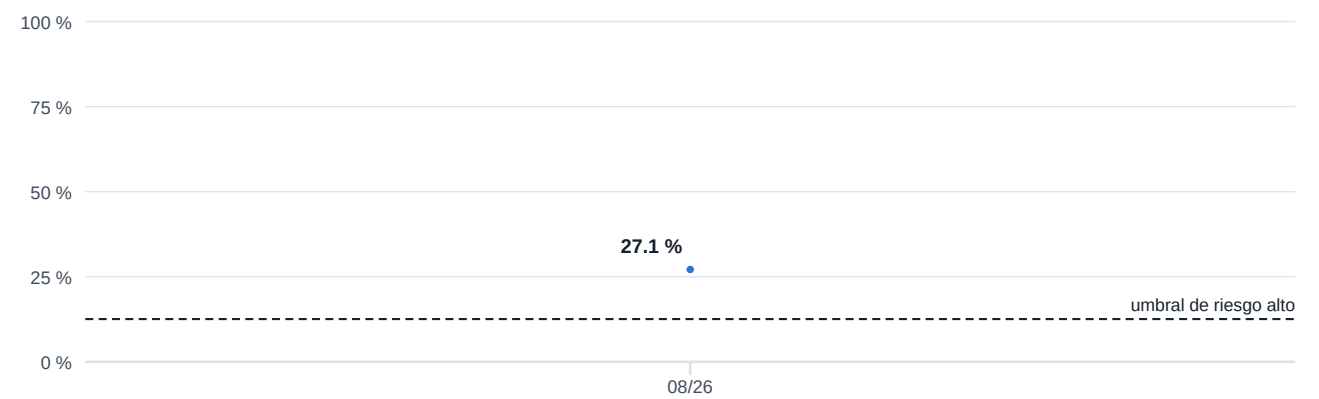

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.87 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.777
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.328
El 16 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.265
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.162
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.72 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.103
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	27.1 %	24.2 %	-2.9 pp
Absolver todas las consultas pendientes	27.1 %	27.1 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 31 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

...anotacion, debiendo continuarse con su tramite. asimismo, la opinion n. d000083-2026-oece-dtn interpreta especificamente el procedimiento regulado por el articulo 190.se deja constancia que cualquier demora por exigencias no previstas en el articulo 190 no resulta atribuible al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ndario contados desde el dia siguiente de realizada la anotacion, por tanto, dicho plazo vence el 31/08/2026.se deja constancia que, de no efectuarse dicha remision dentro del plazo reglamentario, la demora generada por dicha actuacion sera atribuible a la supervision. asimismo, de producirse falta de atencion de la consulta y afectacion a la ruta critica del programa de ejecucion vigente, resultara apl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 23 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 27/08/2026

...asiento n2o ya se advierte al contratista su ritmo no adecuado de trabajose observa que no se ha ejecutado trabajos en varias progresivas del recorrido del canal a desbrozarse le recuerda que existen penalidades en su contrato de obra y las sanciones que estipula el reglamento de la ley de contrataciones publicas ley n32069. las cuales se informaran a la entidad.}se adjunta fotos

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 22 · Consultas · SOEC_RESI · 26/08/2026

...ir opinion tecnica y elevar la consulta a la entidad. se adjuntan el informe tecnico en el presente asiento. de mantenerse la imposibilidad de ejecutar las actividades materia de consulta y generarse atraso por causas no imputables al contratista, este acreditara documental y objetivamente dicho periodo conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del reglamento, a efectos de que sea considerado retraso ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

...nte asi mismo se le indica que el ritmo de trabajo no es el adecuado se le recomienda mejorar la distribucion de maquinaria y personal a fin de mejorar el avance de la obra.se le recuerda que existen penalidades en su contrato de obra y las sanciones q estipula el reglamento de la ley de contrataciones publicas ley n32069

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N°19 DEL CONTRATISTA: SE HA VERIFICADO LO DESCRITO POR EL RESIDENTE ASI MISMO SE LE INDICA QUE EL RITMO DE TRABAJO NO ES EL ADECUADO SE LE RECOMIENDA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE MAQUINARIA Y PERSONAL A FIN DE MEJORAR EL AVANCE DE LA OBRA.SE LE RECUERDA QUE EXISTEN PENALIDADES EN SU CONTRATO DE OBRA Y LAS SANCIONES Q ESTIPULA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS LEY N°32069

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...naria en talud de canal y camino. se le informa a la supervision que la distribucion de maquinaria y personal esta acorde con los accesos y caminos que posee el canal en ejecucion, pudiendo ocasionar demoras por la misma falta de acceso.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA DE HOY: SE RECIBIO EL DIA DE HOY LA CARTA N°010—CA/RC DE CONTRATISTA DONDE HACE ENTREGA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA.ASI MISMO SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA SEÑIRSE A SUS BASES DEL PROCESO PAGINAS 36 Y 40 ASI COMO A LO QUE SEÑALA AL ART. 192 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU CONTRATO DE OBRA N°04-MDL/CS A FIN DE EVITAR PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026**

... contratista que debiera senirse a sus bases del proceso paginas 36 y 40 asi como a lo que senala al art. 192 del reglamento de contrataciones publicas y su contrato de obra n04-mdl/cs a fin de evitar penalidades por incumplimiento en los plazos de enterega de documentacion

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 13 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 19/08/2026**

cartel de obra . se le indica al residente sobre el item n21 de penalidades de su contrato de obra con la entidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
