


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Creación del servicio educativo de educación inicial i.e.i N°541-B

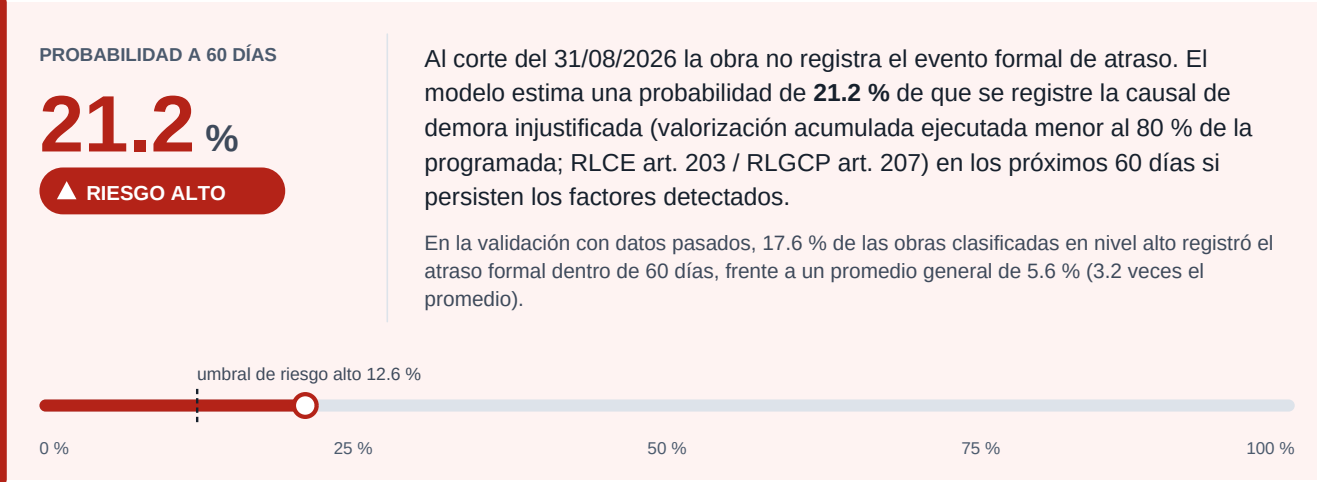


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	213 desde 27/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL I.E.I N°541-B
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO SALUD CABALLOCOCHA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RAYMONDI / ATALAYA / UCAYALI
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2385737
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	213 asientos entre 27/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

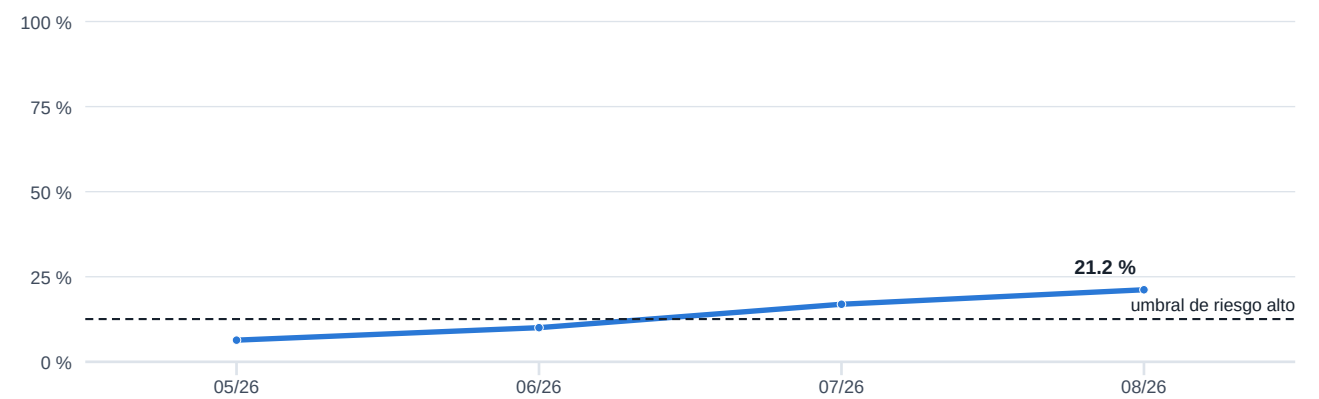

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.603
El 57 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.255
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.161
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.117
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.097
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.086
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.072

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	21.2 %	20.9 %	-0.3 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	21.2 %	21.2 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	21.2 %	21.5 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 189 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 20/08/2026

...de ampliacion de plazo . en la presente fecha se deja constancia de haber tomado conocimiento de la anotacion realizada por el residente de obra en el asiento n 181 de fecha 19/08/2026, respecto a la demora en la absolucion de la consulta n10-2026 sobre deficiencia de calculo estructural en: losa maciza de los bloques 1, 2 y 3, cimentacion y vigas en portico de ingreso, cimentacion y longitud de muro en...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 173 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

actividades de avance de obra . (...) para ampliacion de plazo por demora en la absolucion de la consulta n 05-2026 incompatibilidad de niveles de piso terminado.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 169 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 17/08/2026

... bloque 02.asimismo mediante carta n035-2026/csa-541-rc-c1 de fecha 17 de agosto del presente ano realiza el comunicado certificatorio respecto a la solicitud de prorroga para ampliacion de plazo por demora en la absolucion de la consulta n05-2026-incompatibilidad de niveles de piso terminadofinalmente, mi representada presenta la carta n034-2026-jvc-ru-item-02 de fecha 17 de agosto mi representado remi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 159 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 13/08/2026

...de ampliacion de plazo . en la presente fecha se deja constancia de haber tomado conocimiento de la anotacion realizada por el residente de obra en el asiento n 157 de fecha 13/08/2026, respecto a la demora en la absolucion de la consulta n06-2026 sobre la incompatibilidad de la ubicacion del pozo tubular efectuada mediante asiento n 65 de fecha 04/07/2026 complementado con el informe tecnico adjunto a ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 133 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 02/08/2026

ACTIVIDADES DE AVANCE DE OBRA: En la presente fecha se deja constancia que el día 01/08/2026 se constató y verificó el encofrado de losa maciza, Viga V201, V202, V101A, V101D, cuneta de drenaje pluvial, y la habilitación de acero de refuerzo $f'c=4,200 \text{ kg/cm}^2$ para Viga V 201, V 202, V 101A, V101D, Loza Maciza, cuneta de drenaje pluvial en el MODULO IV, Se indica al Residente de Obra que el colocado de concreto se real...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 112 · Consultas · SOEC_SPV · 23/07/2026

PRECISIONES RESPECTO A CONSULTA 10-2026 SOBRE DEFICIENCIA DE CUANTIA DE ACERO Y ESBELTEZ DE LOSA MACIZA DE LOS BLOQUES 1, 2, 3 Y PÓRTICO DE INGRESO: (...)de valorización ni de la conformidad técnica de la obra.La presunta incompatibilidad correspondería a una deficiencia propia del expediente técnico de obra, cuya elaboración es responsabilidad de la Entidad, POR LO QUE SU RESOLUCIÓN REQUIERE LA OPINIÓN DEL PROYECTIS...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
