


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción con estudios básicos de ingeniería con metodología fast track de la obra, equipamiento y mobiliario del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación secundaria y servicio de educación primaria en I.E. 80249 luis felipe de la puente distrito de jalcán de la provincia de jalcán del departamento de la libertad, con CUI 2667579

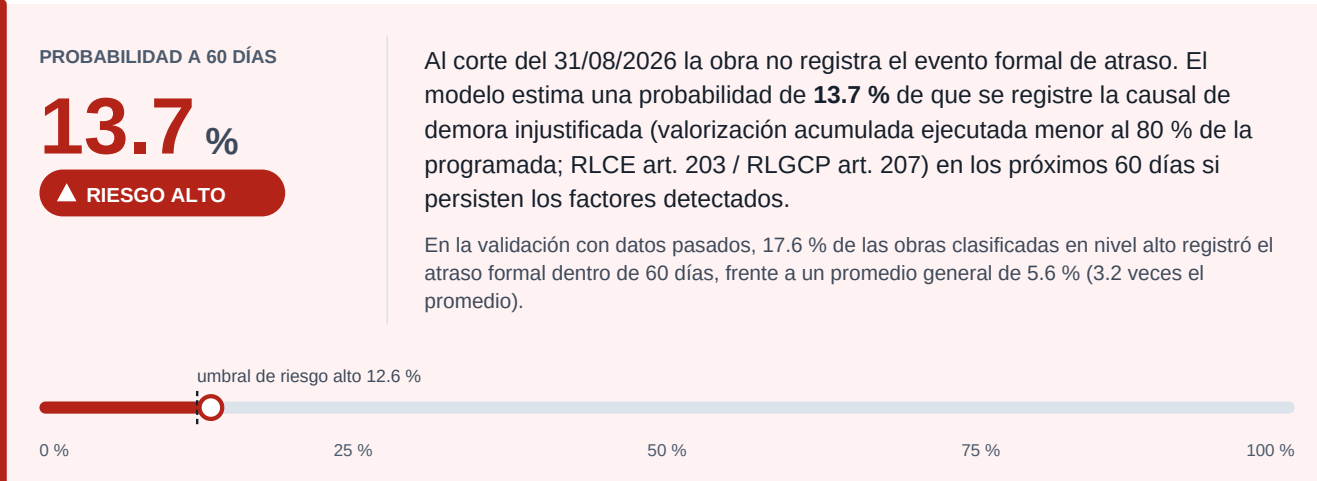

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	160 desde 16/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80249 LUIS FELIPE DE LA PUENTE DISTRITO DE JULCÁN DE LA PROVINCIA DE JULCÁN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2667579
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Contratista	CONSORCIO MELGAR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JULCAN / JULCAN / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2667579
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80249 LUIS FELIPE DE LA PUENTE DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2345018
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 11,290,582.04

Cuaderno de obra digital

160 asientos entre 16/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

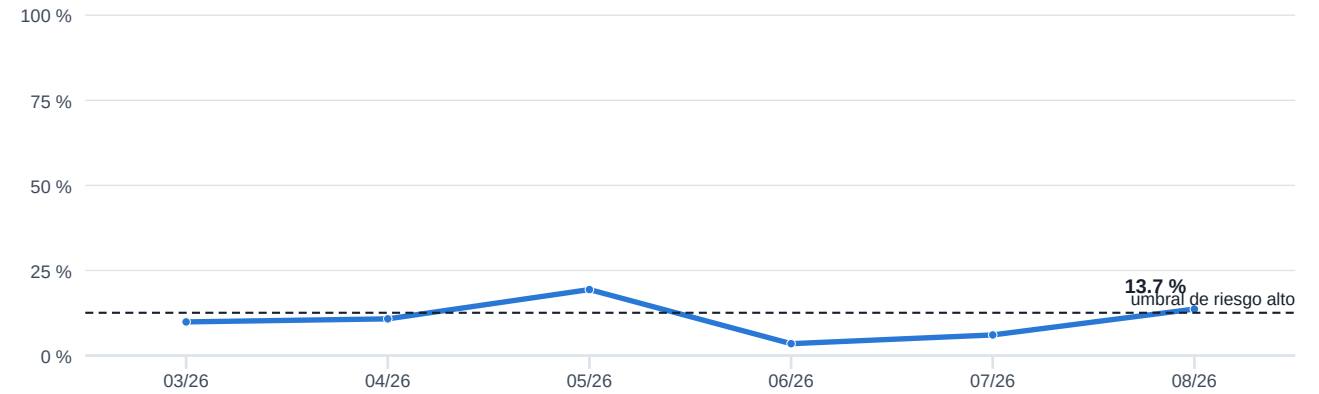

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.503
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.180
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.104
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.096
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.087
Extensión media de los asientos recientes: 758 caracteres	Contenido de los asientos		+0.044
45 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.044

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.7 %	13.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 158 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/08/2026 <i>incumplimiento con el cronograma de ejecucion de la obra . se hace saber al residente de obra que no esta respetando el cronograma de ejecucion de la obra en mencion, por el motivo de que viene trabajando co...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 140 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 18/08/2026 <i>ENTREGA DE CALENDARIOS ACTUALIZADOS. ACTIVIDADES.: Hoy día realiza la charla de seguridad de 5 minutos por la Ing. De Seguridad de obra.Continua el perfilado y nivelación de zanjas de zapatas de bloque 11 y bloque 13 y acarreo de material de perfilado con personal, realizada de forma manual.Con fecha de hoy 18 de agosto del 2026, se hace llegar a la supervisión mediante correo electrónico, con carta 115-2026/CC/GRLL,...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 126 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 10/08/2026 <i>...la escalera y rampa.en los asientos 79 de fecha 22/05/2026 y 113 y 114 de fecha 01/08/2023, se hace de conocimiento de la supervision referente al deductivo de obra.situacion que deja en evidencia el incumplimiento al acuerdo realizado el 22/05/26, via acta de reunion por parte de la contratista, entidad y supervision. lo cual puede conllevar al reconocimiento de una ampliacion de plazo haciendose establ...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 96 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/07/2026 <i>OCURRNCIAS: Hoy día realiza la charla de seguridad de 5 minutos por la Ing. De Seguridad de obra.Continua la demolición de infraestructura de los siguientes ambientes.Continua la demolición de Escenario demolición de muros de albañilería con rotomartillo, dificulta la demolición de albañilería por estar pegado a la edificación colindante.Continua la demolición de pabellón 03 (tres niveles), demolición de muros de alb...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 94 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026 <i>OCURRENCIAS.: Hoy día realiza la charla de seguridad de 5 minutos por la Ing. De Seguridad de obra.Se coordino con la supervisión respecto a la demolición.El día de hoy se inicia la demolición con una excavadora Develon 300 modelo DX300LCA-7M., también se cuenta martillo demoledor y equipos de corte de fierro y herramientas. De la infraestructura de los siguientes ambientes:Se inicio con la demolición de pabellón 04 ...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
