


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: ¿mejoramiento del servicios de espacios públicos urbanos en la plaza principal distrito de ascensión de la provincia de huancavelica del departamento de huancavelica¿. Con CUI N° 2636922

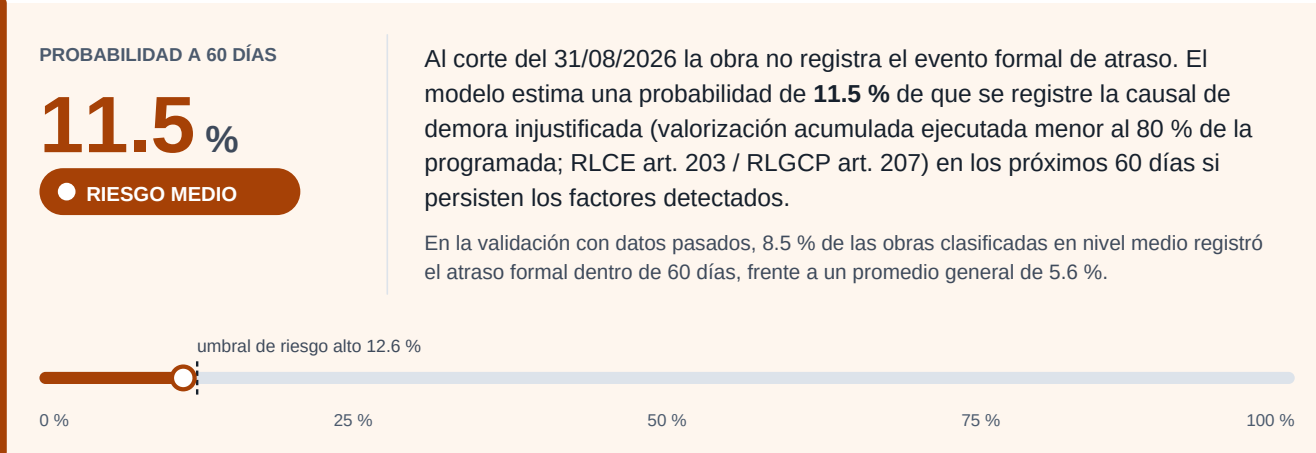


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	312 desde 29/08/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE ASCENSIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA¿. CON CUI N° 2636922
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION
Contratista	CONSORCIO CENTRO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ASCENSION / HUANCAMELICA / HUANCAMELICA
Código Único de Inversión (CUI)	2636922
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2342704
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 6,095,877.16
Cuaderno de obra digital	312 asientos entre 29/08/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

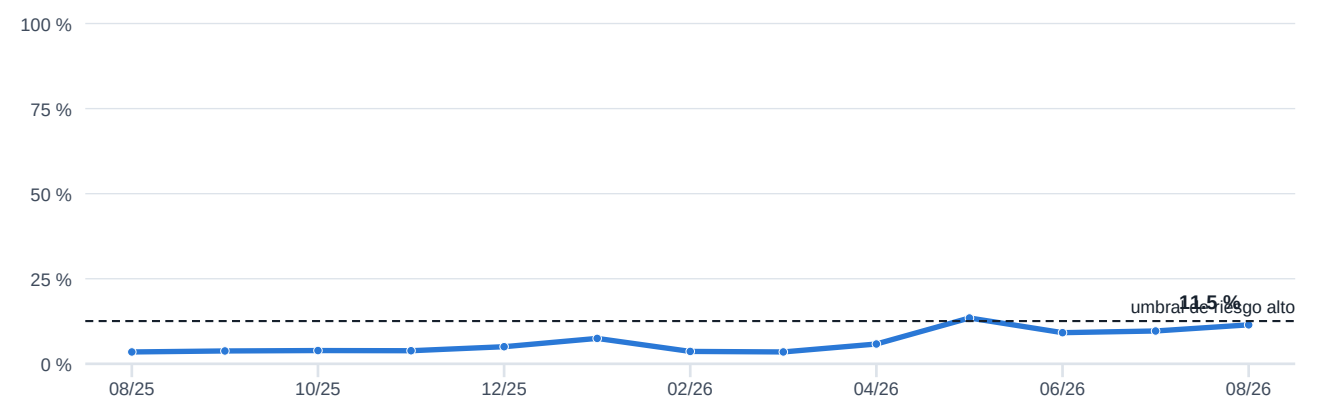

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.405
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.176
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.135
Hubo registros en el cuaderno 27 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Extensión media de los asientos recientes: 1,224 caracteres	Contenido de los asientos		-0.084
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.079
6 asientos de respuestas a consultas en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.5 %	11.4 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 293 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

... cuenta el art. 162.5. el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. en ese ultimo caso, la calificación del retraso como justificado por parte...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 293 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

asiento de residente de obra . (...) viene del asiento anterior.teniendo, en cuenta el art. 162.5. el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 292 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

...I costo final por unidad ejecutada, ocasionando un quiebre de los rendimientos teoricos (expediente tecnico). hecho imprevisible, extraordinario totalmente ajeno al control del contratista, generando atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. el retraso, generado por la escasez de personal, afecto directamente las partidas que componen la ruta critica del proyecto, imposibilit...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 280 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

....01.01 muro de ladrillo tipo iv 18 huecos de soga de 9 x 12.5 x 23 cm. c:a-1:4 x 1.5 cm.2.- se reitera al residente de obra que tenga que incrementar mas frentes de trabajo, ya que estamos cayendo en retraso de avance fisico de obra con respecto a lo programado.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 266 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

asiento de residente de obra . se deja constancia de que se viene presentando un retraso en la ejecucion de determinadas partidas programadas, debido principalmente a la limitada disponibilidad de mano de obra calificada en la zona de intervencion. esta situacion se viene presentando de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 201 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 16/07/2026

... de residente de obra . en atencion a la observacion del asiento n199, del supervisor de obra, mediante la cual se dispone la suspension de los trabajos de vaciado de concreto para pisos por presunto incumplimiento del nivel de rasante, esta residencia cumple con manifestar lo siguiente:la observacion formulada no precisa el sector, eje, progresiva o ubicacion especifica donde presuntamente se habria ide...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 199 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/07/2026

VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EL DIA DE HOY: 1.- Se da por validado los trabajos ejecutados el día de hoy los cuales corresponden al Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02, siendo las siguientes:01.01.02.02.01 CONCRETO PARA SARDINELES $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ 01.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES 01.01.02.02.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, GRADO 60 01.02.04.05.01 CURADO DE CONCRETO 01....

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 189 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026

VALIDACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EL DIA DE HOY: 1.- Se da por validado los trabajos ejecutados el día de hoy los cuales corresponden al Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02, siendo las siguientes:01.01.02.01.01 CONCRETO PARA CUNETAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ 01.01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CUNETAS DE CONCRETO 01.01.02.01.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, GRADO 60 01.01.02.02.01 CONCRETO PARA SARD...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
