


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra del proyecto: ¿ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344, distrito de comas e independencia¿ código único N° 230005

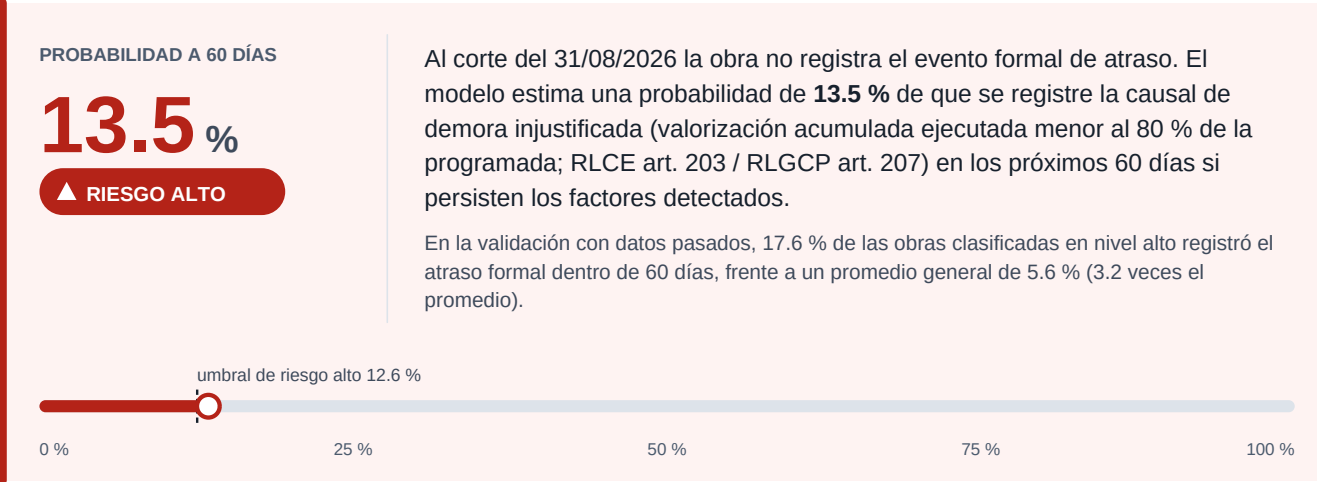


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 278,048,253.76	600 días	2,036 desde 21/11/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 337, 343 Y 344, DISTRITO DE COMAS E INDEPENDENCIA¿ CÓDIGO ÚNICO N° 230005
Entidad contratante	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Contratista	CONSORCIO SANEAMIENTO CHALA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	COMAS / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2300050
Inversión asociada	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 337, 343 Y 344 - DISTRITOS DE COMAS E INDEPENDENCIA.
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2359128
Monto del contrato	S/ 278,048,253.76
Monto aprobado de la inversión	S/ 169,771,345.00
Cuaderno de obra digital	2036 asientos entre 21/11/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

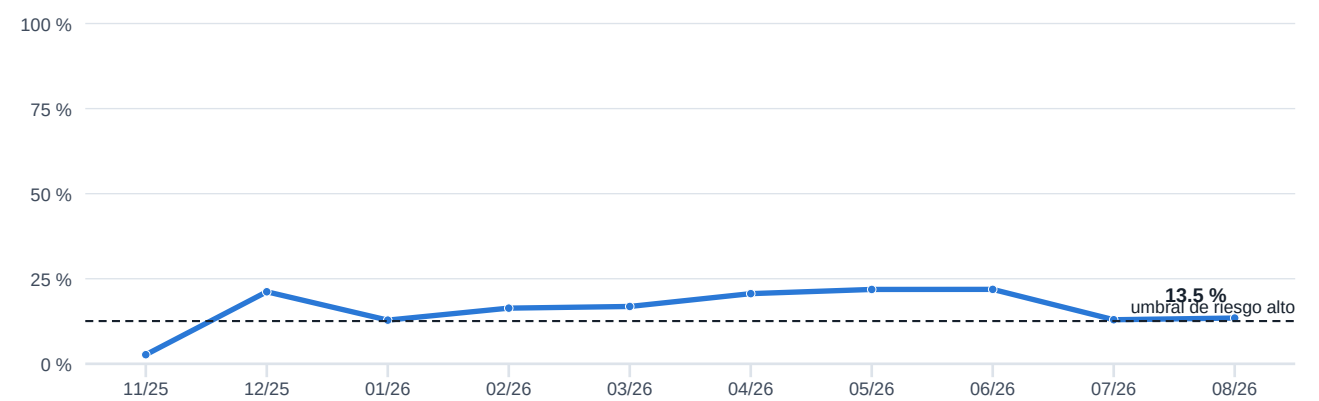

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (10 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.583
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.291
Faltan 338 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		-0.195
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.152
Monto aprobado de la inversión: S/ 169,771,345	Características de la obra		-0.113
3 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.112
19 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.107
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.107

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	13.5 %	11.6 %	-1.9 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.5 %	13.3 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.5 %	14.0 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 2036 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...dente de trabajo ocurrido el 30.jul.2026 en el sector 336 frente ra-3 y por tanto ha cumplido con las obligaciones de notificación, investigación, trazabilidad y gestión del evento, no evidenciándose incumplimiento deliberado de obligación contractual en materia sst.se adjunta:01 carta so-pm-ln-ct-992-2026 mpm a la entidad del 26.ago.202602 informe mpm - ln-inf - ssoma-010-2026-jeaq registro final de inv...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 2016 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

... del adicional.3. reconocer que los efectos derivados de la falta de aprobación oportuna de la prestación adicional no son atribuibles al contratista.4. abstenerse de formular imputaciones de demora, penalidad o incumplimiento al contratista por hechos vinculados a decisiones, revisiones, aprobaciones o pronunciamientos que no se encontraban bajo su control contractual.5. tener presente que esta contratist...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 2012 · Consultas · SOEC_RESI · 28/08/2026

registro y contancia de recepcion de comunicacion de aprobacion de la prestacion adicional de obra n 10 y deductivo vinculante n 06 rediseño estructural paquete n 01; registro de cierre del evento de demora por aprobación; anuncio de solicitud de ampliación de plazo por causal del literal a) del artículo 197 del rlce. parte 2 de 3. / vienesse deja constancia que durante el periodo comprendido...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 2013 · Consultas · SOEC_RESI · 28/08/2026

registro y contancia de recepcion de comunicacion de aprobacion de la prestacion adicional de obra n 10 y deductivo vinculante n 06 rediseño estructural paquete n 01; registro de cierre del evento de demora por aprobación; anuncio de solicitud de ampliación de plazo por causal del literal a) del artículo 197 del rlce. parte 3 de 3. / vieneasimismo, se deja constancia que la opinion n 051-202...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 2019 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

...ruta critica.4. abstenerse de exigir la ejecución de partidas sucesoras sin considerar la nueva lógica constructiva derivada del rediseño estructural aprobado.5. abstenerse de atribuir al contratista atrasos derivados de la aprobación tardía, modificación del expediente técnico o reprogramación necesaria por causas ajenas a su control.6. tener presente que esta contratista formulara la solicitud de amp...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 2011 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

registro y contancia de recepcion de comunicacion de aprobacion de la prestacion adicional de obra n 10 y deductivo vinculante n 06 rediseño estructural paquete n 01; registro de cierre del evento de demora por aprobación; anuncio de solicitud de ampliación de plazo por causal del literal a) del artículo 197 del rlce. parte 1 de 3. . se deja constancia que, con fecha de hoy 28.ago.2026, esta contratista...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1951 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

...forme final a supervision. en consecuencia, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones de notificación, investigación, trazabilidad y gestión del evento, no evidenciándose incumplimiento deliberado de obligación contractual en materia sst. se adjunta: carta so-mpm-ln-ct-983-2026 mpm 22.ago.2026 informe mpm/ln-inf/ssoma-008-2026-jeaq (registro final de investigación).

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1939 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026 RESPUESTA AL ASIENTO N.º 1925 – ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA DE LA CONSULTA N.º 105 / COLECTOR CASANAVE – PRECISIÓN DE ALCANCE, CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y RESERVA DE DERECHOS. PARTE 7 DE 9: Viene9. ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RESERVA DE DERECHOSLa presentación de la información requerida no modifica ni desplaza la asignación contractual de riesgos.En particular, la matriz de ... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1937 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026 ...93.6, 193.7 y 193.8 del reglamento, correspondiendo finalmente a la entidad absolver la consulta y comunicar al contratista las medidas que deba adoptar.7. precision respecto del plazo y del eventual incumplimiento aludido en el asiento n. 1925sin perjuicio de la atencion que se efectua mediante el presente asiento, corresponde preservar la adecuada trazabilidad respecto del plazo referido por la supervi... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1925 · Órdenes · SOEC_SPV · 21/08/2026 REITERATIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CONSULTA N° 105 – COLECTOR CASANAVE.: En atención a los Asientos N° 1871 y N° 1872, ambos de fecha 17.08.2026, mediante los cuales la Supervisión solicitó al Contratista la presentación de la información técnica complementaria correspondiente a la CONSULTA N° 105 – COLECTOR CASANAVE, se deja constancia que, a la fecha 21.08.2026, habiendo vencido el plazo d... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1866 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/08/2026 REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN INTEGRAL DEL REDISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO REP-02 (1/2): Se deja constancia que, mediante Asiento N° 922 de fecha 15.06.2026, esta Supervisión otorgó viabilidad técnica para que el nuevo diseño estructural del Reservoirio REP-02 sea evaluado de manera independiente, requiriendo expresamente al Contratista la presentación de la compatibilización... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 1867 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/08/2026 REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN INTEGRAL DEL REDISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO REP-02 (2/2): En consecuencia, la falta de atención del requerimiento continúa impidiendo la evaluación técnica integral del componente REP-02 y la prosecución del trámite correspondiente, por lo que se mantiene la responsabilidad del Contratista respecto de la presentación oportuna de la documentació... Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
