


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vias locales en la urbanizacion sudamerica en el centro poblado talara, distrito de pariñas - provincia de talara - departamento de piura

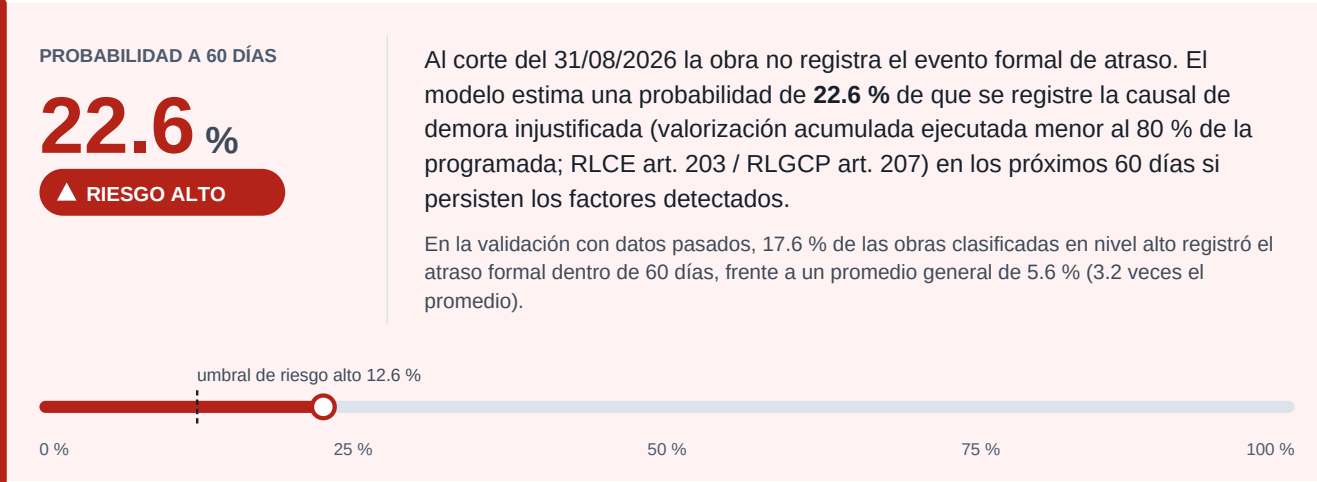


|                    |                |                        |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO  | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 60<br>desde 13/07/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA URBANIZACION SUDAMERICA EN EL CENTRO POBLADO TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS                                                                                                                                                                        |
| Contratista                                     | COSAT INDUSTRIAL S.R.L.                                                                                                                                                                                             |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | PARIÑAS / TALARA / PIURA                                                                                                                                                                                            |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2569732                                                                                                                                                                                                             |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA URBANIZACION SUDAMERICA EN EL CENTRO POBLADO TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA                      |
| Función                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                          |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2332908                                                                                                                                                                                                             |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 5,050,442.91                                                                                                                                                                                                     |
| Cuaderno de obra digital                        | 60 asientos entre 13/07/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                           |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

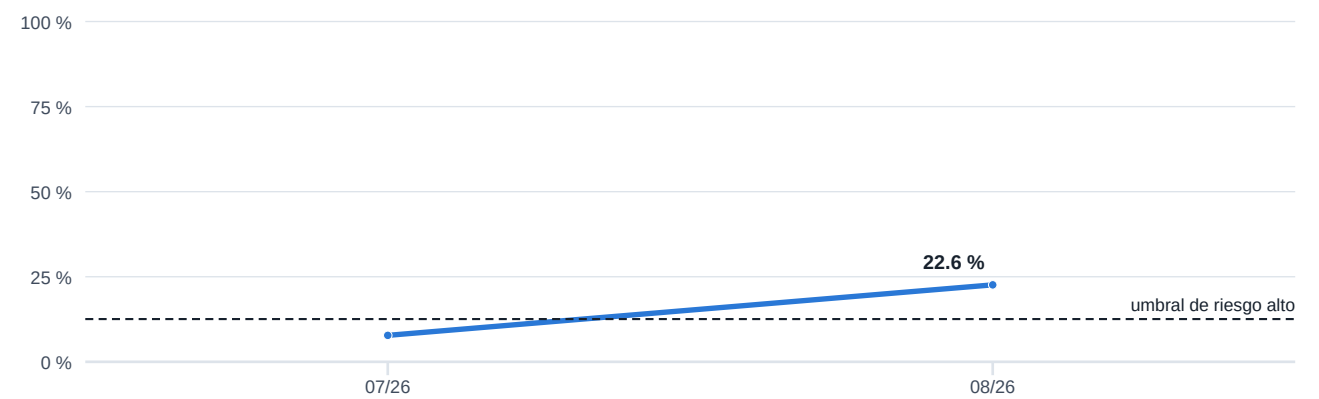

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.651 |
| El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                        | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.264 |
| El 57 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.173 |
| El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.152 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.118 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)                     | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.111 |
| 2 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.100 |
| Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes                                                    | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.084 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes | 22.6 % | 22.6 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 26/08/2026

...dinacion con participacion de representantes de la junta vecinal, contratista, supervision, gerencia de infraestructura y alcaldia de la municipalidad provincial de talara, en la que se abordaron los retrasos identificados, el avance de obra y la disponibilidad de personal y recursos en campo. como resultado, se resalto la necesidad de que el contratista adopte las medidas necesarias para incrementar su...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 54 · Órdenes · SOEC\_SPV · 25/08/2026

REITERACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA EL INCREMENTO DE FRENTEROS DE TRABAJO Y RECUPERACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA APROBADO: De acuerdo con el Asiento de Obra N.º 49, esta Supervisión REITERA al Contratista la obligación de adoptar medidas inmediatas para incrementar el ritmo de ejecución y recuperar el desfase respecto del cronograma aprobado y la programación vigente. Se dispone reforzar e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 54 · Órdenes · SOEC\_SPV · 25/08/2026

...os.se priorizara la ejecucion de la capa de material over (e=0.30 m), hormigon (e=0.20 m), asi como las partidas 02.02 veredas, 02.03 sardineles y 02.05 rampas, en los sectores aptos.de persistir las demoras y configurarse los supuestos del numeral 203.1 del articulo 203 del reglamento de la ley n. 30225, se procedera conforme a la normativa aplicable, incluyendo el requerimiento de un nuevo calendario ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 51 · Respuestas a consultas · SOEC\_SPV · 24/08/2026

...critica (cpm), demostrando tecnicamente si el problema del talud en la calle g (tramo 1) afecta la fecha de culminacion general de la obra o si las actividades viales pueden reprogramarse para evitar demoras, de conformidad con el articulo 202 del reglamento.cualquier propuesta de modificacion contractual, adicionales de obra o presupuestos deductivos vinculados (bajo el articulo 205 del reglamento) se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 49 · Órdenes · SOEC\_SPV · 24/08/2026

REQUERIMIENTO PARA EL INCREMENTO DE FRENTEROS DE TRABAJO Y RECUPERACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA APROBADO: Con fecha 22 de agosto de 2026, esta Supervisión de Obra realizó inspección técnica en campo, verificándose que el avance físico ejecutado no guarda correspondencia con el cronograma de ejecución aprobado y la programación vigente, evidenciándose un desfase en las actividades previst...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 45 · Consultas · SOEC\_RESI · 21/08/2026

...cable si se derivan prestaciones no previstas en el expediente tecnico (art. 205 rlce). 4. reserva de derechos: se adoptan medidas de proteccion para no afectar la integridad de la tuberia. cualquier demora en la definicion tecnica que afecte la ruta critica facultara la solicitud de ampliacion de plazo (art. 198 rlce).

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 13/08/2026

TÍTULO: ALCANCE DEL INFORME N.º 13-2026/SO-ING.JCRP – EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA CONSULTA DE OBRA N.º 01: En la fecha, esta Supervisión deja constancia que, revisada la documentación presentada por el Contratista respecto de la Consulta de Obra N.º 01, relacionada con accesorios preexistentes de la red de agua potable identificados durante las excavaciones hasta nivel de subrasante, se advierte incongruencia entre las ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
