


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de saldo de obra: Ampliacion y mejoramiento de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado de la calle villalba y cruz verde de arequipa

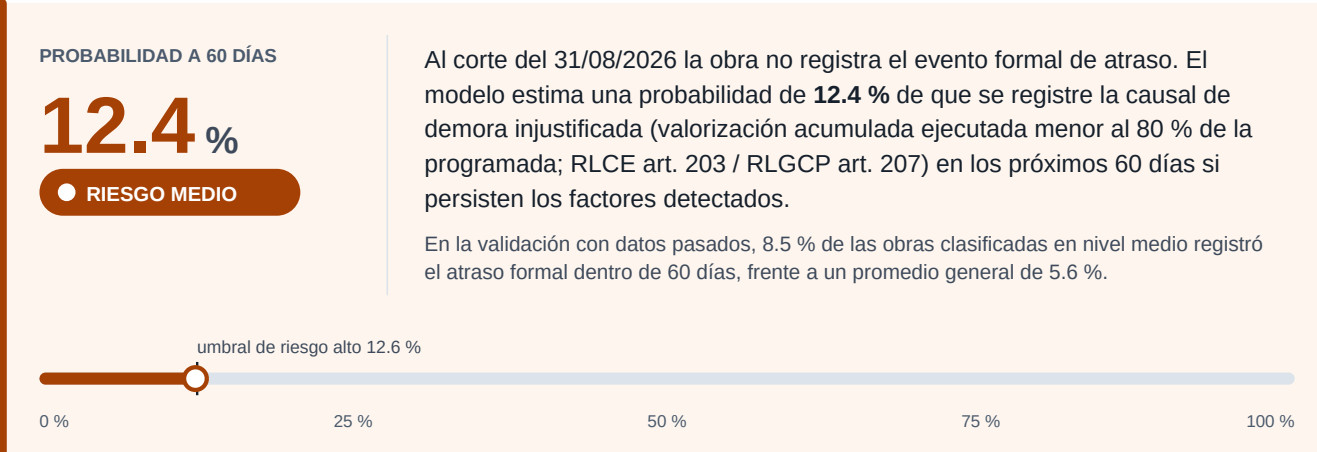


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 1,405,581.49	114 días	38 desde 13/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA
Entidad contratante	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA
Contratista	CONSORCIO AMERICA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2378764
Inversión asociada	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA, PROVINCIA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2408363
Monto del contrato	S/ 1,405,581.49
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,479,526.90
Cuaderno de obra digital	38 asientos entre 13/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

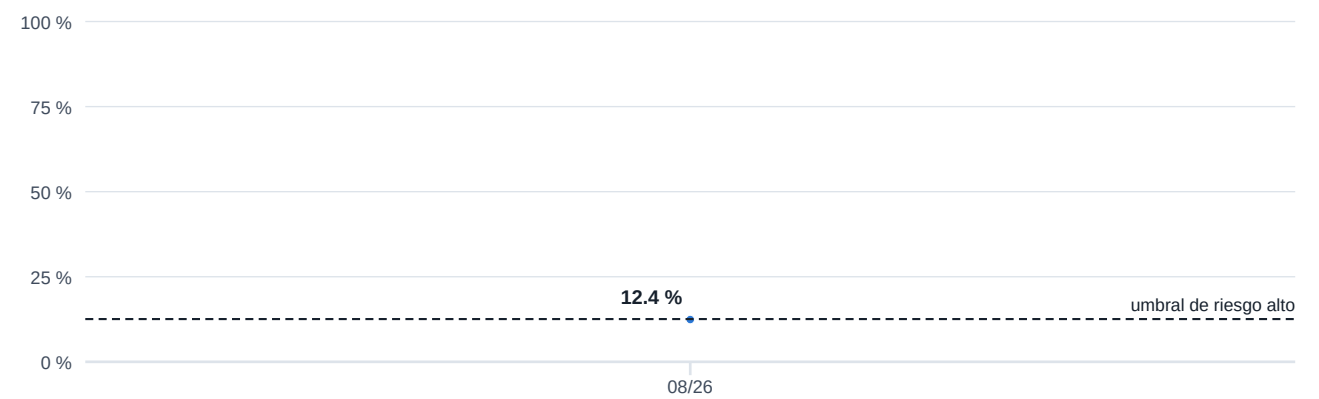

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.594
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.166
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.118
El plazo original venció hace 1,476 días	Datos del contrato		-0.112
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.107
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Ha transcurrido el 1395 % del plazo original	Datos del contrato		-0.090
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.077

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.4 %	12.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 32 · Consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

SOLICITUD DE UBICACIONES Y HORARIOS DE TRABAJO: Se solicita al contratista indicar la ubicación de su oficina de trabajo y del almacén (s) de obra, con su correspondiente área. También, se solicita al contratista indicar el horario de trabajo de personal en los turnos diurno y nocturno.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 20/08/2026

SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE A POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE, AREQUIPA": Se deja constancia que Carta N° 011-2025/AMCS-RC-CA Sgd 2026-25710, se ha recepcionado la presentación de la Póliza CAR y SCTR y con Carta N° 010-2025/AMCS-RC-CA, Sgd 2026-25709 se ha recepcionado la Actualización Plan de Trabajo y Cronogramas con fecha de inicio de plazo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 6 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_INSP · 18/08/2026

...nte tecnico se reitera al contratista el parrafo 2 del asiento no 4 debiendo tener presente lo establecido en la clausula, decimosexta del contrato 42-2026 suscrito, respecto a la aplicacion de otras penalidades.asi mismo, el contratista debe alcanzar la programacion del personal de acuerdo a la participacion durante la ejecucion programada de la obra (personal clave y no clave). se indica al contratista c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 6 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_INSP · 18/08/2026

REQUERIMIENTOS DE LA INSPECCIÓN: En fecha 17-8-2026, se ha tenido reunión con la Jefatura del Departamento de Supervisión y Obras Ing. Erika Mendoza, el Ing Raul Mendoza del Departamento de Estudios y de parte de Consorcio América se presentaron el Ing. Residente de Obra, el representante legal Antony Miguel Cuadros Sedano, y el Gerente Yoni Mendoza Yupanqui, tratando aspectos sobre el planteamiento secuencia de l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
