


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable rural y mejoramiento y ampliacion del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de pariaucro distrito de huari de la provincia de huari del departamento de ancash

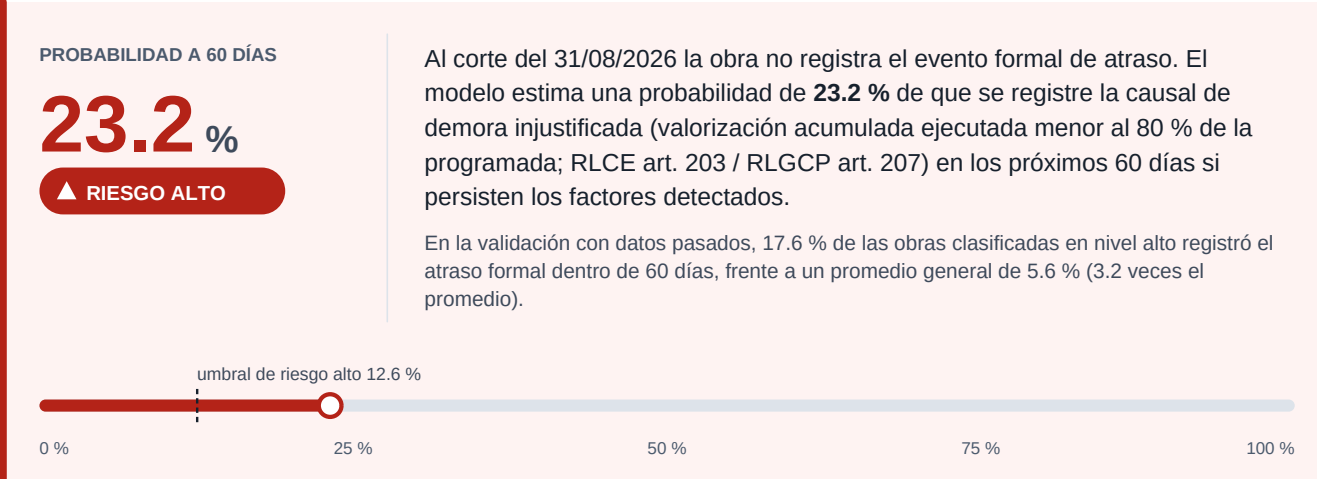

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	180 desde 15/06/2026	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARIAUCRO DISTRITO DE HUARI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUARI / HUARI / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2653750
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARIAUCRO DISTRITO DE HUARI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2400283
Monto del contrato	-

Monto aprobado de la inversión	S/ 3,928,626.73
Cuaderno de obra digital	180 asientos entre 15/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

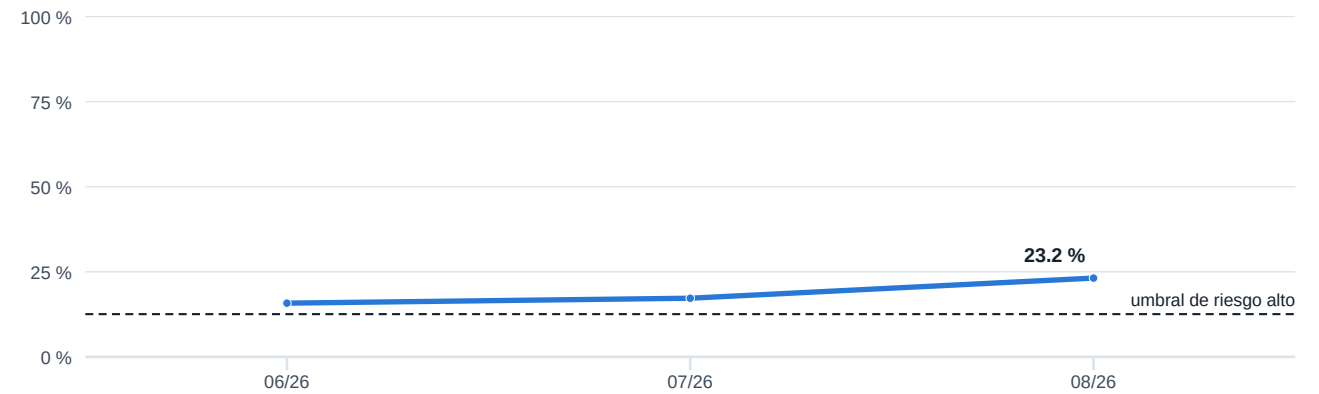

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.602
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.250
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.187
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.165
Hubo registros en el cuaderno 28 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.150
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.113
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
67 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.079

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 173 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 28/08/2026

...do la continuidad de la obra sin mayor dilacion.con ello, la supervision demuestra un rol proactivo en la identificacion y gestion temprana de los riesgos del proyecto, contribuyendo a evitar mayores demoras y sobrecostos, y resguardando la correcta ejecucion, calidad y funcionalidad de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 168 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

ASIEN TO DE LA SUPERVISION DE OBRA: La supervisión de obra verifica los avances diarios del contratista, conforme a lo señalado en el Asiento del Cuaderno de Obra N° 167 correspondiente al Residente de Obra.En recorrido de verificación en campo, esta Supervisión evidencia la presencia de residuos dispersos en el área de trabajo, consistentes en bolsas de cemento vacías, retazos de tubería y restos de lechada de concre...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 168 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...ormativa aplicable. esta supervision exhorta al contratista a optimizar la eficiencia de su logistica de abastecimiento de materiales, garantizando su disponibilidad oportuna en obra, a fin de evitar demoras que incidan negativamente en el avance fisico de los frentes de trabajo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 161 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...doptar de inmediato las medidas correctivas para el correcto almacenamiento de los materiales observados, otorgandosele un plazo de 24 horas para su subsanacion, bajo responsabilidad. de persistir el incumplimiento, se dejara constancia en asiento posterior y se reportara en el informe correspondiente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 156 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

ASIEN TO DE LA SUPERVISION DE OBRA: En cumplimiento de sus funciones contractuales, la Supervisión realiza la verificación y control permanente de los frentes de trabajo, constatando diariamente la correcta ejecución de las diferentes partidas previstas en el Expediente Técnico, conforme a lo señalado en el Asiento del Cuaderno de Obra N° 155 correspondiente al Residente de Obra.Se reitera al Contratista la necesidad ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 156 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

...ucion de la obra, se recomienda al contratista incrementar la cantidad de personal calificado y no calificado, con la finalidad de abrir un mayor numero de frentes de trabajo y evitar asi incurrir en atrasos respecto del calendario de avance de obra vigente.se deja constancia de la presente recomendacion para conocimiento y accion inmediata del residente de obra, sin perjuicio de la facultad de la supe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 154 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

... de la ejecucion de la obra, se recomienda al contratista incrementar la cantidad de personal calificado y no calificado, a fin de abrir mayor cantidad de frentes de trabajo, evitando asi incurrir en atrasos respecto al calendario de avance de obra vigente. se deja constancia de la presente recomendacion para conocimiento y accion inmediata del residente de obra, sin perjuicio de la facultad de la supe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 147 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...n y buzoneta: cortes y detalles (bz 01/02 y 02/02) del expediente tecnico, donde se establece una altura de 0.05 m.la supervision constato en campo que la construccion de la media cana en los buzones incumple con los planos y especificaciones tecnicas.para garantizar el correcto flujo de las aguas residuales, se deben corregir las siguientes deficiencias detectadas: las canaletas deben tener el mismo dia...

Fuente: cod-asientos202608.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
